



**DIRECTION
RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
GRAND EST**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Protection de la Nappe d'Alsace 2ème COPIL – 13/12/2021


Sommaire :

- 1. Retour sur les réunions des Comités de Suivi Locaux (CSL)**
- 2. Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites**
- 3. Échanges/discussion**


Ancien site MUNSCH-GULDEN à Wingen-sur-Moder (67) :




Localisation du site – source Géoportail

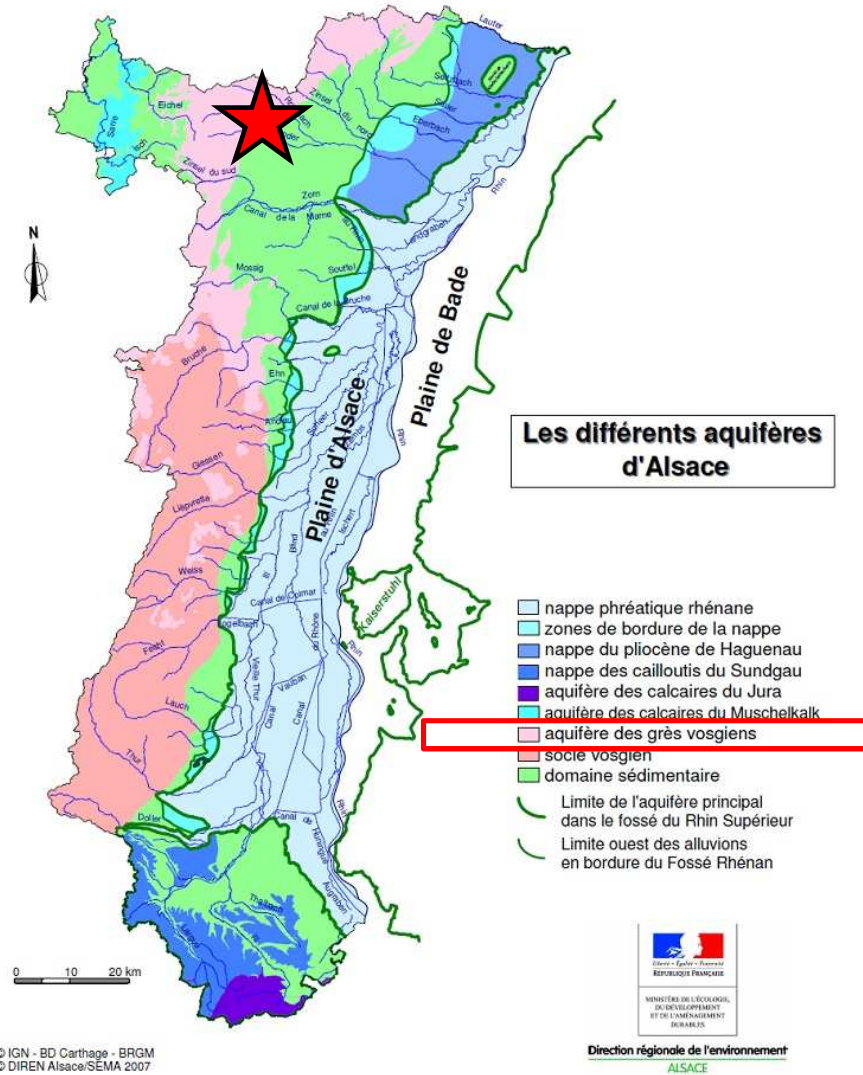

Ancien site ABT à Richwiller (68) :

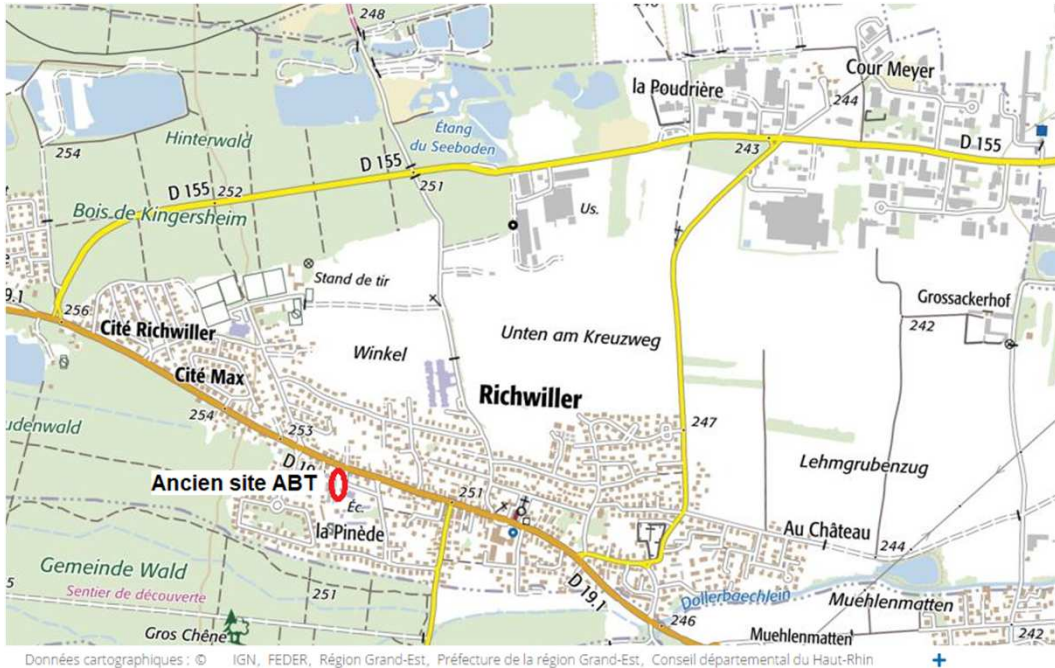

Localisation de l'ancien site ABT (Source Géoportail)

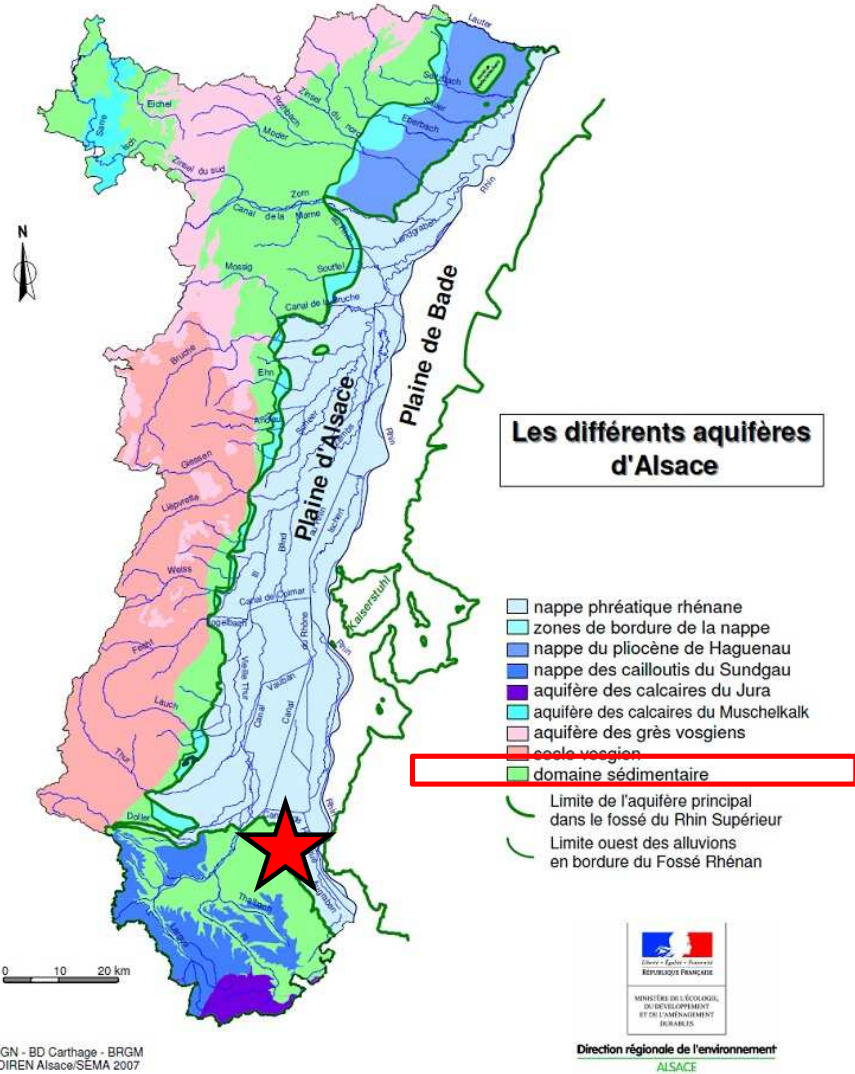

Sommaire :

1. Retour sur les réunions des Comités de Suivi Locaux (CSL)
2. Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites
3. Échanges/discussion

Bilan des actions réalisées et à mener - PCUK à Wintzenheim (68)

Actions menées depuis le 30/04/2021 :

- 27/05/2021 : 3^{ème} campagne de surveillance des eaux souterraines (Société ARCHIMED) – Conclusions : panache stable et restriction d'usage adaptée
- 12/05/2021 (et 31/08/2021) : Entretien / tontes du confinement (société T. MULLER) ;
- 07/07/2021 : Accord du ministère en charge de la Transition Ecologique ;
- 15/09/2021 : Publication des arrêtés préfectoraux (Occupation Temporaire des Sols & Travaux d'Office) ;
- 21/09/2021 : Validation de l'intervention de l'ADEME par le Comité Technique Sites & Sols Pollués ;
- 15/10/2021 : Mise en place de blocs anti-effraction (250 unités environ) ;
- 19/11/2021 : 4^{ème} campagne de surveillance des eaux souterraines (Société ARCHIMED) – Conclusions : panache stable et restriction d'usage adaptée
- 24/11/2021 : Inspection et entretien du bassin de rétention des crues (BRC) (Société ANISUD) – Conclusion : ouvrage pleinement opérationnel

Actions menées prochainement :

- Communication des résultats aux mairies des campagnes 2021 – prévue décembre/janvier 2021
- Réalisation d'un état des lieux initial avant travaux (T0) sur les gaz du sol (société ARCHIMED) – marché notifié / installation des piézairs début 2022
- Consultation pour mission de communication (portant sur les 3 sites concernés par la démarche « Nappe d'Alsace » – Cahier des charges en cours de réalisation – prévue T1/T2 2022
- Lancement de la consultation pour la mission de Maîtrise d'Œuvre – Tranche ferme=dimensionnement – Cahier des charges en cours de réalisation – lancement courant 2022

PLANNING PREVISIONNEL – PCUK à Wintzenheim (68)

Phase	Trimestre	2021		2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029	
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T2	T1
Mise en place de blocs LEGO																																	
Mission de Maîtrise d'œuvre / dimensionnement et suivi des travaux	Consultations pour la Maîtrise d'œuvre																																
	Mission de Maîtrise d'œuvre																																
	Consultation pour les marchés travaux																																
	Suivi des travaux																																
	Garantie du parfait achèvement																																
Enlèvement de déchets dangereux																																	
Suivi des eaux souterraines et gaz du sol par un bureau d'études indépendant pendant et après travaux																																	

Nous sommes ici

Prochaines étapes (2022-2023)

Bilan des actions réalisées et à mener - Site MUNSCH-GULDEN à Wingen-Sur-Moder (67)

Actions menées depuis le 30/04/2021 :

- 06/07/2021 : 1^{er} CLS ;
- 16/07/2021 : Réunion publique à Wingen-Sur-Moder restreintes aux riverains – accompagnement de l'évolution du périmètre de restriction d'usage des eaux souterraines ;
- 20/07/2021 : Arrêté Municipal adaptant de manière sécuritaire le périmètre de restriction d'usage des eaux souterraines ;
- 04/08/2021 : Courrier d'accord du Ministère pour le budget alloué aux études de dimensionnement ;
- 21/09/2021 : Présentation et validation de l'intervention de l'ADEME au Comité Technique National Sites & Sols Pollués (CTSP) → Avis favorable (+ propositions techniques) ;
- 19/10/2021 : Reprise des fermetures des accès au site (société CLOSIT) pour la protection du site au regard des intrusions ;
- 23/11/2021 : 2^{ème} CLS ;
- 09/12/2021 : Réunion publique élargie aux habitants de Wingen-Sur-Moder ;
- En cours : Echanges DREAL/ADEME sur les projets d'Arrêtés Préfectoraux (APTO et APOTS) – publication prévue décembre 2021.


Actions menées prochainement :

- Lancement de la consultation pour le Plan de Conception des Travaux (PCT) incluant des investigations complémentaires et la réalisation de diagnostics préliminaires (amiante/plomb, déchets, géotechnique) – cahier des charges en cours de réalisation – lancement T1/T2 2022
- Consultation pour mission de communication (portant sur les 3 sites concernés par la démarche « Nappe d'Alsace » – Cahier des charges en cours de réalisation – Lancement T1/T2 2022

PLANNING PREVISIONNEL – Site MUNSCH-GULDEN à Wingen-Sur-Moder (67)

Phase	Etapas	Année	2022				2023				2024				2025				2026				
		Trimestre	t	t+1	t+2	t+3	t+4	t+5	t+6	t+7	t+8	t+9	t+10	t+11	t+12	t+13	t+14	t+15	t+16	t+17	t+18	t+19	
Plan de conception des travaux	Consultation / attribution et réalisation de la mission																						
	Mission de Maîtrise d'œuvre et préparation des travaux	Maîtrise d'œuvre et diagnostics préparatoires (ex : diagnostic amiante, géotechnique...) (comprenant les consultations)																					
		Consultations pour les marchés travaux																					
	Suivi des travaux																						
	Garantie du parfait achèvement																						
Travaux	Démolition / Désamiantage																						
	Dépollution du site (selon méthodologie définie dans le plan de gestion)																						
	Suivi eaux souterraines, air intérieur et gaz du sol avant, pendant et après travaux																						

Prochaines étapes

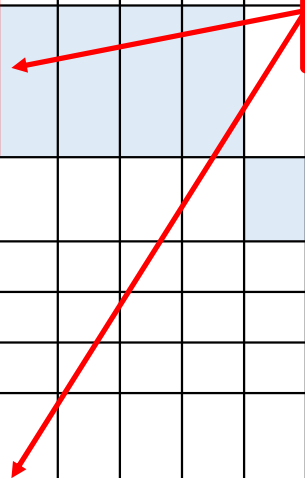

Bilan des actions menées et à mener – Site ABT à Richwiller (68)

Actions menées depuis le 30/04/2021 :

- 21 et 22/04/2021 : 1^{ère} campagne de prélèvements des eaux souterraines, air intérieur et gaz du sol – **Conclusion** : air à l'intérieur des lieux de vie (y compris dans l'école) ne pose pas de problème.
- 05/07/2021 : 1^{er} CLS ;
- 23 et 24/06/2021 : 2^{ème} campagne de prélèvements des eaux souterraines, air intérieur et gaz du sol – **Conclusion** : tendances de la première campagne confirmées ;
- 06 et 07/10/2021 : Compléments d'investigations dans l'eau du robinet et l'air intérieur – **Conclusions** : l'eau du robinet respecte les valeurs de potabilité et quantification de solvants chlorés dans une habitation de l'ordre de grandeur de la valeur seuil
- 03/12/2021 : 2^{ème} CLS ;
- En cours : Echanges DREAL/ADEME sur les projets d'Arrêtés Préfectoraux (APTO et APOTS) – publication prévue décembre 2021.

Actions menées prochainement :

- Janvier 2022 : Présentation et validation de l'intervention de l'ADEME au Comité Technique National Sites & Sols Pollués (CTSP)
- Consultation pour la réalisation d'un plan de gestion – prévue 1^{er} semestre 2022
- Consultation pour mission de communication (portant sur les 3 sites concernés par la démarche « Nappe d'Alsace » – Cahier des Charges en cours de réalisation

PLANNING PREVISIONNEL – Site ABT à Richwiller (68)

Phase	Etapas	Année	2022				2023				2024				2025				2026				2027			
		Trimestre	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Plan de gestion	Consultation / attribution / Réalisation																									
Plan de Conception des Travaux	Consultation / attribution / réalisation																									
Mission de Maîtrise d'œuvre et préparation des travaux	Consultation / attribution marché Moe / Mission MOE																									
	Diagnostics préparatoires (ex : diagnostic déchets, amiante)																									
	Consultation/attribution/commission des marchés/notification marchés travaux																									
	Suivi des travaux																									
	Garantie du parfait achèvement																									
	Démolition / Désamiantage																									
	Dépollution du site (selon méthodologie définie dans le plan de gestion)																									
Travaux	Suivi des eaux souterraines, air intérieur et gaz du sol par un bureau d'études indépendant pendant et après travaux																									

Prochaines étapes

Sommaire :

1. Retour sur les réunions des Comités de Suivi Locaux (CSL)
2. Actions entreprises ou à venir sur les 3 sites
3. Échanges/discussion

Questions diverses / échanges / ressenti des différentes parties prenantes ?

- ...
- ...
- ...

Echanges /
Discussions





**DIRECTION
RÉGIONALE
DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
GRAND EST**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
