




N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Fort de VAUX	316 jrs	Ven 07/03/25	Ven 19/06/26
2	Phase administratif	80 jrs	Ven 07/03/25	Mar 01/07/25
3	Dépôts des autorisations administratives (DAT, Dossiers Natura 2000, PC, etc)	4 mois	Ven 07/03/25	Mar 01/07/25
4	Lancement de la consultation travaux	6 sem.	Lun 14/04/25	Mar 27/05/25
5	Analyses des offres et négociations	23 jrs	Mer 28/05/25	Ven 27/06/25
6	Notification des marchés	2 jrs	Lun 30/06/25	Mar 01/07/25
7	Conservation et restauration des mobiliers => Enlèvement	21 jrs	Lun 02/06/25	Lun 30/06/25
8	Conservation et restauration des mobiliers => Livraison et remise en place	20 jrs	Ven 03/04/26	Jeu 30/04/26
9	Mise en place signalétique + indication/réperage des ouvrages à traiter	0 jr	Mer 04/06/25	Mer 04/06/25
10	Période de préparation	1,45 moi	Mer 02/07/25	Ven 01/09/25
11	TRAVAUX PREPARATOIRES --> JALON 1	7 jrs	Ven 01/08/25	Ven 29/08/25
12	LOT 02 - MACONNERIE	7 jrs	Ven 01/08/25	Ven 29/08/25
13	Installation clôture de chantier	2 jrs	Ven 01/08/25	Lun 04/08/25
14	Délimitation de la zone de circulation	1 jr	Mar 25/08/25	Lun 27/08/25
15	Travaux préparatoires pour installation base vie	2 jrs	Mar 26/08/25	Mer 27/08/25
16	Raccordement électricité	1 jr	Mar 26/08/25	Mar 26/08/25
17	Installation panneaux de chantier	1 jr	Mer 27/08/25	Mer 27/08/25
18	Installation de la base vie	2 jrs	Jeu 28/08/25	Ven 29/08/25
19	Fin des travaux préparatoires --> JALON 1	0 jr	Ven 29/08/25	Ven 29/08/25
20	TRAVAUX INTERIEUR --> JALON 2	2 jrs	Mar 02/09/25	Mer 03/09/25
21	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	2 jrs	Mar 02/09/25	Mer 03/09/25
22	Consignation des réseaux	2 jrs	Mar 02/09/25	Mer 03/09/25
23	TRAVAUX ZONE 1	81 jrs	Mar 17/06/25	Mar 28/10/25
24	CASEMATES N°11 - 12	50 jrs	Mar 24/06/25	Lun 22/09/25
25	LOT 01 - CURAGE - DEMOLITION	3 jrs	Jeu 04/09/25	Lun 08/09/25
26	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25
27	Dépose potelet métallique	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25
28	Dépose des structures bois scénographiques	2 jrs	Ven 05/09/25	Lun 08/09/25
29	Dépose des menuiseries	1 jr	Ven 05/09/25	Ven 05/09/25
30	Ragréage au sol	1 jr	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25
31	LOT 02 - MACONNERIE	48 jrs	Mar 24/06/25	Jeu 18/09/25
32	Approvisionnement	8 sem.	Mar 24/06/25	Mar 09/09/25
33	Sol :	8 jrs	Mar 09/09/25	Jeu 18/09/25
34	Remplacement de carreaux de ciment	2 jrs	Mar 09/09/25	Mer 10/09/25
35	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Mar 16/09/25	Jeu 18/09/25
36	Murs :	8 jrs	Mar 09/09/25	Jeu 18/09/25
37	Descellement d'éléments métalliques	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25
38	Joint de finition, rebouchage divers	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25
39	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Mar 16/09/25	Jeu 18/09/25
40	Plafond / voûte :	3 jrs	Mar 16/09/25	Jeu 18/09/25
41	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Mar 16/09/25	Jeu 18/09/25
42	LOT 04 - MENUISERIE	43 jrs	Jeu 26/06/25	Lun 15/09/25
43	Approvisionnement	8 sem.	Jeu 26/06/25	Jeu 11/09/25
44	Réception des supports	1 jr	Jeu 11/09/25	Jeu 11/09/25
45	Remplacement des bois + traitement	2 jrs	Ven 12/09/25	Lun 15/09/25
46	LOT 08 - SERRURERIE	42 jrs	Ven 04/07/25	Lun 22/09/25
47	Approvisionnement	8 sem.	Ven 04/07/25	Ven 19/09/25
48	Passivation des éléments métalliques	1 jr	Ven 19/09/25	Ven 19/09/25
49	Scellement et remise en jeu des portes et grilles métalliques	1 jr	Lun 22/09/25	Lun 22/09/25
50	OUVRAGE N°9 et 10 - LOCAL DU PERSONNEL	71 jrs	Mar 01/07/25	Mar 28/10/25
51	LOT 01 - CURAGE - DEMOLITION	6 jrs	Jeu 04/09/25	Jeu 11/09/25
52	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25
53	Dépose des menuiseries	2 jrs	Ven 05/09/25	Lun 08/09/25
54	Démolition allège maçonnée	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25
55	Dépose du sanitaire actuel	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25
56	Dépose des caillottes bois et dalles faux plafonds (2 dalles)	2 jrs	Mer 10/09/25	Jeu 11/09/25
57	LOT 02 - MACONNERIE	54 jrs	Mar 01/07/25	Ven 03/10/25
58	Approvisionnement	8 sem.	Mar 01/07/25	Mar 16/09/25
59	Sol :	14 jrs	Ven 12/09/25	Mer 01/10/25
60	Remplacement de carreaux de ciment	2 jrs	Ven 12/09/25	Lun 15/09/25
61	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Lun 29/09/25	Mer 01/10/25
62	Murs :	14 jrs	Mar 16/09/25	Ven 03/10/25
63	Travaux accompagnement pour passage de câbles électriques	5 jrs	Lun 29/09/25	Ven 03/10/25
64	Reprise maçonnerie suite dépose allège	1 jr	Mar 16/09/25	Mar 16/09/25
65	Cloisonnement toute hauteur	2 jrs	Mer 17/09/25	Mer 18/09/25
66	Dépose éléments friable, reprise briques et remplacement en recherche	3 jrs	Ven 19/09/25	Mar 23/09/25
67	Descellement d'éléments métalliques	2 jrs	Mer 24/09/25	Jeu 25/09/25
68	Joint de finition, rebouchage divers	1 jr	Ven 26/09/25	Ven 26/09/25
69	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Lun 29/09/25	Mer 01/10/25
70	Plafond / voûte :	3 jrs	Lun 29/09/25	Mer 01/10/25
71	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Lun 29/09/25	Mer 01/10/25
72	LOT 03 - FAUX PLAFOND	26 jrs	Jeu 18/09/25	Jeu 23/10/25
73	Approvisionnement	5 sem.	Jeu 18/09/25	Jeu 23/10/25
74	Remplacement des dalles faux plafond déteriorées	1 jr	Jeu 23/10/25	Jeu 23/10/25
75	LOT 04 - MENUISERIE	46 jrs	Mer 23/07/25	Mar 14/10/25
76	Approvisionnement	8 sem.	Mer 23/07/25	Mar 07/10/25
77	Réception des supports	1 jr	Mar 07/10/25	Mar 07/10/25
78	Pose plancher surélevé sur plots et lambourdes aciers	5 jrs	Mer 08/10/25	Mar 14/10/25
79	LOT 05 - SOL SOUPLE	44 jrs	Jeu 31/07/25	Lun 20/10/25
80	Approvisionnement	8 sem.	Jeu 31/07/25	Mer 15/10/25
81	Réception des supports	1 jr	Mer 15/10/25	Mer 15/10/25
82	Pose revêtement sol PVC	3 jrs	Jeu 16/10/25	Lun 20/10/25
83	LOT 06 - PEINTURE - CLOISON - DOUBLAGE	40 jrs	Jeu 28/08/25	Mer 22/10/25
84	Approvisionnement	5 sem.	Jeu 28/08/25	Jeu 02/10/25
85	Préparation des supports	1 jr	Jeu 02/10/25	Jeu 02/10/25
86	1ere couche	2 jrs	Ven 03/10/25	Lun 06/10/25
87	2eme couche	2 jrs	Mar 21/10/25	Mer 22/10/25
88	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	42 jrs	Lun 01/09/25	Mar 28/10/25
89	Approvisionnement	5 sem.	Lun 01/09/25	Lun 06/10/25
90	Passage réseau	5 jrs	Lun 06/10/25	Ven 10/10/25
91	Pose d'un sanitaire autonome	2 jrs	Lun 13/10/25	Mar 14/10/25
92	Pose appareillage	4 jrs	Jeu 23/10/25	Mar 28/10/25
93	CASEMATE N°8	54 jrs	Ven 20/06/25	Mer 24/09/25
94	LOT 01 - CURAGE - DEMOLITION	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25
95	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25
96	Dépose des BAES	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25
97	LOT 02 - MACONNERIE	46 jrs	Mer 25/06/25	Mer 17/09/25
98	Approvisionnement	8 sem.	Mer 25/06/25	Mer 10/09/25
99	Sol :	9 jrs	Ven 05/09/25	Mer 17/09/25
100	Dépose des petits blocs béton (attente validation DRAC)	4 jrs	Ven 05/09/25	Mer 10/09/25
101	Remplacement de carreaux de ciment	2 jrs	Jeu 11/09/25	Ven 12/09/25
102	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Lun 15/09/25	Mer 17/09/25
103	Murs :	9 jrs	Ven 05/09/25	Mer 17/09/25
104	Travaux accompagnement pour passage de câbles électriques	3 jrs	Ven 05/09/25	Mar 09/09/25
105	Piquetage enduit + réalisation chaux avec intégration électrique	2 jrs	Mer 10/09/25	Jeu 11/09/25
106	Descellement d'éléments métalliques	1 jr	Ven 12/09/25	Ven 12/09/25
107	Joint de finition, rebouchage divers	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
108	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Lun 15/09/25	Mer 17/09/25
109	Plafond / voûte :	9 jrs	Ven 05/09/25	Mer 17/09/25
110	Ouverture de joints pour passage réseaux électriques	3 jrs	Ven 05/09/25	Mar 09/09/25

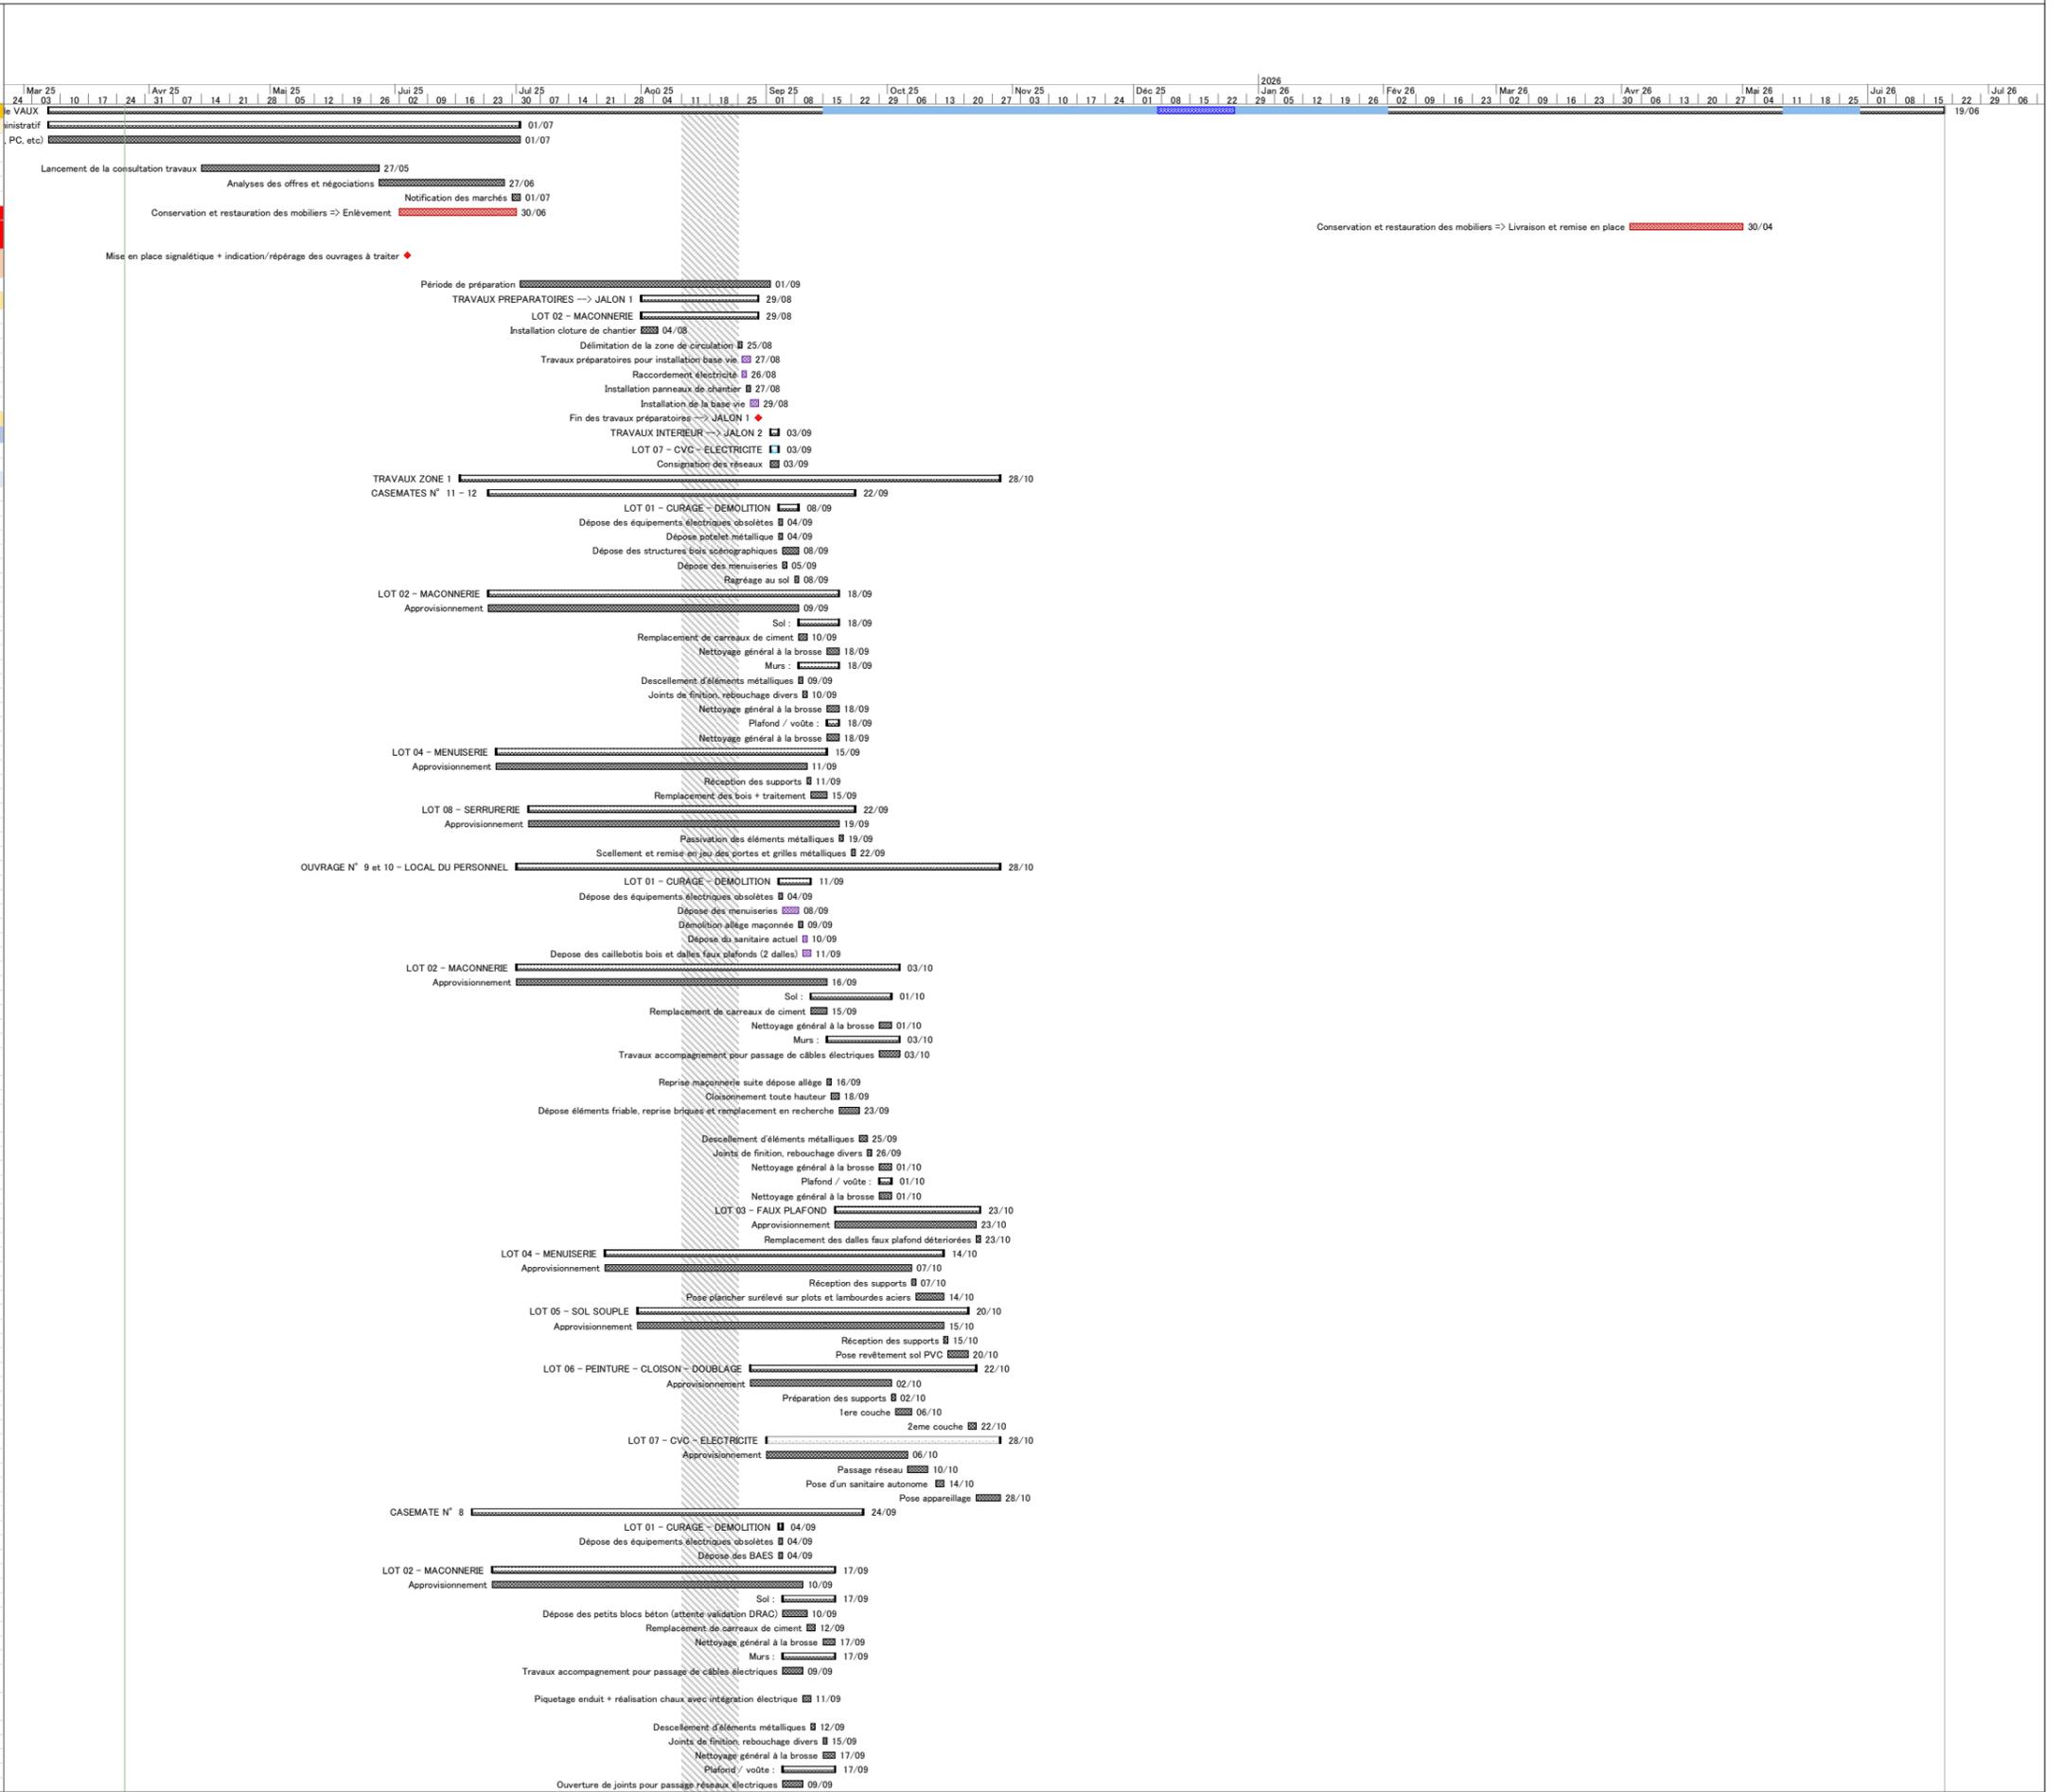

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
111	Dépose éléments friable, reprise briques et remplacement en recherche	3 jrs	Mer 10/09/25	Ven 12/09/25
112	Instrumentation des fissures et contrôle régulier	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
113	Nettoyage général à la brosse	3 jrs	Lun 15/09/25	Mer 17/09/25
114	LOT 04 - MENUISERIE	41 jrs	Jeu 03/07/25	Jeu 18/09/25
115	Approvisionnement	8 sem.	Jeu 03/07/25	Jeu 18/09/25
116	Remplacement linteau bois vermoulus	1 jr	Jeu 18/09/25	Jeu 18/09/25
117	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	54 jrs	Ven 20/06/25	Mer 24/09/25
118	Approvisionnement	8 sem.	Ven 20/06/25	Ven 05/09/25
119	Passage câbles	5 jrs	Ven 05/09/25	Jeu 11/09/25
120	Pose appareillage	3 jrs	Lun 22/09/25	Mer 24/09/25
121	LOT 08 - SERRURERIE	44 jrs	Mar 01/07/25	Ven 19/09/25
122	Approvisionnement	8 sem.	Mar 01/07/25	Mar 16/09/25
123	Pose cimaise métallique en fond de casemate	4 jrs	Mar 16/09/25	Ven 19/09/25
124	GALLERIE PRINCIPALE	60 jrs	Mar 17/06/25	Lun 29/09/25
125	LOT 02 - MACONNERIE	44 jrs	Mer 25/06/25	Lun 15/09/25
126	Approvisionnement	8 sem.	Mer 25/06/25	Mer 10/09/25
127	Sol :	8 jrs	Jeu 04/09/25	Lun 15/09/25
128	Accompagnement travaux électrique	2 jrs	Jeu 04/09/25	Ven 05/09/25
129	Pose clous podotactile	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
130	Nettoyage à l'eau + séchage	2 jrs	Mer 10/09/25	Jeu 11/09/25
131	Murs :	3 jrs	Mer 10/09/25	Ven 12/09/25
132	Nettoyage à l'eau + séchage	2 jrs	Mer 10/09/25	Jeu 11/09/25
133	Enlèvements des mousses	1 jr	Ven 12/09/25	Ven 12/09/25
134	Plafond / voûte :	6 jrs	Lun 08/09/25	Lun 15/09/25
135	Piquetage des parties maçonnerie menaçant de chute	1 jr	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25
136	Instrumentation des fissures + contrôle régulier	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25
137	Devant casemate 7 : consolidation de la voûte maçonnée	2 jrs	Mer 10/09/25	Jeu 11/09/25
138	Nettoyage à l'eau + séchage	2 jrs	Ven 12/09/25	Lun 15/09/25
139	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	58 jrs	Jeu 19/06/25	Lun 29/09/25
140	Approvisionnement	8 sem.	Jeu 19/06/25	Jeu 04/09/25
141	Passage câbles	5 jrs	Jeu 04/09/25	Mer 10/09/25
142	Pose appareillage	5 jrs	Mar 23/09/25	Lun 29/09/25
143	LOT 08 - SERRURERIE	55 jrs	Mar 17/06/25	Lun 22/09/25
144	Approvisionnement	10 sem.	Mar 17/06/25	Mar 16/09/25
145	Passivation des éléments métalliques corrodés (garde corps et portes)	2 jrs	Mar 16/09/25	Mer 17/09/25
146	Scellement légère remise en jeu des portes existantes et grill	1 jr	Jeu 18/09/25	Jeu 18/09/25
147	Dépose de la gouttière intérieure	1 jr	Ven 19/09/25	Ven 19/09/25
148	Pose d'un garde corps de mise à distance	1 jr	Lun 22/09/25	Lun 22/09/25
149	ELEVATION SUD	64 jrs	Ven 20/06/25	Mer 08/10/25
150	LOT 04 - MENUISERIE	56 jrs	Ven 20/06/25	Ven 26/09/25
151	Approvisionnement	10 sem.	Ven 20/06/25	Ven 19/09/25
152	Réception des supports	1 jr	Ven 19/09/25	Ven 19/09/25
153	Remplacement vitrage	5 jrs	Lun 22/09/25	Ven 26/09/25
154	LOT 08 - SERRURERIE	60 jrs	Mar 24/06/25	Lun 06/10/25
155	Approvisionnement	10 sem.	Mar 24/06/25	Mar 23/09/25
156	Pose clôture	4 jrs	Mar 23/09/25	Ven 26/09/25
157	Pose lisse métallique	5 jrs	Lun 29/09/25	Ven 03/10/25
158	Rescellerment et remise en jeu porte	1 jr	Lun 06/10/25	Lun 06/10/25
159	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	52 jrs	Mar 08/07/25	Mer 08/10/25
160	Approvisionnement	8 sem.	Mar 08/07/25	Mar 23/09/25
161	Passage câbles	4 jrs	Mar 23/09/25	Ven 26/09/25
162	Pose appareillage	3 jrs	Lun 29/09/25	Mer 01/10/25
163	Raccordement tableau	3 jrs	Jeu 02/10/25	Lun 06/10/25
164	Alimentation générale (CFO/CFA) zone 1 complète	3 jrs	Jeu 02/10/25	Lun 06/10/25
165	Essai général	2 jrs	Mar 07/10/25	Mer 08/10/25
166	Hors poussières	0 jr	Mer 08/10/25	Mer 08/10/25
167	TRAVAUX ZONE 2	67 jrs	Mar 17/06/25	Mer 08/10/25
168	ENTREE DE GUERRE	67 jrs	Mar 17/06/25	Mer 08/10/25
169	LOT 01 - CURAGE - DEMOLITION	2 jrs	Mar 09/09/25	Mer 10/09/25
170	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25
171	Dépose des BAES	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25
172	Dépose des garde-corps existant	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25
173	Dépose grille existante	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25
174	LOT 02 - MACONNERIE	56 jrs	Jeu 26/06/25	Jeu 02/10/25
175	Approvisionnement	8 sem.	Jeu 26/06/25	Jeu 11/09/25
176	Sol :	16 jrs	Jeu 11/09/25	Jeu 02/10/25
177	Nettoyage général à la brosse	2 jrs	Jeu 11/09/25	Ven 12/09/25
178	Enlèvements des mousses	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
179	Accompagnement passage réseau électrique	5 jrs	Mar 16/09/25	Lun 22/09/25
180	Conservation des vestiges et chicanes	1 jr	Mar 23/09/25	Mar 23/09/25
181	Nettoyage à l'eau + séchage	2 jrs	Mer 01/10/25	Jeu 02/10/25
182	Murs :	14 jrs	Lun 15/09/25	Jeu 02/10/25
183	Enlèvements des mousses	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
184	Passivation des IPN métalliques oxydés	2 jrs	Mar 23/09/25	Mer 24/09/25
185	Conservations des lignes rouges historiques	0 jr	Mer 24/09/25	Mer 24/09/25
186	Descellement d'éléments métalliques	1 jr	Jeu 25/09/25	Jeu 25/09/25
187	Joint de finition, rebouchage divers	1 jr	Ven 26/09/25	Ven 26/09/25
188	Nettoyage à l'eau + séchage	2 jrs	Mer 01/10/25	Jeu 02/10/25
189	Plafond / voûte :	14 jrs	Lun 15/09/25	Jeu 02/10/25
190	Nettoyage général à la brosse	2 jrs	Mer 01/10/25	Jeu 02/10/25
191	Enlèvements des mousses	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
192	Purge des éléments menaçant de chute + rejointoiement	1 jr	Lun 29/09/25	Lun 29/09/25
193	Passivation des aciers à nu des planchers haut	1 jr	Mar 30/09/25	Mar 30/09/25
194	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	57 jrs	Mar 01/07/25	Mer 08/10/25
195	Approvisionnement	8 sem.	Mar 01/07/25	Mar 16/09/25
196	Passage câbles	4 jrs	Mar 16/09/25	Ven 19/09/25
197	Pose appareillages	2 jrs	Lun 29/09/25	Mar 30/09/25
198	Raccordement tableau	2 jrs	Mer 01/10/25	Jeu 02/10/25
199	Alimentation générale (CFO/CFA)	2 jrs	Ven 03/10/25	Lun 06/10/25
200	Essai général	2 jrs	Mar 07/10/25	Mer 08/10/25
201	LOT 08 - SERRURERIE	59 jrs	Mar 17/06/25	Ven 26/09/25
202	Approvisionnement	10 sem.	Mar 17/06/25	Mar 16/09/25
203	Passivation des éléments métalliques	1 jr	Mar 16/09/25	Mar 16/09/25
204	Scellement et remise en jeu des portes et grilles métalliques	2 jrs	Mer 17/09/25	Jeu 18/09/25
205	Chimisation des escaliers (tôle armé et acier galvanisé)	2 jrs	Ven 19/09/25	Lun 22/09/25
206	Pose main courante intégrant éclairage	1 jr	Mar 23/09/25	Mar 23/09/25
207	Pose de plaque au sol tôle larmée	3 jrs	Mer 24/09/25	Ven 26/09/25
208	Hors poussières	0 jr	Mer 08/10/25	Mer 08/10/25
209	TRAVAUX ZONE 3	61 jrs	Mer 25/06/25	Mer 08/10/25
210	ESPACES N°19, 20 BIS, 21.1 - MAGASINS A POUVRE	61 jrs	Mer 25/06/25	Mer 08/10/25
211	LOT 01 - CURAGE - DEMOLITION	1 jr	Ven 12/09/25	Ven 12/09/25
212	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Ven 12/09/25	Ven 12/09/25
213	Dépose des BAES	1 jr	Ven 12/09/25	Ven 12/09/25
214	LOT 02 - MACONNERIE	41 jrs	Jeu 24/07/25	Mer 08/10/25
215	Approvisionnement	8 sem.	Jeu 24/07/25	Mer 08/10/25
216	Sol :	18 jrs	Lun 15/09/25	Mer 08/10/25
217	Accompagnement passage électrique	2 jrs	Mer 17/09/25	Jeu 18/09/25
218	Nettoyage général à la brosse	2 jrs	Lun 15/09/25	Mar 16/09/25
219	Pose clou podotactile	1 jr	Mer 08/10/25	Mer 08/10/25
220	Murs :	10 jrs	Lun 15/09/25	Ven 26/09/25
221	Enlèvements des mousses	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
222	Descellement d'éléments métalliques	1 jr	Mar 16/09/25	Mar 16/09/25
223	Conservations des lignes rouges historiques	0 jr	Mar 16/09/25	Mar 16/09/25
224	Joint de finition, rebouchage divers	1 jr	Mer 17/09/25	Mer 17/09/25
225	Nettoyage à l'eau + séchage	4 jrs	Mar 23/09/25	Ven 26/09/25
226	Plafond / voûte :	6 jrs	Lun 15/09/25	Lun 22/09/25
227	Enlèvements des mousses	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25

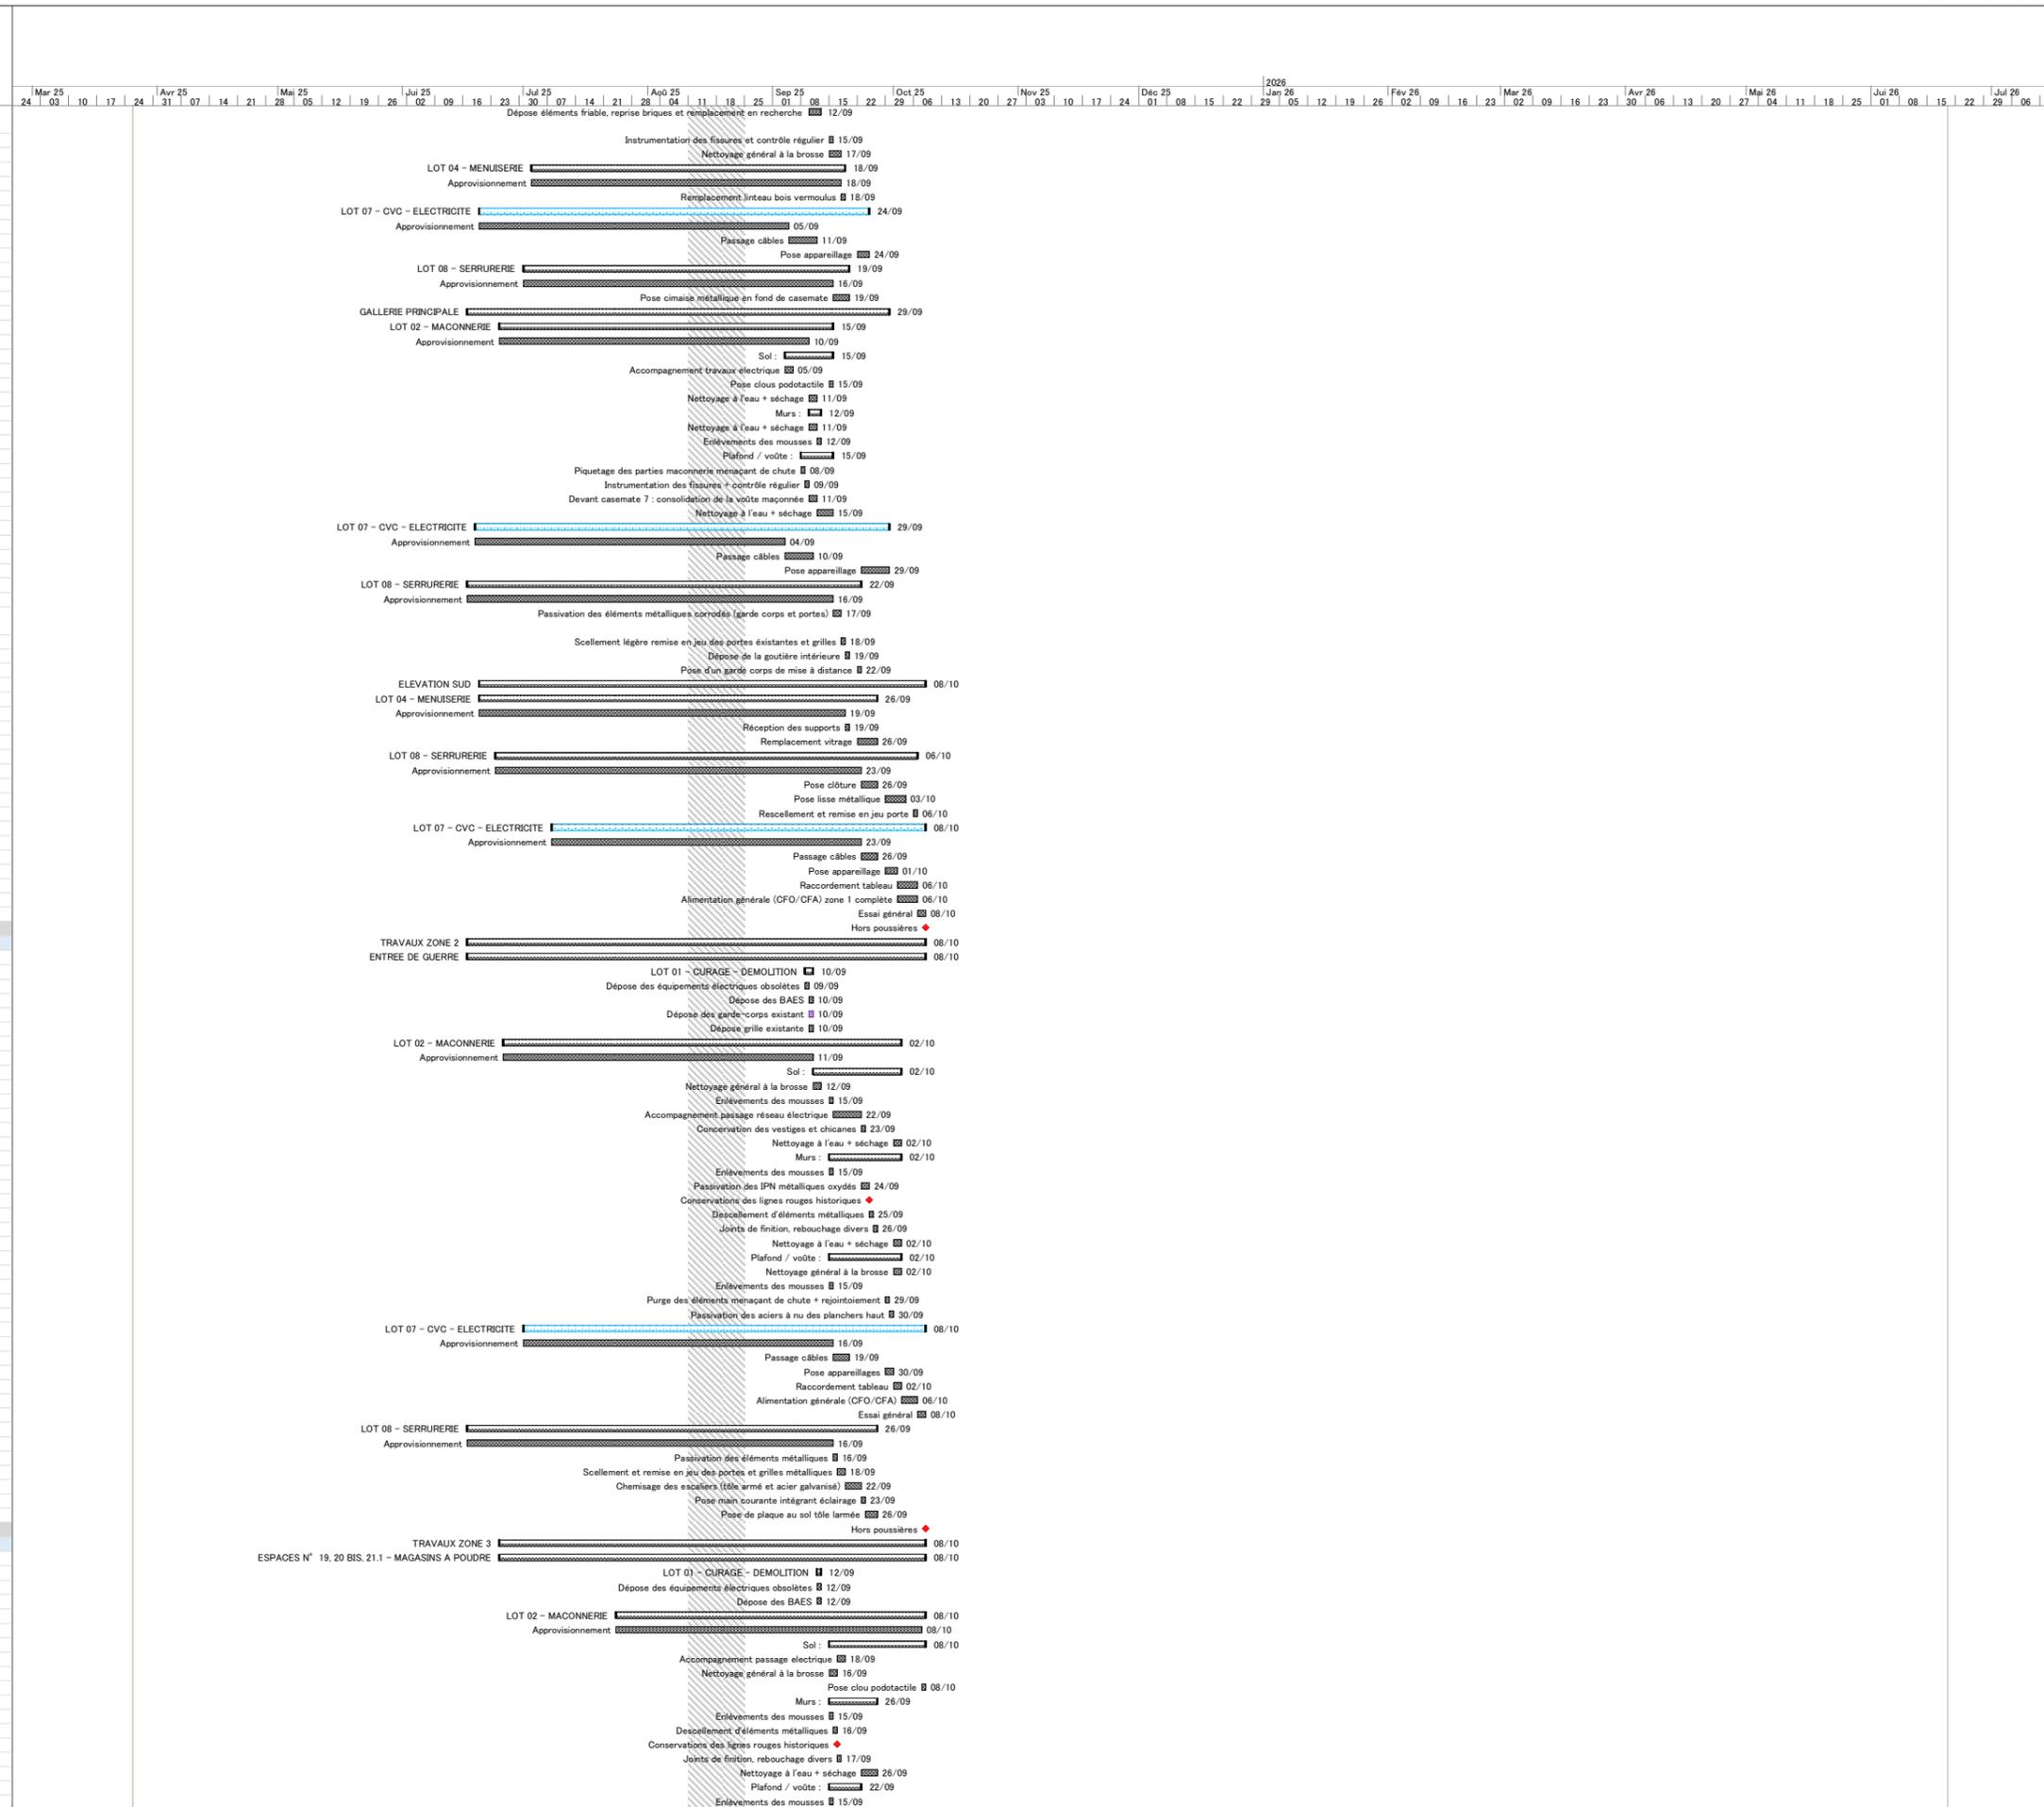

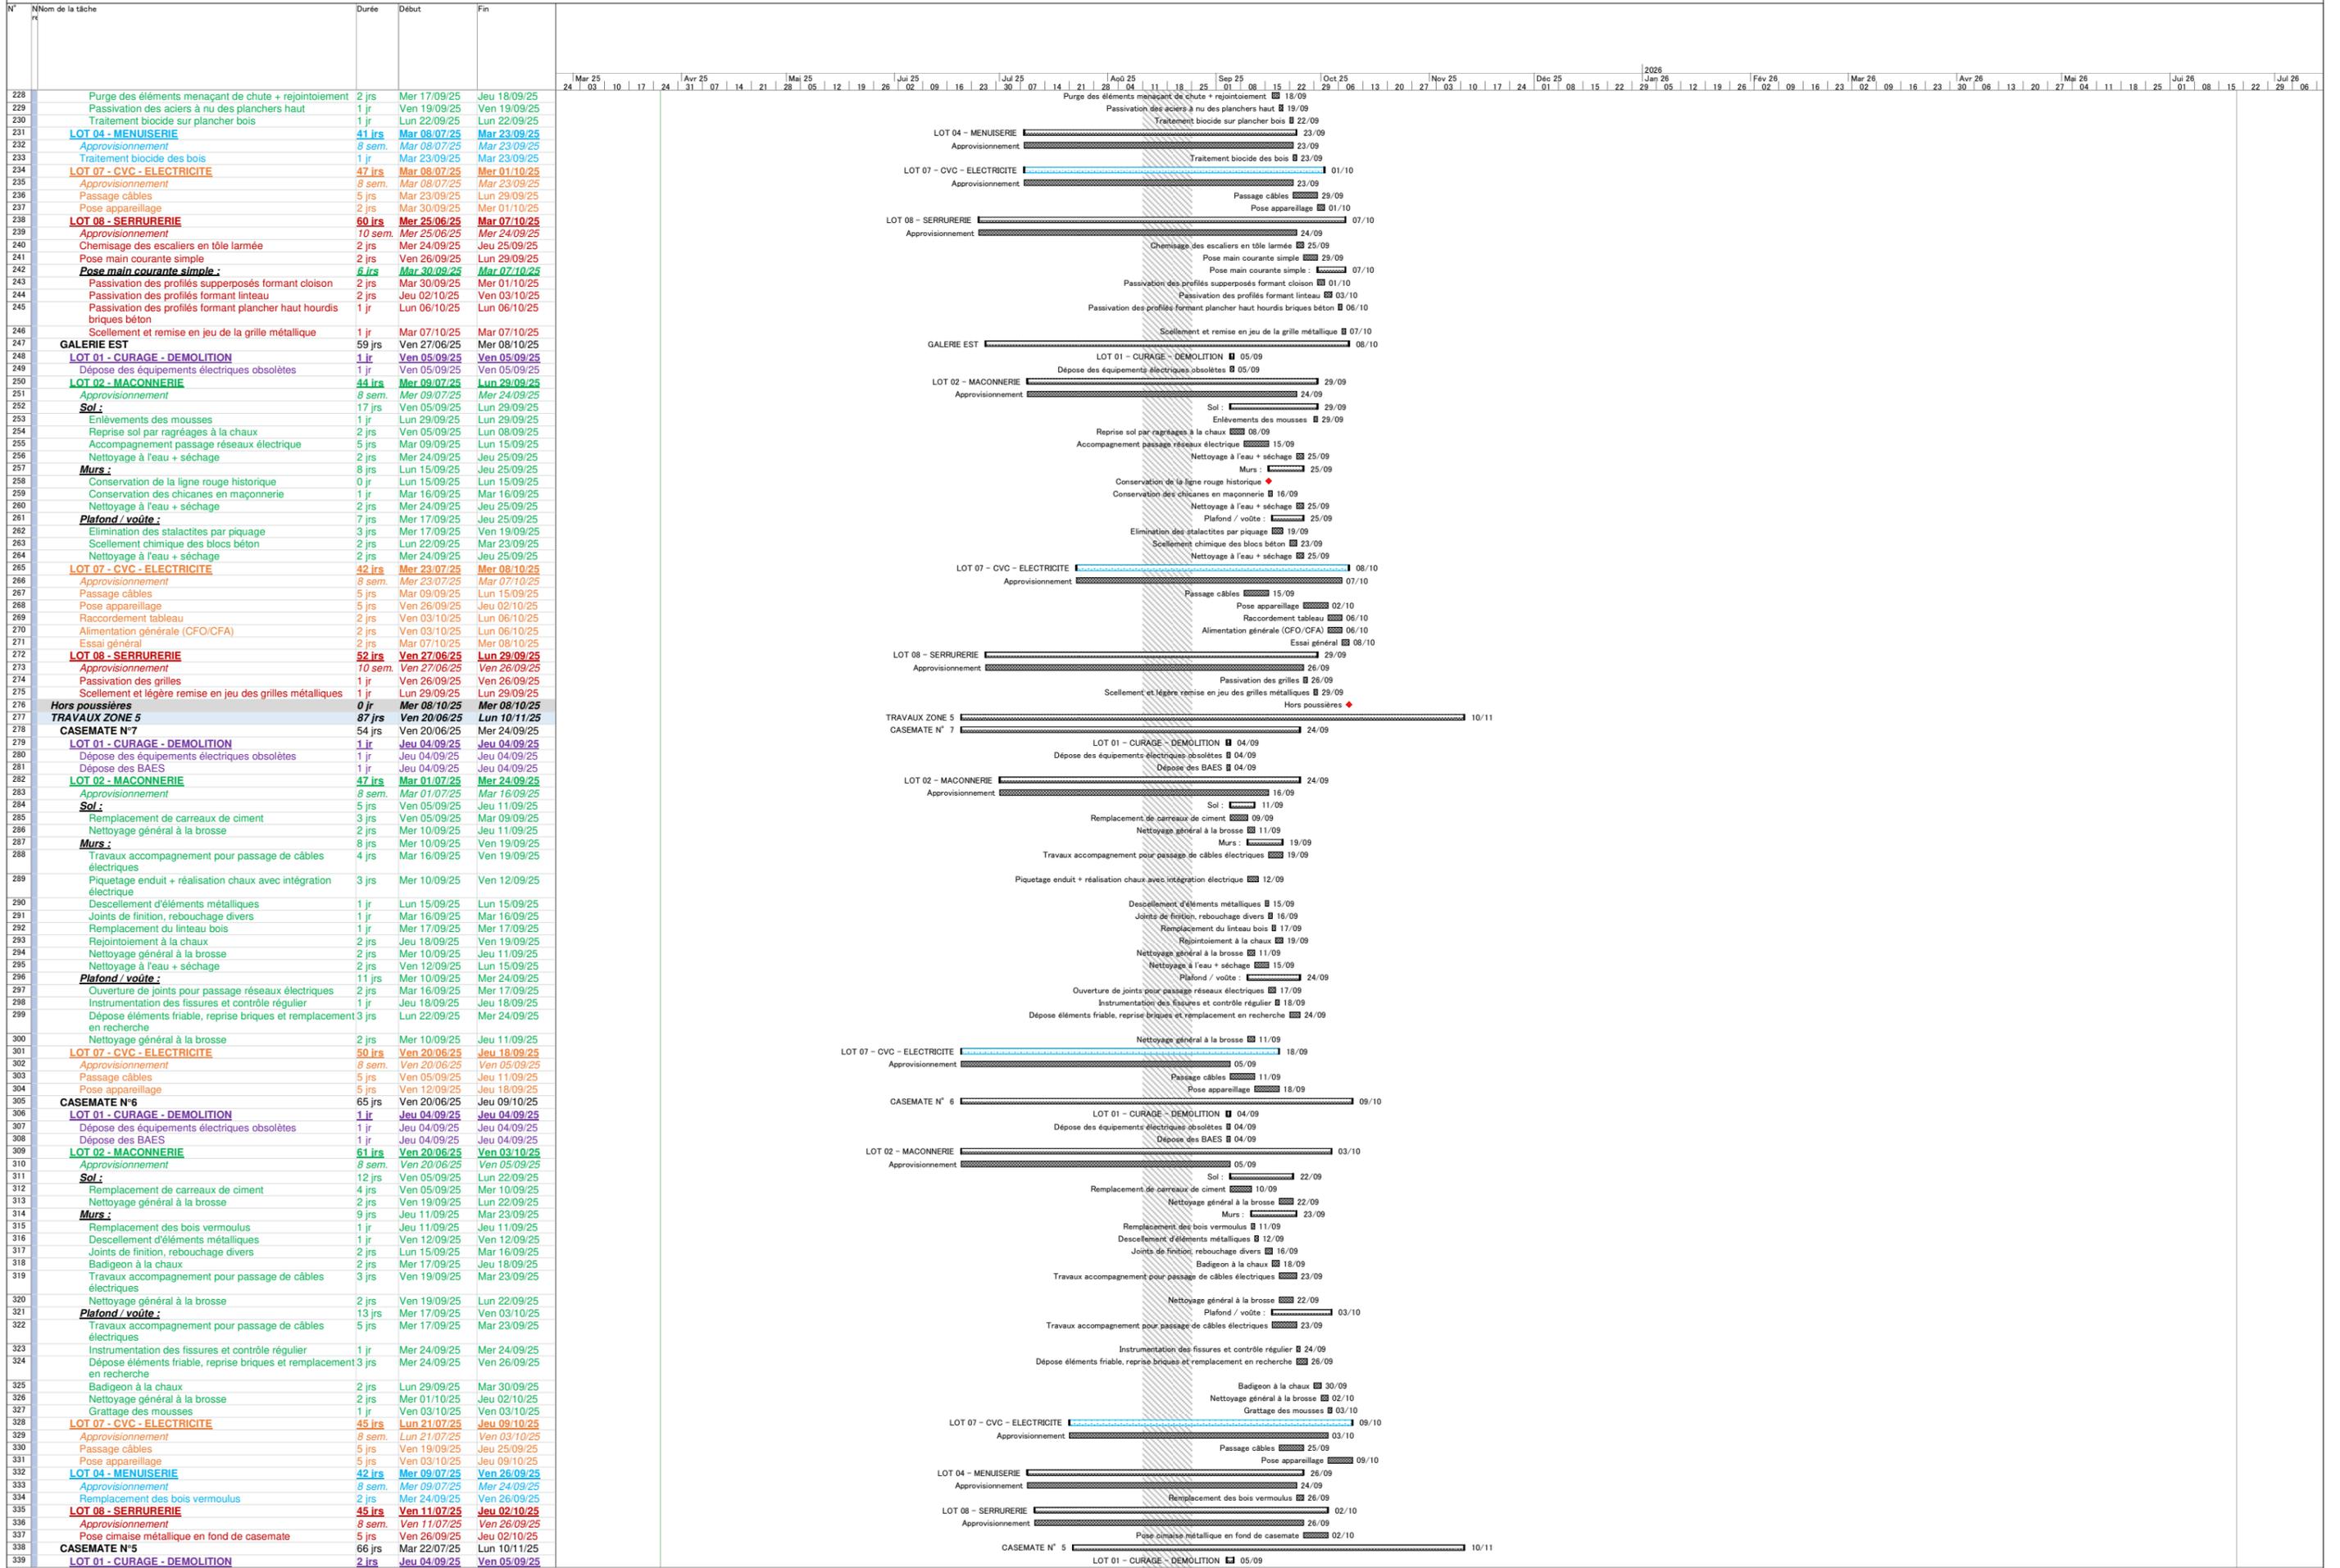

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
340	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25
341	Dépose des BAES	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25
342	Dépose des radiateurs	1 jr	Ven 05/09/25	Ven 05/09/25
343	LOT 02 - MACONNERIE	53 ijs	Mar 22/07/25	Mer 22/10/25
344	Approvisionnement	8 sem.	Mar 22/07/25	Lun 06/10/25
345	Sol :	4 ijs	Ven 17/10/25	Mer 22/10/25
346	Réalisation ragréage	2 ijs	Mar 21/10/25	Mer 22/10/25
347	Nettoyage général à la brosse	2 ijs	Ven 17/10/25	Lun 20/10/25
348	Murs :	11 ijs	Lun 06/10/25	Lun 20/10/25
349	Travaux accompagnement pour passage de câbles électriques	3 ijs	Lun 06/10/25	Mer 08/10/25
350	Descellement d'éléments métalliques	1 jr	Jeu 09/10/25	Jeu 09/10/25
351	Joints de finition, rebouchage divers	3 ijs	Mar 14/10/25	Jeu 16/10/25
352	Nettoyage général à la brosse	2 ijs	Ven 17/10/25	Lun 20/10/25
353	Plafond / voûte :	11 ijs	Lun 06/10/25	Lun 20/10/25
354	Ouverture de joints pour passage réseaux électriques	5 ijs	Lun 06/10/25	Ven 10/10/25
355	Reprise maçonnerie des briques en recherche	2 ijs	Ven 10/10/25	Lun 13/10/25
356	Nettoyage général à la brosse	2 ijs	Ven 17/10/25	Lun 20/10/25
357	LOT 04 - MENUISERIE	28 ijs	Jeu 18/09/25	Lun 27/10/25
358	Approvisionnement	5 sem.	Jeu 18/09/25	Jeu 23/10/25
359	Préparation des supports	1 jr	Jeu 23/10/25	Jeu 23/10/25
360	Vérification / remise en jeu / réglage de la porte en bois coul	1 jr	Ven 24/10/25	Ven 24/10/25
361	Mise en peinture de la porte	1 jr	Lun 27/10/25	Lun 27/10/25
362	LOT 08 - SERRURERIE	54 ijs	Mer 30/07/25	Ven 31/10/25
363	Approvisionnement	10 sem.	Mer 30/07/25	Mar 28/10/25
364	Pose cimaise métallique en fond de casemate	4 ijs	Mar 28/10/25	Ven 31/10/25
365	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	66 ijs	Mar 22/07/25	Lun 10/11/25
366	Approvisionnement	8 sem.	Mar 22/07/25	Lun 06/10/25
367	Passage réseaux et modification	5 ijs	Lun 06/10/25	Ven 10/10/25
368	Pose radiateurs à eau	2 ijs	Lun 13/10/25	Mar 14/10/25
369	Pose appareillage	5 ijs	Mar 21/10/25	Lun 27/10/25
370	Raccordement tableau	4 ijs	Mar 28/10/25	Ven 31/10/25
371	Alimentation générale (GFO/CFA)	4 ijs	Lun 03/11/25	Jeu 06/11/25
372	Essai général	2 ijs	Ven 07/11/25	Lun 10/11/25
373	Hors poussières	0 jr	Lun 10/11/25	Lun 10/11/25
374	TRAVAUX ZONE 4	196,8 ijs	Jeu 19/06/25	Lun 13/04/26
375	GAINE NORD/OUEST	67 ijs	Jeu 19/06/25	Ven 10/10/25
376	LOT 01 - CURAGE - DEMOLITION	2 ijs	Ven 05/09/25	Lun 08/09/25
377	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Ven 05/09/25	Ven 05/09/25
378	Dépose de la chapelle bois existante en bois / conservation chicane	1 jr	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25
379	LOT 02 - MACONNERIE	42 ijs	Mar 08/07/25	Mer 24/09/25
380	Approvisionnement	8 sem.	Mar 08/07/25	Mar 23/09/25
381	Sol :	12 ijs	Mar 09/09/25	Mer 24/09/25
382	Accompagnement travaux électrique	2 ijs	Mar 09/09/25	Mer 10/09/25
383	Enlèvements des mousses	1 jr	Jeu 11/09/25	Jeu 11/09/25
384	Conservation des vestiges de chicanes	1 jr	Ven 12/09/25	Ven 12/09/25
385	Nettoyage à l'eau + séchage	2 ijs	Mar 23/09/25	Mer 24/09/25
386	Murs :	10 ijs	Jeu 11/09/25	Mer 24/09/25
387	Enlèvements des mousses	1 jr	Jeu 11/09/25	Jeu 11/09/25
388	Conservation de la ligne rouge historique	0 jr	Jeu 11/09/25	Jeu 11/09/25
389	Descellement d'éléments métalliques	2 ijs	Ven 12/09/25	Ven 15/09/25
390	Joints de finitions et rebouchages divers	2 ijs	Mar 16/09/25	Mer 17/09/25
391	Nettoyage à l'eau + séchage	2 ijs	Mar 23/09/25	Mer 24/09/25
392	Plafond / voûte :	10 ijs	Jeu 11/09/25	Mer 24/09/25
393	Enlèvements des mousses	1 jr	Jeu 11/09/25	Jeu 11/09/25
394	Nettoyage à l'eau + séchage	2 ijs	Mar 23/09/25	Mer 24/09/25
395	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	64 ijs	Mar 24/06/25	Ven 10/10/25
396	Approvisionnement	8 sem.	Mar 24/06/25	Mar 09/09/25
397	Passage câbles	5 ijs	Mar 09/09/25	Lun 15/09/25
398	Pose appareillage	10 ijs	Lun 29/09/25	Ven 10/10/25
399	LOT 08 - SERRURERIE	57 ijs	Jeu 19/06/25	Ven 26/09/25
400	Approvisionnement	10 sem.	Jeu 19/06/25	Jeu 18/09/25
401	Réalisation d'une plaque commémorative + pose au sol	1 jr	Jeu 18/09/25	Jeu 18/09/25
402	Pose sur maçonnerie d'une plaque commémorative murale	1 jr	Ven 19/09/25	Ven 19/09/25
403	Pose passerelle caillbotis acier (intégrant LED) + garde corps et pupitre	5 ijs	Lun 22/09/25	Ven 26/09/25
404	CASEMATE DE BOURGES	82 ijs	Mer 25/06/25	Jeu 06/11/25
405	LOT 01 - CURAGE - DEMOLITION	3 ijs	Ven 05/09/25	Mar 09/09/25
406	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Ven 05/09/25	Ven 05/09/25
407	Dépose BAES	1 jr	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25
408	Dépose des potelets métalliques	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25
409	LOT 02 - MACONNERIE	42 ijs	Mar 10/09/25	Jeu 08/11/25
410	Approvisionnement	8 sem.	Mar 10/09/25	Jeu 06/11/25
411	Sol :	11 ijs	Mer 10/09/25	Mer 24/09/25
412	Accompagnement passage réseau électrique	2 ijs	Mer 10/09/25	Jeu 11/09/25
413	Reprise de maçonnerie au droit des potelets déposés	2 ijs	Ven 12/09/25	Lun 15/09/25
414	Nettoyage général à la brosse	2 ijs	Mar 23/09/25	Mer 24/09/25
415	Murs :	12 ijs	Mar 16/09/25	Mer 01/10/25
416	Enlèvements des mousses	1 jr	Mar 16/09/25	Mar 16/09/25
417	Passivation des aciers à nu	1 jr	Mer 17/09/25	Mer 17/09/25
418	Conservation de la ligne rouge historique	0 jr	Mer 17/09/25	Mer 17/09/25
419	Descellement des éléments métalliques	1 jr	Jeu 18/09/25	Jeu 18/09/25
420	Joints de finitions, rebouchages divers	1 jr	Ven 19/09/25	Ven 19/09/25
421	Nettoyage à l'eau + séchage	2 ijs	Mar 30/09/25	Mer 01/10/25
422	Plafond / voûte :	7 ijs	Mar 16/09/25	Mer 24/09/25
423	Enlèvements des mousses	1 jr	Mar 16/09/25	Mar 16/09/25
424	Purge des éléments menaçant de chute	2 ijs	Mer 17/09/25	Jeu 18/09/25
425	Passivation des aciers à nu des planchers haut	1 jr	Ven 19/09/25	Ven 19/09/25
426	Badigeon à la chaux	1 jr	Lun 22/09/25	Lun 22/09/25
427	Nettoyage général à la brosse	2 ijs	Mar 23/09/25	Mer 24/09/25
428	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	61 ijs	Mer 25/06/25	Mer 08/10/25
429	Approvisionnement	8 sem.	Mer 25/06/25	Mer 10/09/25
430	Passage câbles	5 ijs	Mer 10/09/25	Mar 16/09/25
431	Pose appareillages	5 ijs	Jeu 02/10/25	Mer 08/10/25
432	LOT 08 - SERRURERIE	53 ijs	Jeu 26/06/25	Lun 29/09/25
433	Approvisionnement	10 sem.	Jeu 26/06/25	Jeu 25/09/25
434	Passivation des éléments métalliques corrodés	1 jr	Jeu 25/09/25	Jeu 25/09/25
435	Scellement et légère remise en jeu des grilles métalliques	2 ijs	Ven 26/09/25	Lun 29/09/25
436	Restauration peinture des deux canons	15 ijs	Ven 20/03/26	Lun 13/04/26
437	GALLERIE OUEST	77 ijs	Jeu 19/06/25	Ven 24/10/25
438	LOT 01 - CURAGE - DEMOLITION	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25
439	Dépose des équipements électriques obsolètes	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25
440	Dépose de la chapelle bois existante en bois / conservation chicane	1 jr	Mer 10/09/25	Mer 10/09/25
441	LOT 02 - MACONNERIE	42 ijs	Mar 01/07/25	Mer 17/09/25
442	Approvisionnement	8 sem.	Mar 01/07/25	Mar 16/09/25
443	Sol :	5 ijs	Jeu 11/09/25	Mer 17/09/25
444	Accompagnement passage réseaux électriques	2 ijs	Jeu 11/09/25	Ven 12/09/25
445	Nettoyage général à la brosse	2 ijs	Mar 16/09/25	Mer 17/09/25
446	Murs :	3 ijs	Lun 15/09/25	Mer 17/09/25
447	Enlèvements des mousses	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
448	Conservation de la ligne rouge historique	0 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
449	Nettoyage à l'eau + séchage	2 ijs	Mar 16/09/25	Mer 17/09/25
450	Plafond / voûte :	3 ijs	Lun 15/09/25	Mer 17/09/25
451	Enlèvements des mousses	1 jr	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
452	Nettoyage à l'eau + séchage	2 ijs	Mar 16/09/25	Mer 17/09/25
453	LOT 07 - CVC - ELECTRICITE	53 ijs	Jeu 26/06/25	Lun 29/09/25
454	Approvisionnement	8 sem.	Jeu 26/06/25	Jeu 11/09/25

