



Commission de Suivi de Site StocaMine

Réunion du 7 Avril 2016



Ordre du jour



- **État d'avancement des travaux de déstockage (MDPA)**
- **Destination des fûts retirés (MDPA)**
- **Résultats des expertises conduites
à la demande du Préfet (ARTELIA)**
- **Calendrier prévisionnel
de la procédure de fermeture (DREAL)**
- **Points divers**

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation à fin mars 2016



	Colis déstockés				Colis déplacés	
	nature	nombre	masse (t)	masse Hg (t)	nombre	dont amiante
Bloc 21	mercuriels	1 350	1 863	4,2	2 062	211
	arséniés	148	101	0,0		
Bloc 11	mercuriels	2	2	0,6	491	0
	laboratoire	14	16	0,8		
Total		1 514	1 982	5,6	2 553	211

Nota : Les quantités de mercure ont été réévaluées dans le cadre de la Tierce-Expertise

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation à fin mars 2016



Bloc 21

Déstockage de **1350 colis de déchets mercuriels**
représentant **4,2 tonnes de mercure**



 Zone déstockée  Front arrêté  Zone minièrement dégradée


Etat d'avancement des travaux de déstockage

Situation à fin mars 2016



Bloc 11

Déstockage de **2 colis de déchets mercuriels**
et **14 colis de déchets de laboratoire**
représentant **1,4 tonnes de mercure**

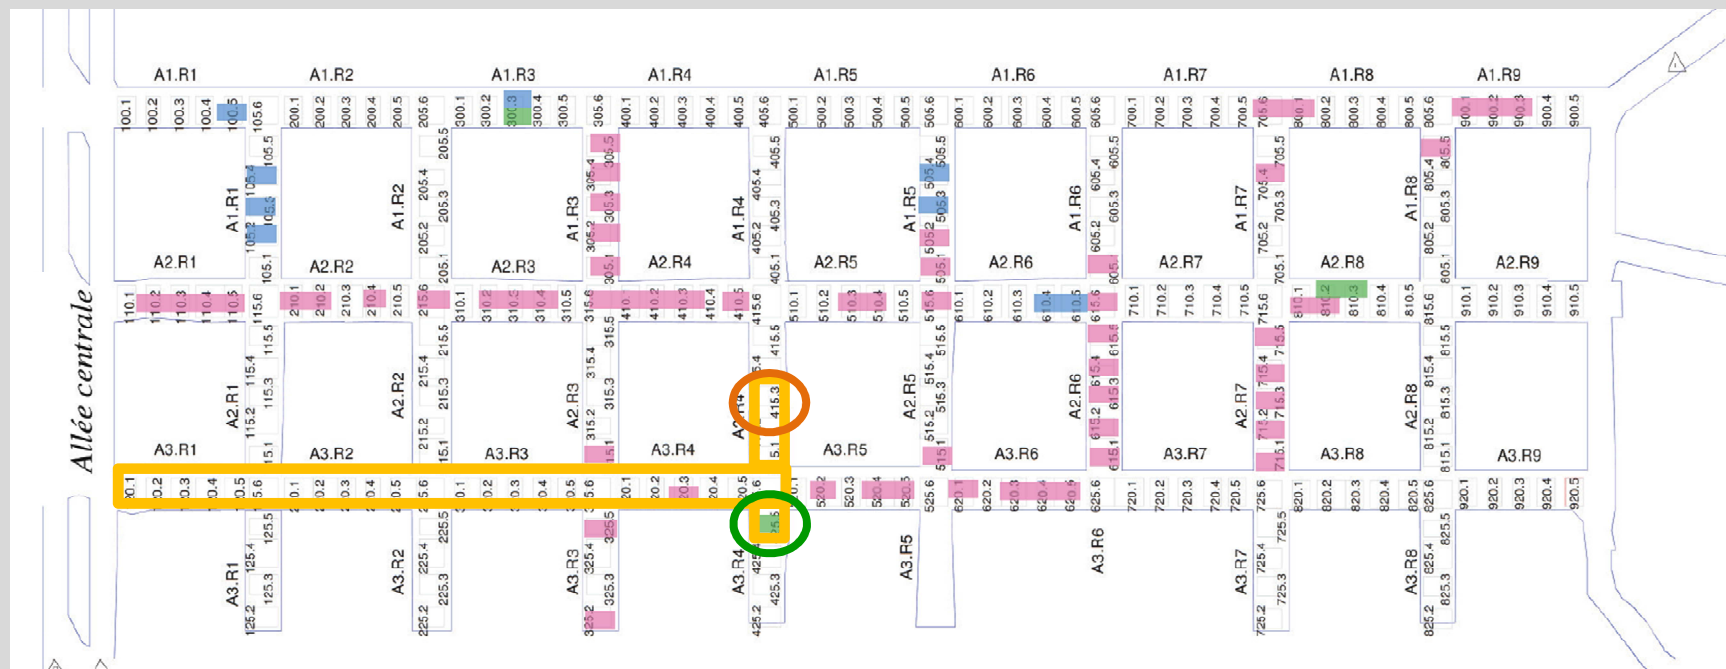

 Zone déstockée

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Reste à réaliser



	Colis à déstocker				Colis à déplacer	
	nature	nombre	masse (t)	masse Hg (t)	nombre	dont amiante
Bloc 12	mercuriels	200	217	13,9	3 262	345
Bloc 23	mercuriels	70	71	4,8	2 800	426
Total		270	288	18,7	5 062	771

Au global pour les Blocs 11, 12, 21 et 23

*prévision de déstockage de **24,3 tonnes de mercure***

*soit **95,3 %** de la quantité contenue initialement dans le stockage*

Nota : Les quantités de mercure ont été réévaluées dans le cadre de la Tierce-Expertise

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Reste à réaliser



Bloc 12

A déstocker : **200 colis de déchets mercuriels**
représentant **13,9 tonnes de mercure**



Zone déstockée



Sens de progression du déstockage


Etat d'avancement des travaux de déstockage

Reste à réaliser



Bloc 23

A déstocker : **70 colis de déchets mercuriels**
représentant **4,8 tonnes de mercure**

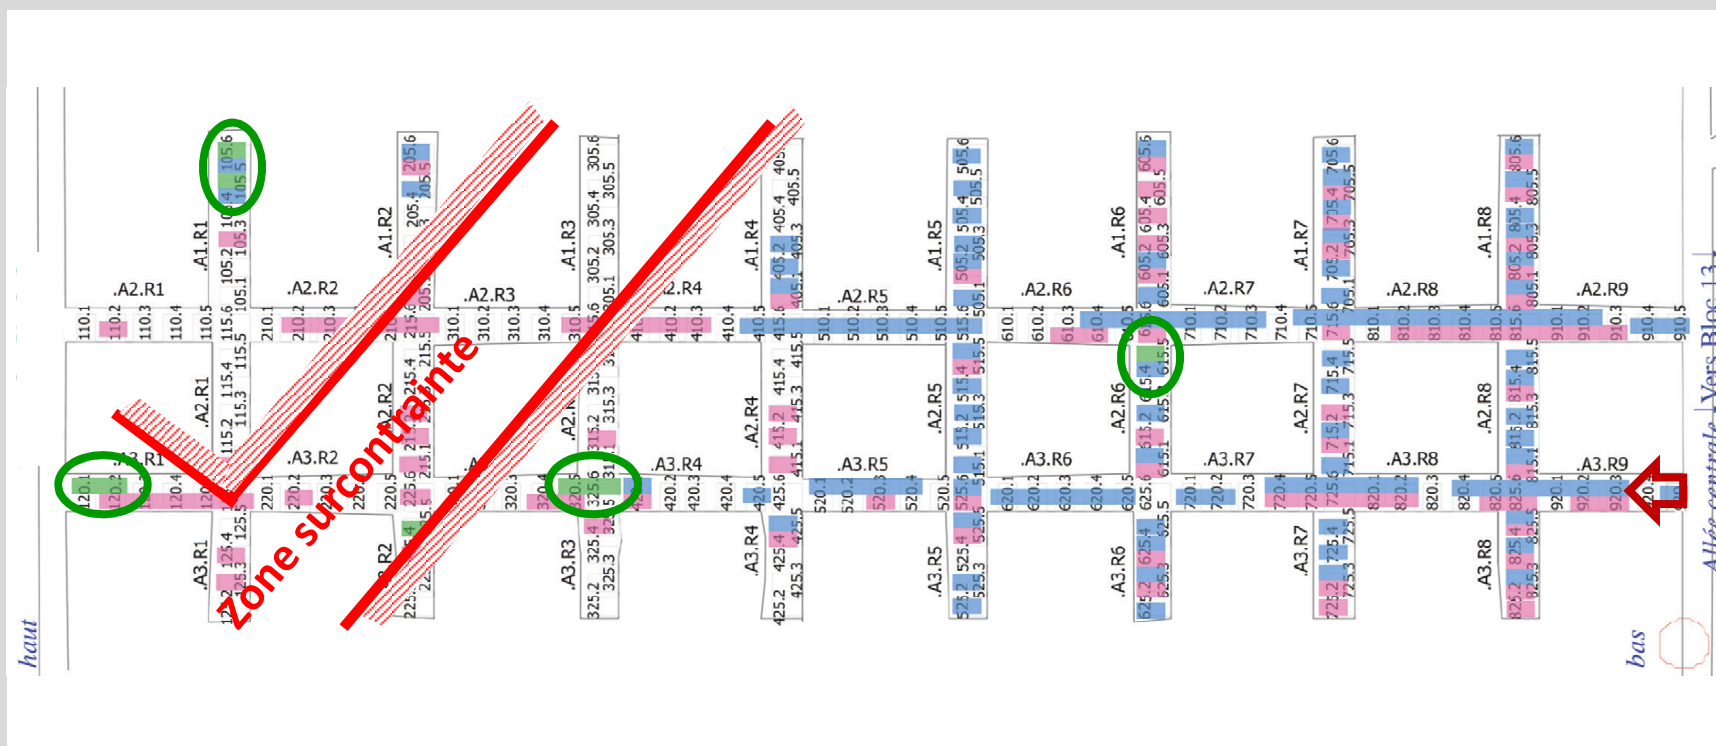

Zone déstockée



Sens de progression du déstockage

Etat d'avancement des travaux de déstockage

Démarrage des travaux dans le Bloc 12



Front de l'Allée 1



Toit peu dégradé, mais :

- Soufflage du mur
- Big-bags comprimés
- Risque arsenic
- Décontamination difficile

Destination des fûts retirés

Situation à fin mars 2016



Expéditions réalisées :

- 89 camions
 - 2819 colis reconditionnés dont :
 - 108 conteneurs 3 fûts
 - 2711 palettes 2 sur-fûts
- pour une masse de **1902 tonnes**
représentant **3,46 tonnes de mercure**



Sites d'élimination :

- GSES pour **1856 tonnes** contenant **3,43 tonnes de mercure**
- SOLITOP pour **47 tonnes** (5 CAP) contenant **27 kg de mercure**

En recherche de filière d'élimination :

- **24,7 tonnes** (5 CAP) de déchets contenant **2,20 tonnes de mercure**



Merci de votre attention
