



Commission de suivi de site du 02 juillet 2026



Etat d'avancement des travaux de fermeture du site

Accident opérateur BYTPRF - chute de hauteur

30 mars 2026 : chute d'un opérateur BYTPRF d'une hauteur de 3,2 m depuis un échafaudage

- Intervention immédiate du SDIS68 et Gendarmerie
- Opérateur ressorti le soir même de l'hôpital, aucune blessure, quelques contusions
- Suspension immédiate du chantier concerné par Moe et MDPA

31 mars 2026 : inspection de la DREAL

07 avril 2026 : suspension de l'ensemble des travaux en hauteur par Moe

Actions entreprises :

- Remise à plat de l'ensemble des procédures liées aux travaux en hauteur,
- Recherche d'échafaudages mieux adaptés,
- Recyclage des formations du personnel BYTPRF

Depuis le 17 avril 2026 : reprise progressive des chantiers des barrages 9 et 10



Exercice incendie en lien avec SDIS

Scénario : le 22 mai, simulation d'un incendie d'un engin en fond de mine avec émission de fumée

Objectifs :


- Mise en situation opérationnelle d'un scénario du POI
- Application des procédures du plan ETARE
- Tester la coordination de l'engagement des moyens MDPA / SIS68 et SIS67

Mobilisation :

- Personnels MDPA, BYTPRF, RSA, SBGC
- SDIS68 + GELD67 – 26 personnes mobilisées et 10 moyens de secours
- Astreintes DREAL et Préfecture

Bilan :

- Bonne coordination SDIS, MDPA, résultat d'exercices réguliers

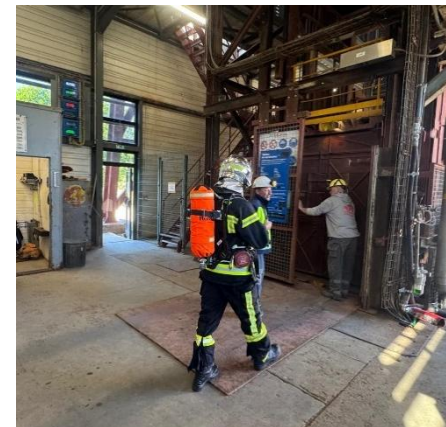

Etat d'avancement des travaux de fermeture du site


Point d'avancement

Travaux terminés

- Barrages 1 à 8
- Remblayage des blocs 15, 26 et 16 partie nord
- Remblayage galeries RAT2/RAS2, AJ1 Nord, AQ2

Travaux en cours

- Barrage 9:
 - 9a : surexcavation en cours
 - 9b : BAP réalisé
- Barrage 10a : serrement de sel interne, surexcavation terminés. Préparation pour BAP
- Préparation pour remblayage AJ1 sud

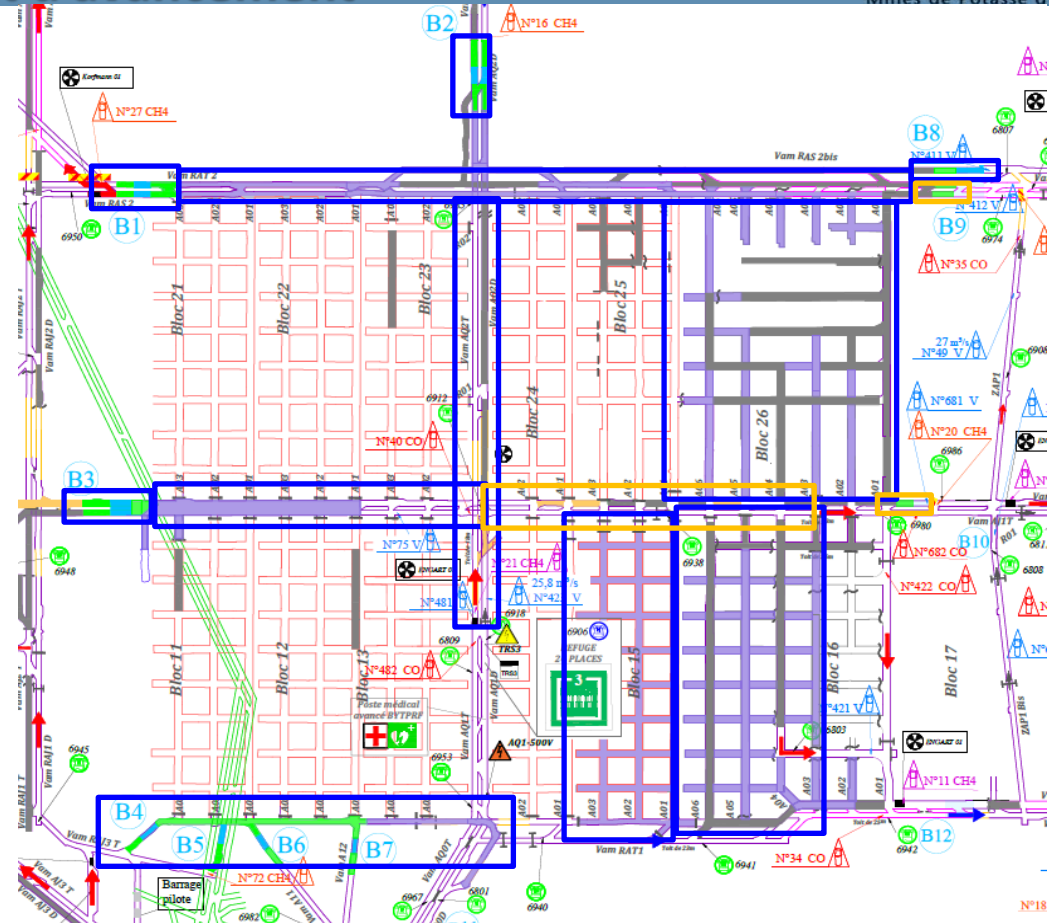

Suivi du chantier – Quelques photos

Surexcavation barrage 9b



Coffrage longitudinal barrage 9b




Suivi du chantier – Quelques photos

Remblayage voie AJ1 Nord



Remblayage bloc 16 nord

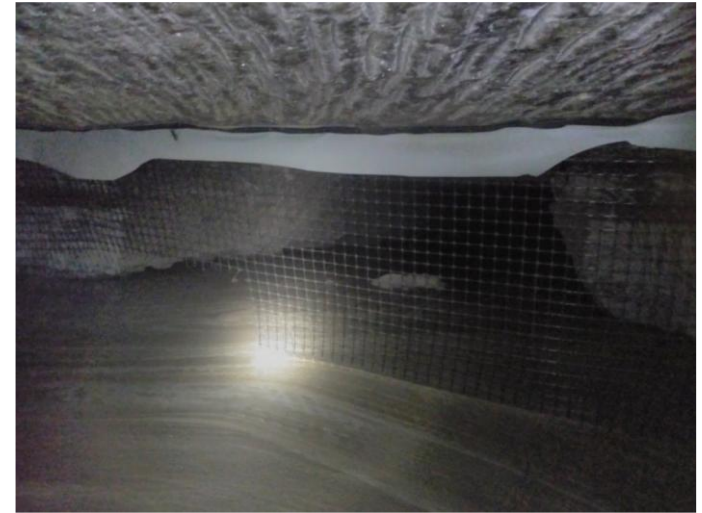

ment **MDPA**
Mines de Potasse d'Alsace


[illegible]

MOPPA
Mines de Potasse d'Alsace

[illegible]


Piézomètre VLPB2 :

→ Observation de l'envoyage du point bas du « compartiment Marie-Louise »

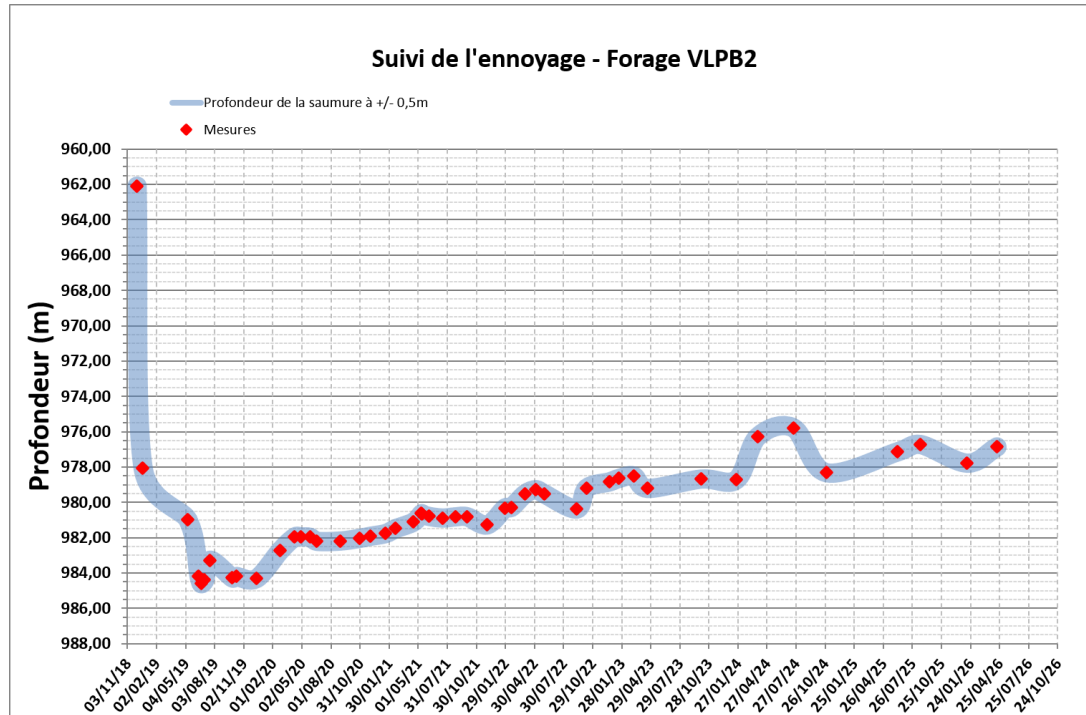


Piézomètre VAPB2 :

→ Observation de l'ennoyage du point bas du « compartiment Amélie »

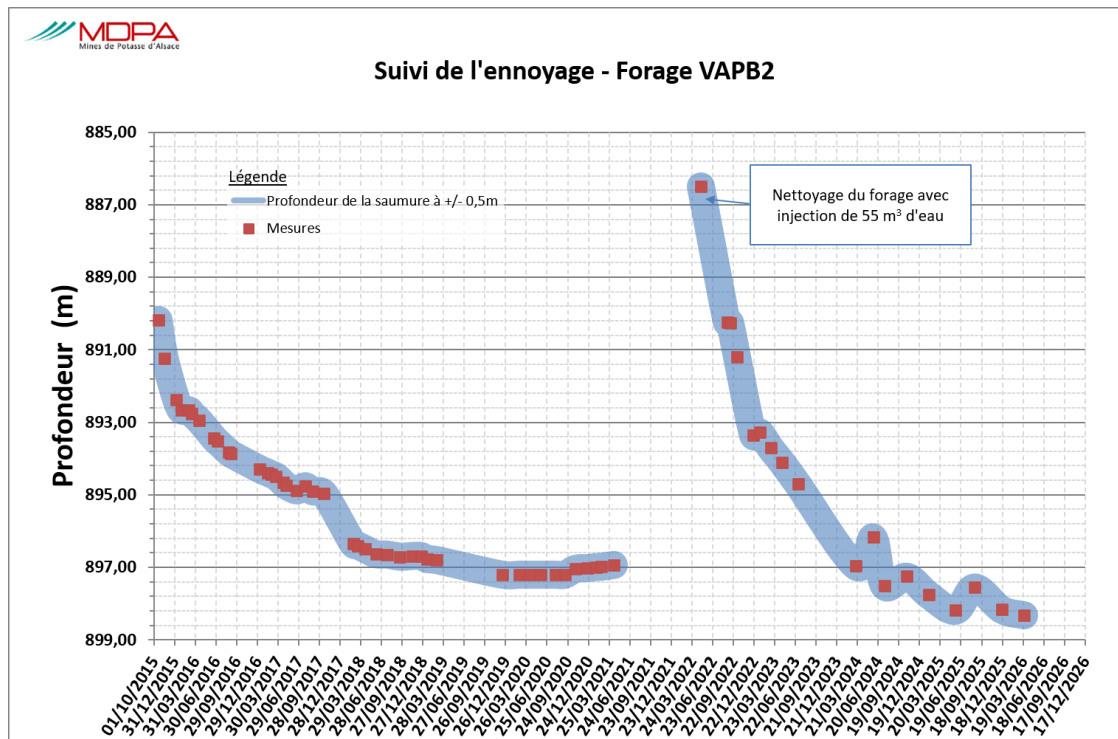


- Inspection caméra réalisée les 06 et 07 mai 2026 par la société TERRATEC
- Forage VLPB2 :
« Il n'y a pas eu d'évolution majeure dans le forage par rapport à 2024. »

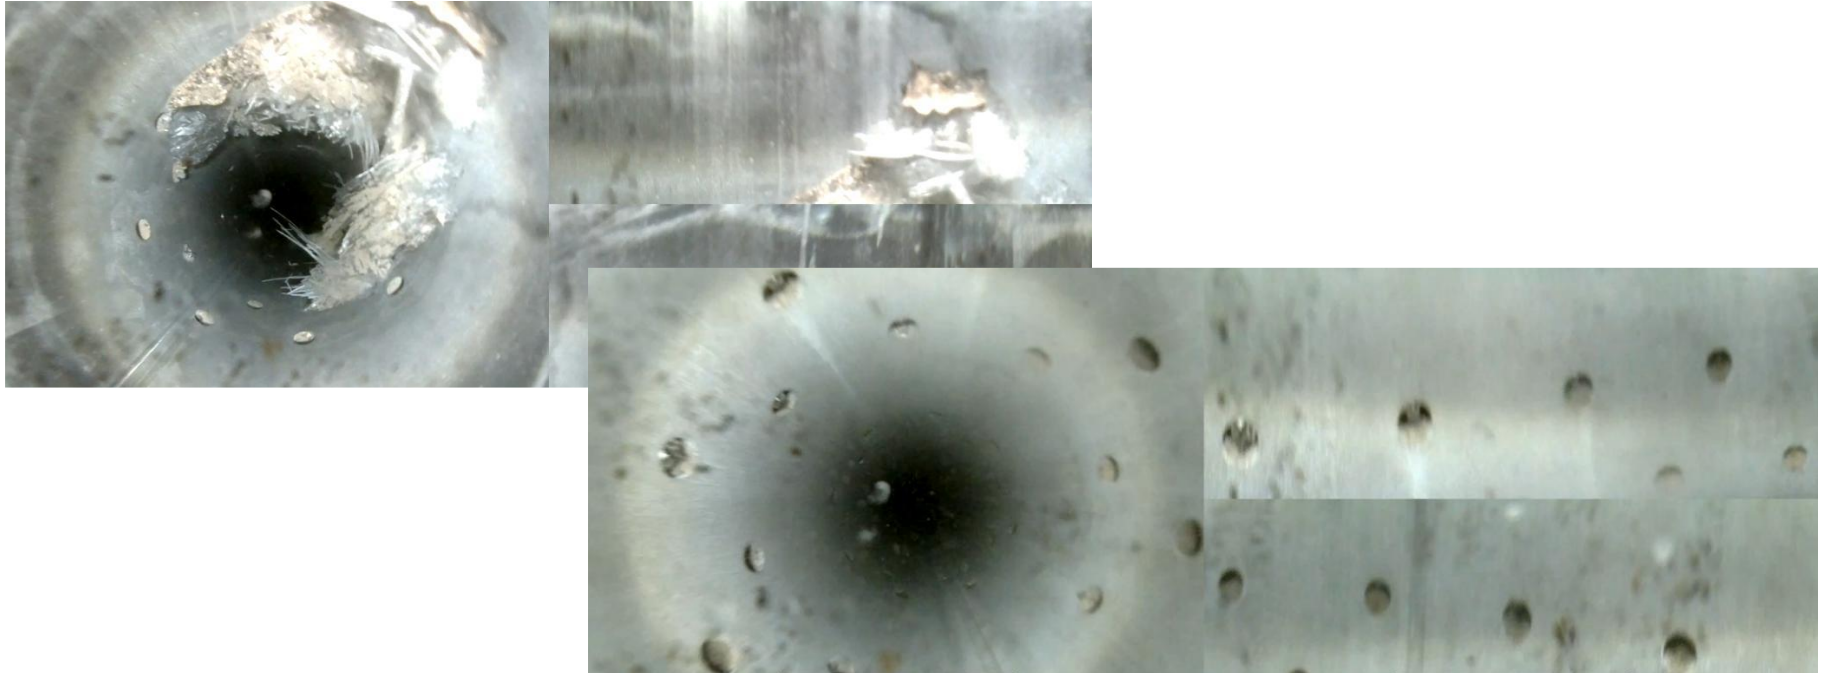

- Forage VAPB2 :

« Le forage est globalement moins propre qu'en 2024. Plus de dépôts ont été découverts lors de l'inspection récente. »

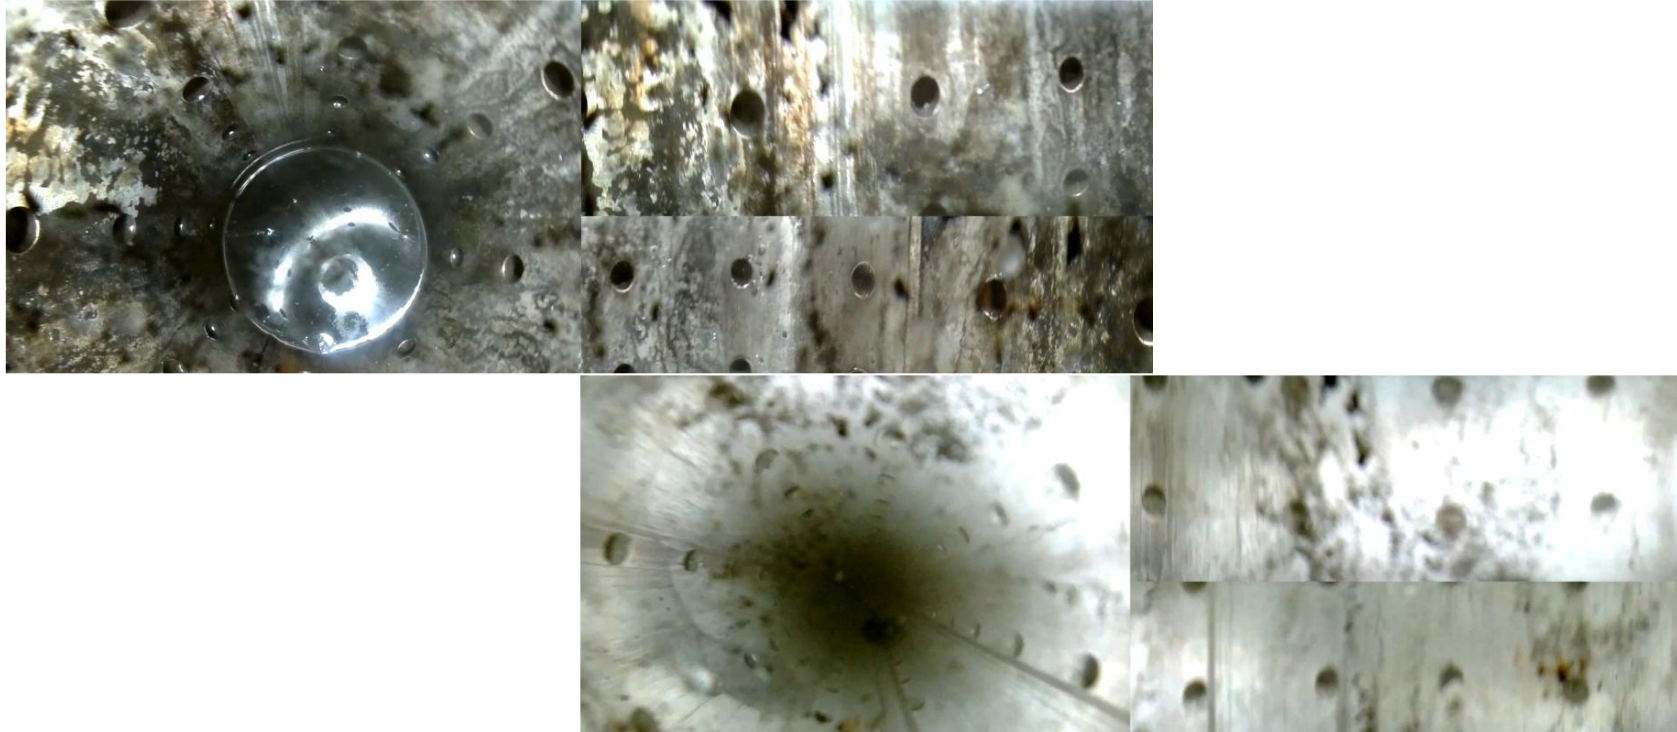



Etude 3^{ème} forage : surveillance compartiment Berrwiller

- Remise de l'étude exigée par AP du 28/09/2023 en 2025, à savoir :
 - une étude visant à compléter le réseau de suivi de l'ennoyage existant par un troisième sondage profond captant le réservoir profond de Berrwiller ;
- Tierce expertise demandée par M. le Préfet
- Etude confiée à ANTEA – rendu attendu en juillet 2026, intégrant les résultats des inspections vidéos



Communication externe :

Fin des lettres d'information : nouveau site web :
mdpa-stocamine.fr, actualités depuis le 28 septembre 2023,
site entièrement dédié au chantier de confinement et aux
missions des MDPA

mdpa-stocamine.org reste en ligne : site d'archives

Navigation possible d'un site vers l'autre en cours de finalisation



Fin

Merci de votre attention
