Planning DCE Indice E_2020 07 13 _Aménagement de la cité des paysages de Sion à Saxon Sion (54)

N°	WBS	Nom de la tâche	Prédécesseurs	Durée	Début	Fin
0	**0**	**Planning DCE_AMENAGEMENT DE LA CITE DES PAYSAGES DE SION_E_2020 07 13 - travaux TCE**		**317 jrs**	**Lun 30/11/20**	**Jeu 03/03/22**
1	**1**	**PERIODE DE PREPARATION TCE**		**27 jrs**	**Lun 30/11/20**	**Mer 13/01/21**
2	1.1	OS notification et démarrage de la péridode de préparation TCE		1 jr	Lun 30/11/20	Lun 30/11/20
3	1.2	période de préparation contractuelle de 1 mois	2DD	21 jrs	Lun 30/11/20	Mar 05/01/21
4	1.3	établissement du plan de retrait amiante	2DD	5 jrs	Lun 30/11/20	Ven 04/12/20
5	1.4	instruction plan de retrait amiante	4	22 jrs	Lun 07/12/20	Mer 13/01/21
6	**1.5**	**ETUDES TCE**		**20 jrs**	**Lun 30/11/20**	**Lun 04/01/21**
7	**1.5.1**	**ETUDES EXE STRUCTURE**		**18 jrs**	**Lun 30/11/20**	**Mer 23/12/20**
8	1.5.1.1	cahier de fiche technique gros oeuvre	2DD	4 jrs	Lun 30/11/20	Jeu 03/12/20
9	1.5.1.2	plan EXE structure réseaux enterrés	14	3 jrs	Lun 14/12/20	Mer 16/12/20
10	1.5.1.3	plan EXE structure dallage RDC	9;14;16;27	5 jrs	Jeu 17/12/20	Mer 23/12/20
11	1.5.1.4	plans EXE coffrages	8	5 jrs	Ven 04/12/20	Jeu 10/12/20
12	1.5.1.5	plans EXE ferraillages	11	5 jrs	Ven 11/12/20	Jeu 17/12/20
13	**1.5.2**	**ETUDES EXE CORPS D'ETAT TECHNIQUE**		**20 jrs**	**Lun 30/11/20**	**Lun 04/01/21**
14	1.5.2.1	plan de réservations CET entreprise fluides CVC PB SA	2DD	10 jrs	Lun 30/11/20	Ven 11/12/20
15	1.5.2.2	cahier de fiches technique CET entreprise fluides CVC PB SA	14	5 jrs	Lun 14/12/20	Ven 18/12/20
16	1.5.2.3	plan de réservations CET entreprise CF/ cf	2DD	10 jrs	Lun 30/11/20	Ven 11/12/20
17	1.5.2.4	cahier de fiches technique CET entreprise CF/ cf	16	5 jrs	Lun 14/12/20	Ven 18/12/20
18	**1.5.2.5**	**plans bon pour EXE plomberie**		**10 jrs**	**Lun 14/12/20**	**Lun 04/01/21**
19	1.5.2.5.1	plan EXE plomberie RDC	14	10 jrs	Lun 14/12/20	Lun 04/01/21
20	**1.5.2.6**	**plans bon pour EXE chauffage**		**10 jrs**	**Lun 14/12/20**	**Lun 04/01/21**
21	1.5.2.6.1	plan EXE chauffage RDC	14	10 jrs	Lun 14/12/20	Lun 04/01/21
22	**1.5.2.7**	**plans bon pour EXE ventilation**		**10 jrs**	**Lun 14/12/20**	**Lun 04/01/21**
23	1.5.2.7.1	plan EXE ventilation RDC	14	10 jrs	Lun 14/12/20	Lun 04/01/21
24	**1.5.2.8**	**plans bon pour EXE électricité CF cf**		**10 jrs**	**Lun 14/12/20**	**Lun 04/01/21**
25	1.5.2.8.1	plan EXE électricité RDC	16	10 jrs	Lun 14/12/20	Lun 04/01/21
26	**1.5.3**	**ETUDES EXE CORPS D'ETAT SECONDAIRE**		**15 jrs**	**Lun 30/11/20**	**Ven 18/12/20**
27	1.5.3.1	plan de réservations CES entreprises	2DD	10 jrs	Lun 30/11/20	Ven 11/12/20
28	1.5.3.2	cahier de fiches technique CES	27	5 jrs	Lun 14/12/20	Ven 18/12/20
29	**2**	TRAVAUX TCE " Tous Corps d'état "		**274 jrs**	**Mer 06/01/21**	**Mar 01/02/22**
30	**2.1**	**PREPARATION DE CHANTIER TCE**		**4 jrs**	**Mer 06/01/21**	**Lun 11/01/21**
31	2.1.1	installation de barrière de chantier provisoire et plots	3	1 jr	Mer 06/01/21	Mer 06/01/21
32	2.1.2	voirie de chantier	31	1 jr	Jeu 07/01/21	Jeu 07/01/21
33	2.1.3	installation de chantier + coffrets électrique	32	1 jr	Ven 08/01/21	Ven 08/01/21
34	2.1.4	consignations électrique COUVENT et FERME	33	1 jr	Lun 11/01/21	Lun 11/01/21
35	**2.2**	**TRAVAUX DU COUVENT**		**244 jrs**	**Jeu 07/01/21**	**Mer 22/12/21**
36	**2.2.1**	**DEMOLITIONS INTERIEURES DANS COUVENT**		**19 jrs**	**Mar 12/01/21**	**Ven 05/02/21**
37	2.2.1.1	purges avant travaux dans couvent	30	2 jrs	Mar 12/01/21	Mer 13/01/21
38	2.2.1.2	curages du couvent	37	10 jrs	Jeu 14/01/21	Mer 27/01/21
39	2.2.1.3	démolition du revêtement de sol existant pour remplacement par sol en pierre - repère 2	38	5 jrs	Jeu 28/01/21	Mar 03/02/21
40	2.2.1.4	démolition partielle du dallage du couvent avec terrassements	39	2 jrs	Jeu 04/02/21	Ven 05/02/21
41	**2.2.2**	**GROS OEUVRE DANS COUVENT**		**57 jrs**	**Jeu 28/01/21**	**Lun 19/04/21**
42	2.2.2.1	relèvement de linteau repère 1	38	15 jrs	Jeu 28/01/21	Mer 17/02/21
43	2.2.2.2	suppression de l'escalier et reprise de la trémie - repère 3	40	7 jrs	Lun 08/02/21	Mar 16/02/21
44	2.2.2.3	démolitions d'allèges - repère 5	43	7 jrs	Mer 17/02/21	Jeu 25/02/21
45	2.2.2.4	couche de forme de dallage	44	5 jrs	Ven 26/02/21	Jeu 04/03/21
46	2.2.2.5	canalisations de réseaux d'évacuations	45	10 jrs	Ven 05/03/21	Jeu 18/03/21
47	2.2.2.6	ferraillage dallage	46	4 jrs	Ven 19/03/21	Mer 24/03/21
48	2.2.2.7	dallage du couvent	47	3 jrs	Jeu 25/03/21	Lun 29/03/21
49	2.2.2.8	sechage du dallage du couvent	48	14 jrs	Mar 30/03/21	Lun 19/04/21
50	**2.2.3**	**MENUISERIES EXTERIEURES DU COUVENT**		**65 jrs**	**Ven 26/02/21**	**Mar 01/06/21**
51	2.2.3.1	prise de cotes et fabrication des châssis neufs	44	40 jrs	Ven 26/02/21	Ven 23/04/21
52	2.2.3.2	pose des menuiseries extérieures du couvent	51	20 jrs	Lun 26/04/21	Mar 25/05/21
53	2.2.3.3	préservation des interstices entr emenuiseries et maçonnerie	52	5 jrs	Mer 26/05/21	Mar 01/06/21
54	**2.2.4**	**TRAVAUX DE FACADE DU COUVENT**		**211 jrs**	**Jeu 07/01/21**	**Jeu 04/11/21**
55	2.2.4.1	INRAP : relevé de repérage des façades de tous les bâtiments	31	5 jrs	Jeu 07/01/21	Mer 13/01/21
56	2.2.4.2	pose des échafaudages sur façades du couvent	58DF	15 jrs	Ven 05/02/21	Ven 26/02/21
57	2.2.4.3	NEUTRALISATION DES TRAVAUX DE 10 JOURS POUR INSPECTION ARCHEOLOGIQUE DES FACADES DU	56	10 jrs	Ven 26/02/21	Jeu 11/03/21
58	2.2.4.4	piquage des façades	59DF	45 jrs	Ven 26/02/21	Lun 03/05/21
59	2.2.4.5	NEUTRALISATION DES TRAVAUX DE 10 JOURS POUR INSPECTION ARCHEOLOGIQUE DES FACADES DU	60DF	10 jrs	Lun 03/05/21	Mar 18/05/21
60	2.2.4.6	traitement et reprise des encadrements de baie avec suppression des gonds de volets	62DF	10 jrs	Mar 18/05/21	Mer 02/06/21
61	2.2.4.7	remise en état des corniches bois	60OD	20 jrs	Mar 18/05/21	Mar 15/06/21
62	2.2.4.8	corps d'enduits à la chaux	50	90 jrs	Mer 02/06/21	Mer 06/10/21
63	2.2.4.9	enduits à la chaux - finitions	62OD+10 jrs	90 jrs	Mer 16/06/21	Mer 20/10/21
64	2.2.4.10	évacuation des échafaudages et nettoyage	63	10 jrs	Jeu 21/10/21	Jeu 04/11/21
65	**2.2.5**	**CLOISONNEMENT DU COUVENT**		**52 jrs**	**Mer 02/06/21**	**Ven 13/08/21**
66	2.2.5.1	implantation des cloisonnements	50	2 jrs	Mer 02/06/21	Jeu 03/06/21
67	2.2.5.2	contre cloisons de doublage isolées	66	25 jrs	Ven 04/06/21	Jeu 08/07/21
68	2.2.5.3	cloisons de distributions	67FD-10 jrs	15 jrs	Ven 25/06/21	Ven 16/07/21
69	2.2.5.4	joinoiements et finitions de plâtrerie	67OD+10 jrs	40 jrs	Ven 18/06/21	Ven 13/08/21
70	**2.2.6**	**MENUISERIE INTERIEURE COUVENT**		**40 jrs**	**Ven 02/07/21**	**Ven 27/08/21**
71	2.2.6.1	portes intérieures	68FF	10 jrs	Ven 02/07/21	Ven 16/07/21
72	2.2.6.2	habillages bois	71	20 jrs	Lun 19/07/21	Ven 13/08/21
73	2.2.6.3	mobiliers bois	72	10 jrs	Lun 16/08/21	Ven 27/08/21
74	**2.2.7**	**FAUX PLAFOND DANS COUVENT**		**31 jrs**	**Ven 09/07/21**	**Lun 23/08/21**
75	2.2.7.1	ossature des faux plafond	68FD-5 jrs	15 jrs	Ven 09/07/21	Ven 30/07/21
76	2.2.7.2	réception du "bon à fermer" des 2 lots fluides	75	1 jr	Lun 02/08/21	Lun 02/08/21
77	2.2.7.3	remplissage et femerture des faux plafonds	76	15 jrs	Mar 03/08/21	Lun 23/08/21
78	**2.2.8**	**ELECTRICITE CF / cf DANS COUVENT**		**70 jrs**	**Ven 04/06/21**	**Ven 10/09/21**
79	2.2.8.1	pose des chemins de câbles	66	10 jrs	Ven 04/06/21	Jeu 17/06/21
80	2.2.8.2	passage et tirage des câbles	79	30 jrs	Ven 18/06/21	Ven 30/07/21
81	2.2.8.3	équipement matériels électrique	80	30 jrs	Lun 02/08/21	Ven 10/09/21
82	2.2.8.4	pose des luminaires	77FF	10 jrs	Mar 10/08/21	Lun 23/08/21
83	2.2.8.5	essais et mise en service électrique	82	3 jrs	Mar 24/08/21	Jeu 26/08/21
84	**2.2.9**	**PLOMBERIE SANITAIRE DANS COUVENT**		**111 jrs**	**Ven 04/06/21**	**Mar 09/11/21**
85	2.2.9.1	tracés des réseaux sanitaires	66	5 jrs	Ven 04/06/21	Jeu 10/06/21
86	2.2.9.2	réseaux sanitaire du couvent	85	30 jrs	Ven 11/06/21	Ven 23/07/21
87	2.2.9.3	équipement matériels sanitaire	98	10 jrs	Mar 26/10/21	Mar 09/11/21
88	**2.2.10**	**CHAUFFAGE VENTILATION DANS COUVENT**		**59 jrs**	**Ven 04/06/21**	**Jeu 26/08/21**
89	2.2.10.1	passage des gaines de ventilation	66	40 jrs	Ven 04/06/21	Ven 30/07/21
90	2.2.10.2	pose de CTA double flux	89	5 jrs	Lun 02/08/21	Ven 06/08/21
91	2.2.10.3	calorifuges	90	10 jrs	Lun 09/08/21	Ven 20/08/21
92	2.2.10.4	pose des bouches	77FF	8 jrs	Jeu 12/08/21	Lun 23/08/21
93	2.2.10.5	essais et mise en service	92	3 jrs	Mar 24/08/21	Jeu 26/08/21
94	**2.2.11**	**REVETEMENT DE SOL COUVENT**		**45 jrs**	**Mar 24/08/21**	**Lun 25/10/21**
95	2.2.11.1	pose d'isolant polyuréthane couvent	74	5 jrs	Mar 24/08/21	Lun 30/08/21
96	2.2.11.2	chape sur isolant	95	5 jrs	Mar 31/08/21	Lun 06/09/21
97	2.2.11.3	séchage de chape couvent avec déshumidification	96	15 jrs	Mar 07/09/21	Lun 27/09/21
98	2.2.11.4	pose de revêtement en pierre naturel	97	20 jrs	Mar 28/09/21	Lun 25/10/21
99	**2.2.12**	**PEINTURES FINITIONS COUVENT**		**40 jrs**	**Mar 26/10/21**	**Mer 22/12/21**
100	2.2.12.1	préparation des supports couvent et protection des sols neufs	94	8 jrs	Mar 26/10/21	Ven 05/11/21
101	2.2.12.2	peintures sur plafonds	100FD-5 jrs	20 jrs	Ven 29/10/21	Lun 29/11/21
102	2.2.12.3	peintures sur murs	101FD-5 jrs	20 jrs	Mar 23/11/21	Lun 20/12/21
103	2.2.12.4	nettoyage de finition du couvent	102	2 jrs	Mar 21/12/21	Mer 22/12/21
104	**2.3**	**TRAVAUX DE LA FERME**		**267 jrs**	**Mar 12/01/21**	**Jeu 27/01/22**
105	**2.3.1**	**DESAMIANTAGE DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA FERME**		**26 jrs**	**Mar 12/01/21**	**Mar 16/02/21**
106	2.3.1.1	purge de la ferme avant travaux	5FF	2 jrs	Mar 12/01/21	Mer 13/01/21

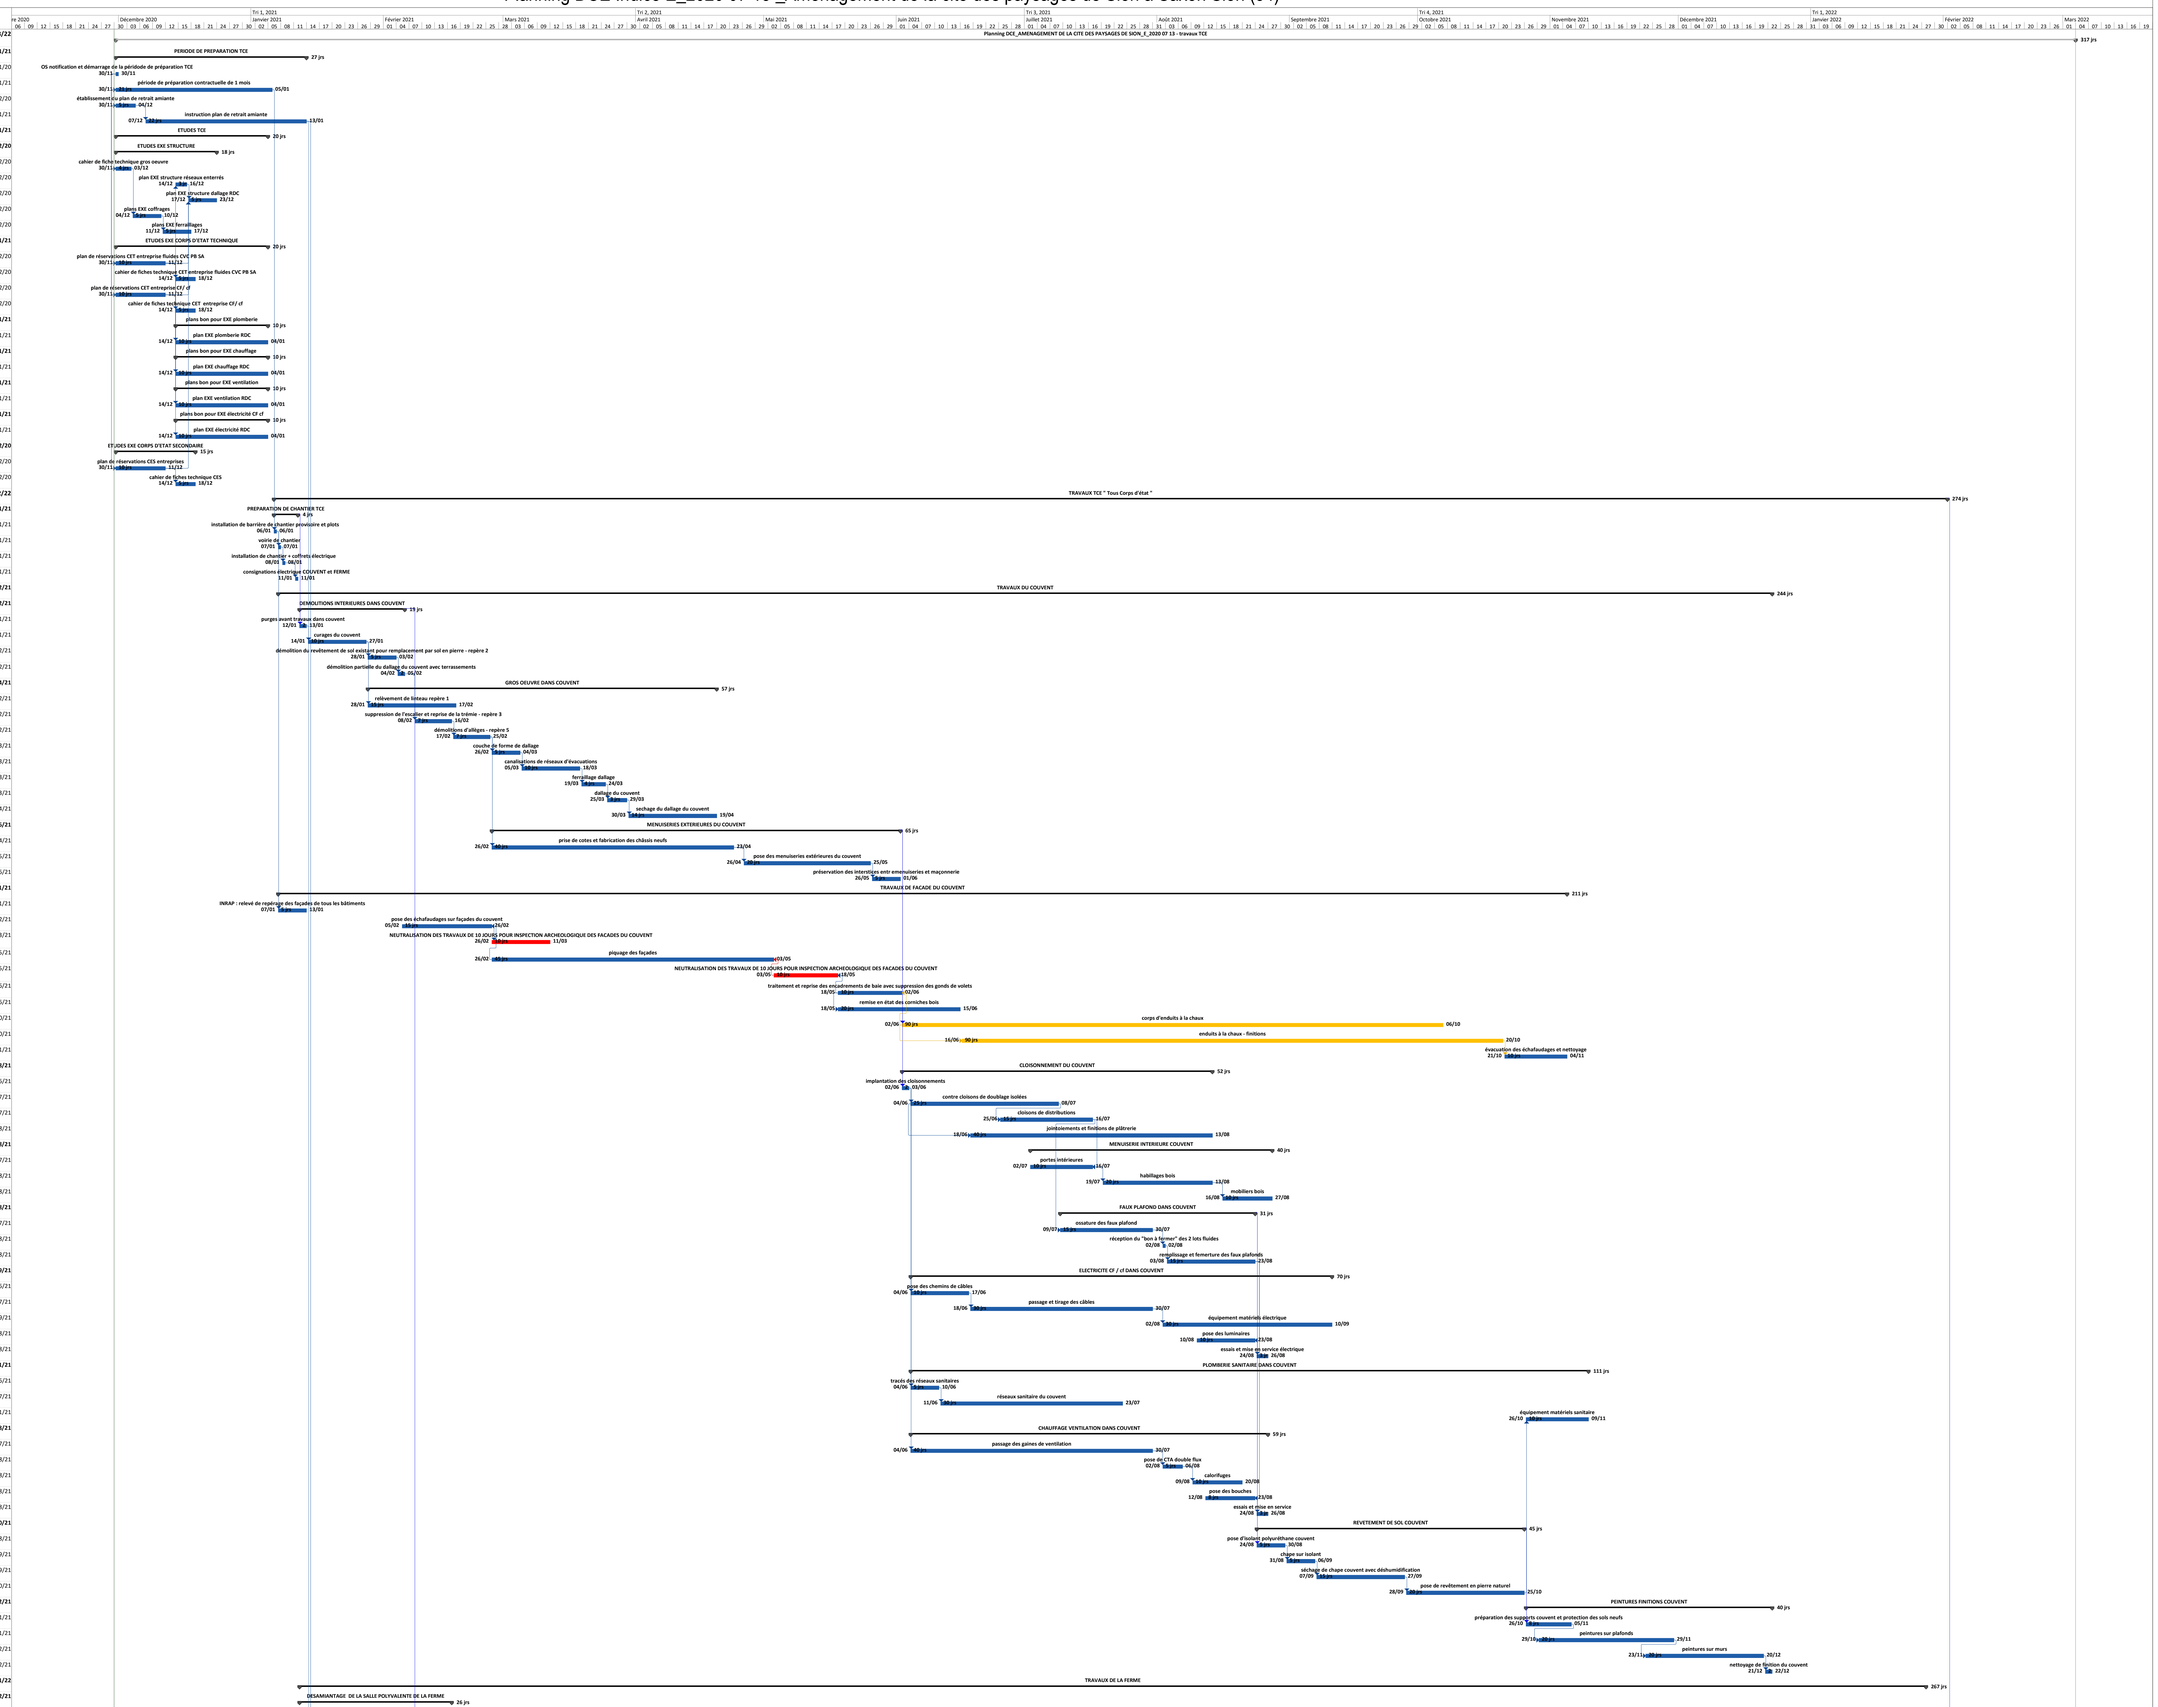

Planning DCE Indice E_2020 07 13 _Aménagement de la cité des paysages de Sion à Saxon Sion (54)
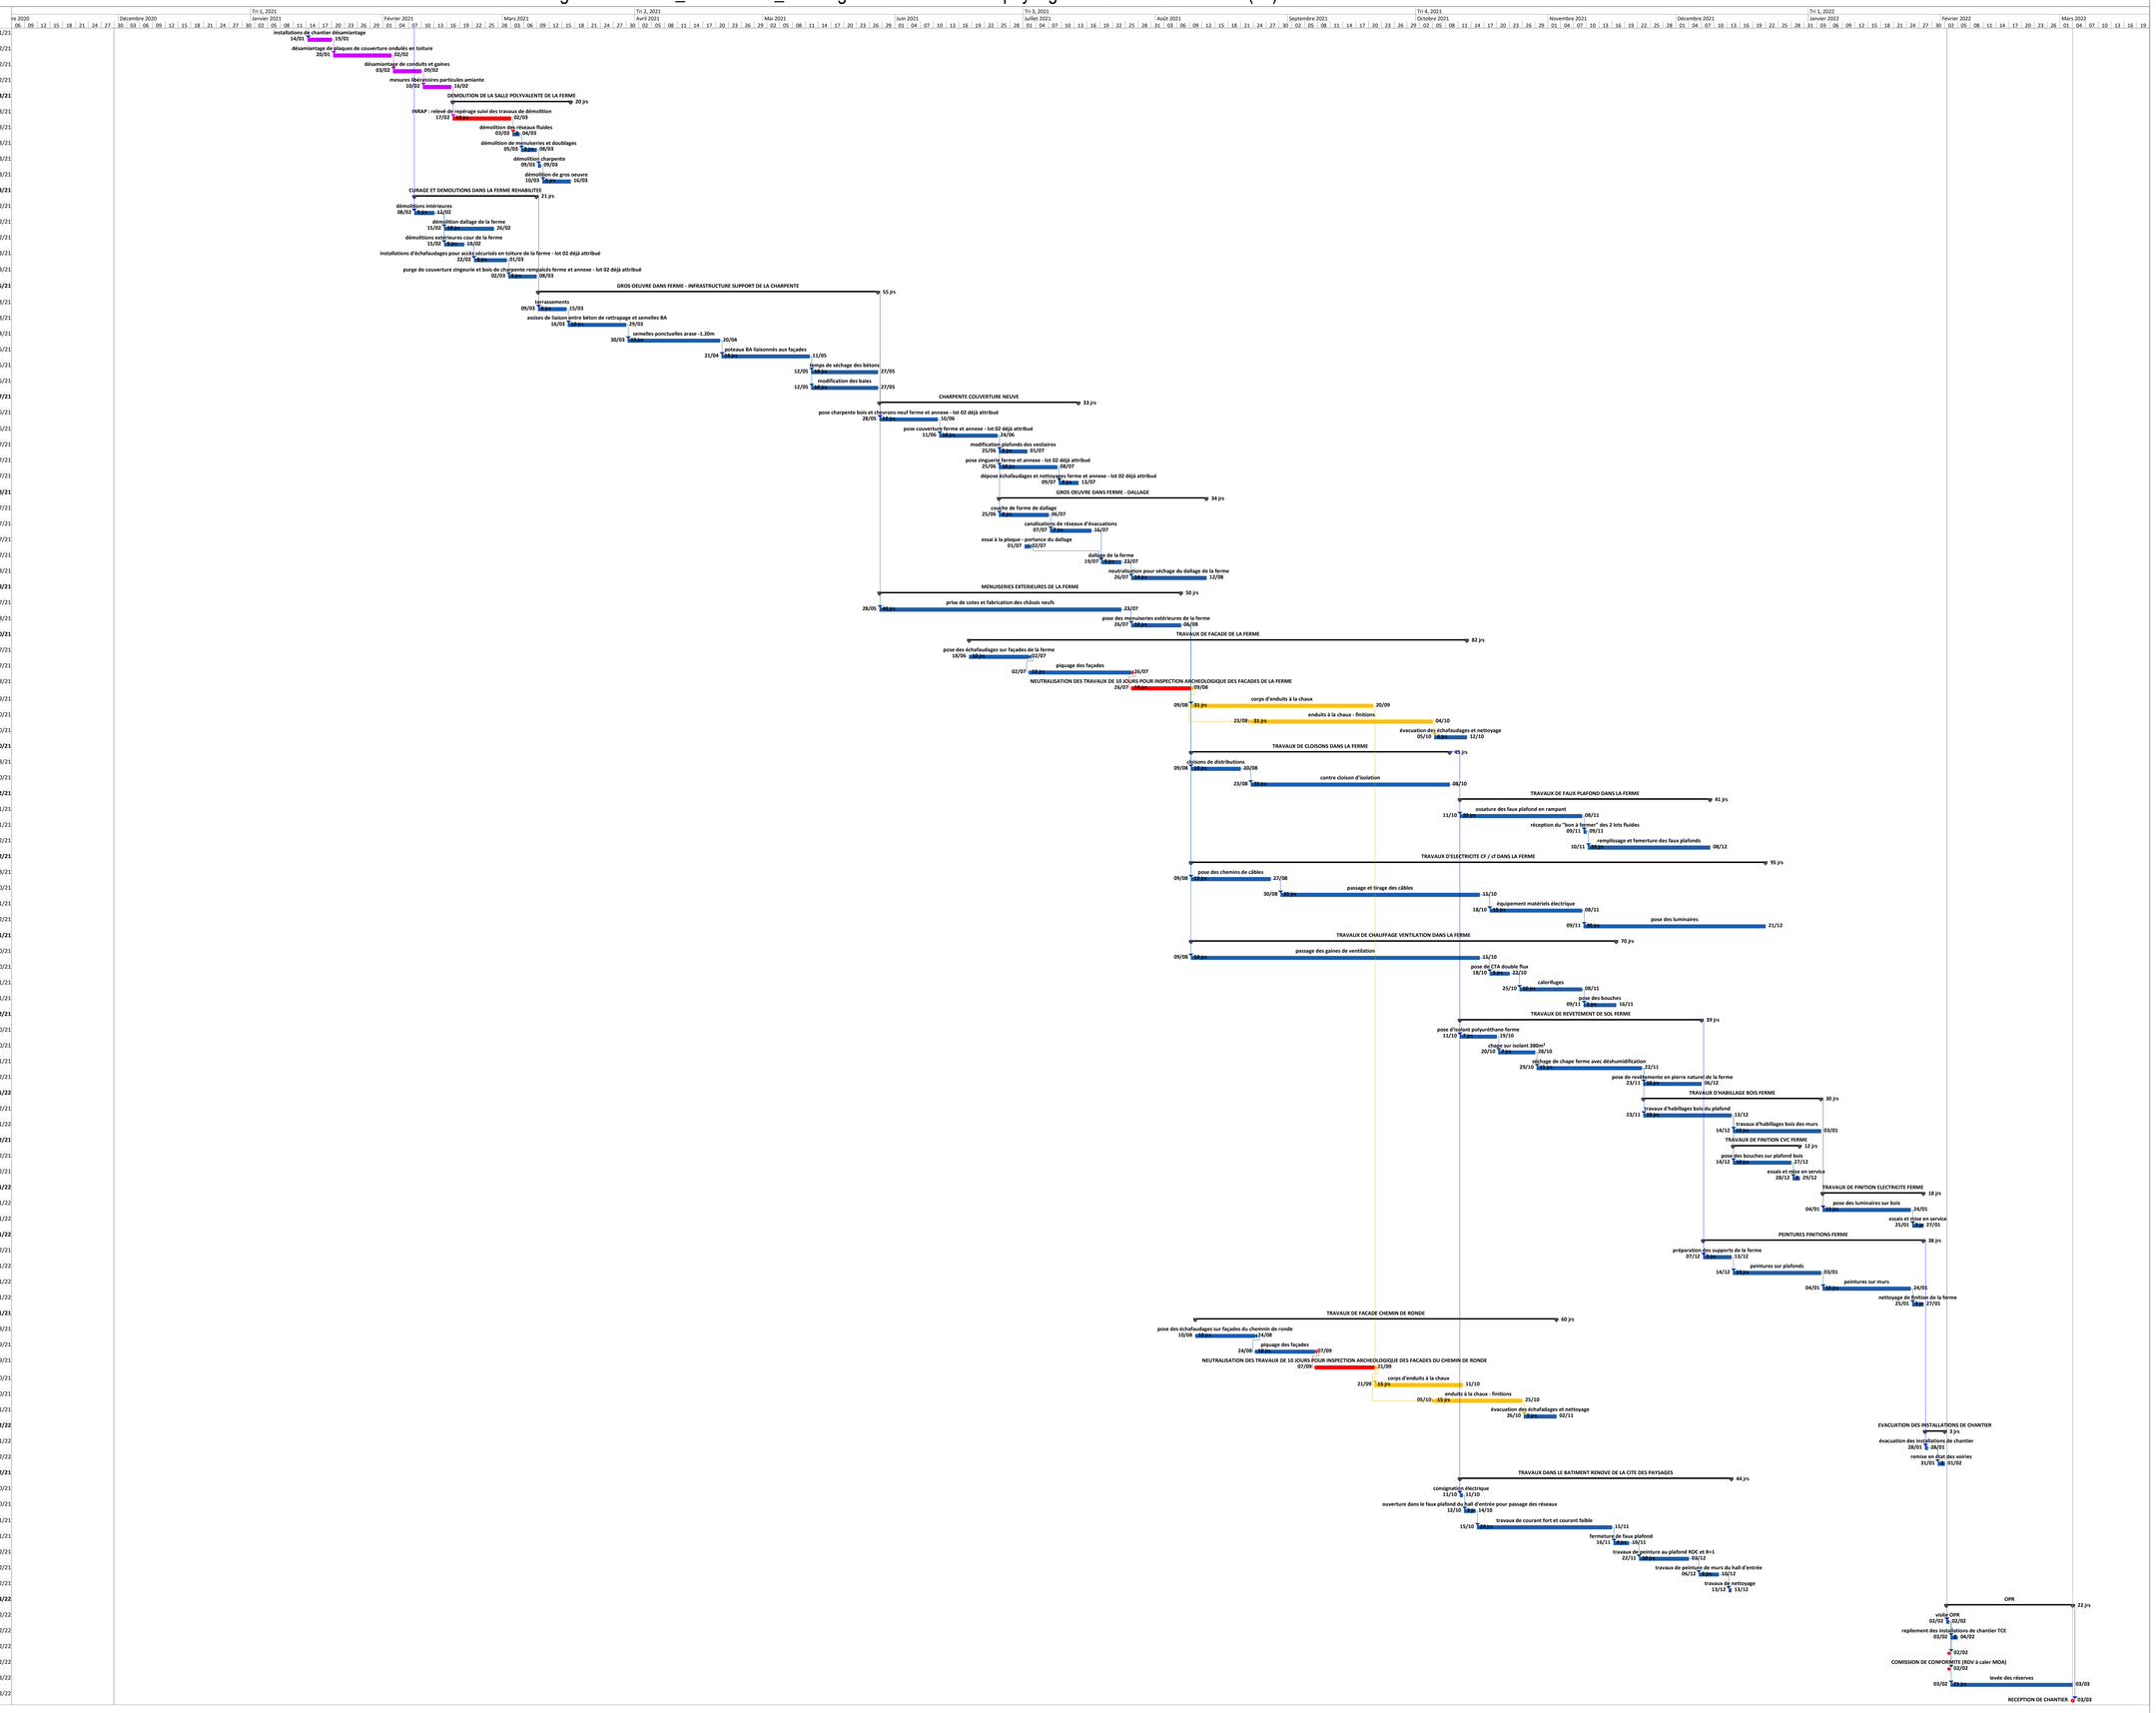
N°	WBS	Nom de la tâche	Prédécesseurs	Durée	Début	Fin
107	2.3.1.2	installations de chantier désamiantage	106;5	4 jrs	Jeu 14/01/21	Mar 19/01/21
108	2.3.1.3	désamiantage de plaques de couverture ondulés en toiture	107	10 jrs	Mer 20/01/21	Mar 02/02/21
109	2.3.1.4	désamiantage de conduits et gaines	108	5 jrs	Mer 03/02/21	Mar 09/02/21
110	2.3.1.5	mesures libératoires particules amiante	109	5 jrs	Mer 10/02/21	Mar 16/02/21
111	**2.3.2**	**DEMOLITION DE LA SALLE POLYVALENTE DE LA FERME**		**20 jrs**	**Mer 17/02/21**	**Mar 16/03/21**
112	2.3.2.1	INRAP : relevé de repérage suivi des travaux de démolition	110	10 jrs	Mer 17/02/21	Mar 02/03/21
113	2.3.2.2	démolition des réseaux fluides	112	2 jrs	Mer 03/03/21	Jeu 04/03/21
114	2.3.2.3	démolition de menuiseries et doublages	113	2 jrs	Ven 05/03/21	Lun 08/03/21
115	2.3.2.4	démolition charpente	114	1 jr	Mar 09/03/21	Mar 09/03/21
116	2.3.2.5	démolition de gros oeuvre	115	5 jrs	Mer 10/03/21	Mar 16/03/21
117	**2.3.3**	**CURAGE ET DEMOLITIONS DANS LA FERME REHABILITEE**		**21 jrs**	**Lun 08/02/21**	**Lun 08/03/21**
118	2.3.3.1	démolitions intérieures	36	5 jrs	Lun 08/02/21	Ven 12/02/21
119	2.3.3.2	démolition dallage de la ferme	118	10 jrs	Lun 15/02/21	Ven 26/02/21
120	2.3.3.3	démolitions extérieures cour de la ferme	118	5 jrs	Lun 15/02/21	Ven 19/02/21
121	2.3.3.4	installations d'échafaudages pour accès sécurisés en toiture de la ferme - lot 02 déjà attribué	120	6 jrs	Lun 22/02/21	Lun 01/03/21
122	2.3.3.5	purge de couverture zingnerie et bois de charpente remplacés ferme et annexe - lot 02 déjà attribué	121	5 jrs	Mar 02/03/21	Lun 08/03/21
123	**2.3.4**	**GROS OEUVRE DANS FERME - INFRASTRUCTURE SUPPORT DE LA CHARPENTE**		**55 jrs**	**Mar 09/03/21**	**Jeu 27/05/21**
124	2.3.4.1	terrassements	117	5 jrs	Mar 09/03/21	Lun 15/03/21
125	2.3.4.2	assises de liaison entre béton de rattrapage et semelles BA	124	10 jrs	Mar 16/03/21	Lun 29/03/21
126	2.3.4.3	semelles ponctuelles arase -1.20m	125	15 jrs	Mar 30/03/21	Mar 20/04/21
127	2.3.4.4	poteaux BA liaisonnés aux façades	126	15 jrs	Mer 21/04/21	Mar 11/05/21
128	2.3.4.5	temps de séchage des bétons	127	10 jrs	Mer 12/05/21	Jeu 27/05/21
129	2.3.4.6	modification des baies	127	10 jrs	Mer 12/05/21	Jeu 27/05/21
130	**2.3.5**	**CHARPENTE COUVERTURE NEUVE**		**33 jrs**	**Ven 28/05/21**	**Mar 13/07/21**
131	2.3.5.1	pose charpente bois et chevrons neuf ferme et annexe - lot 02 déjà attribué	123	10 jrs	Ven 28/05/21	Jeu 10/06/21
132	2.3.5.2	pose couverture ferme et annexe - lot 02 déjà attribué	131	10 jrs	Ven 11/06/21	Jeu 24/06/21
133	2.3.5.3	modification plafonds des vestiaires	132	5 jrs	Ven 25/06/21	Jeu 01/07/21
134	2.3.5.4	pose zingnerie ferme et annexe - lot 02 déjà attribué	132	10 jrs	Ven 25/06/21	Jeu 08/07/21
135	2.3.5.5	dépose échafaudages et nettoyages ferme et annexe - lot 02 déjà attribué	134	3 jrs	Ven 09/07/21	Mar 13/07/21
136	**2.3.6**	**GROS OEUVRE DANS FERME - DALLAGE**		**34 jrs**	**Ven 25/06/21**	**Jeu 12/08/21**
137	2.3.6.1	couche de forme de dallage	132	8 jrs	Ven 25/06/21	Mar 06/07/21
138	2.3.6.2	canalisations de réseaux d'évacuations	137	7 jrs	Mer 07/07/21	Ven 16/07/21
139	2.3.6.3	essai à la plaque - portance du dallage	140DF-10 jrs	1 jr	Jeu 01/07/21	Ven 02/07/21
140	2.3.6.4	dallage de la ferme	138	5 jrs	Lun 19/07/21	Ven 23/07/21
141	2.3.6.5	neutralisation pour séchage du dallage de la ferme	140	14 jrs	Lun 26/07/21	Jeu 12/08/21
142	**2.3.7**	**MENUISERIES EXTERIEURES DE LA FERME**		**50 jrs**	**Ven 28/05/21**	**Ven 06/08/21**
143	2.2.3.1	prise de cotes et fabrication des châssis neufs	129	40 jrs	Ven 28/05/21	Ven 23/07/21
144	2.2.3.2	pose des menuiseries extérieures de la ferme	143	10 jrs	Lun 26/07/21	Ven 06/08/21
145	**2.3.8**	**TRAVAUX DE FACADE DE LA FERME**		**82 jrs**	**Ven 18/06/21**	**Mar 12/10/21**
146	2.3.8.1	pose des échafaudages sur façades de la ferme	147DF	10 jrs	Ven 18/06/21	Ven 02/07/21
147	2.3.8.2	piquage des façades	148DF	15 jrs	Ven 02/07/21	Lun 26/07/21
148	2.3.8.3	NEUTRALISATION DES TRAVAUX DE 10 JOURS POUR INSPECTION ARCHEOLOGIQUE DES FACADES DE LA	149DF	10 jrs	Lun 26/07/21	Lun 09/08/21
149	2.3.8.4	corps d'enduits à la chaux	144	31 jrs	Lun 09/08/21	Lun 20/09/21
150	2.3.8.5	enduits à la chaux - finitions	149DD+10 jrs	31 jrs	Lun 23/08/21	Lun 04/10/21
151	2.3.8.6	évacuation des échafaudages et nettoyage	150	6 jrs	Mar 05/10/21	Mar 12/10/21
152	**2.3.9**	**TRAVAUX DE CLOISONS DANS LA FERME**		**45 jrs**	**Lun 09/08/21**	**Ven 08/10/21**
153	2.3.9.1	cloisons de distributions	144	10 jrs	Lun 09/08/21	Ven 20/08/21
154	2.3.9.2	contre cloison d'isolation	153	35 jrs	Lun 23/08/21	Ven 08/10/21
155	**2.3.10**	**TRAVAUX DE FAUX PLAFOND DANS LA FERME**		**41 jrs**	**Lun 11/10/21**	**Mer 08/12/21**
156	2.3.10.1	ossature des faux plafond en rampant	154	20 jrs	Lun 11/10/21	Lun 08/11/21
157	2.3.10.2	réception du "bon à fermer" des 2 lots fluides	156	1 jr	Mar 09/11/21	Mar 09/11/21
158	2.3.10.3	remplissage et femerture des faux plafonds	157	20 jrs	Mer 10/11/21	Mar 08/12/21
159	**2.3.11**	**TRAVAUX D'ELECTRICITE CF / cf DANS LA FERME**		**95 jrs**	**Lun 09/08/21**	**Mar 21/12/21**
160	2.3.11.1	pose des chemins de câbles	144	15 jrs	Lun 09/08/21	Ven 27/08/21
161	2.3.11.2	passage et tirage des câbles	160	35 jrs	Lun 30/08/21	Ven 15/10/21
162	2.3.11.3	équipement matériels électrique	161	15 jrs	Lun 18/10/21	Lun 08/11/21
163	2.3.11.4	pose des luminaires	162	30 jrs	Mar 09/11/21	Mar 21/12/21
164	**2.3.12**	**TRAVAUX DE CHAUFFAGE VENTILATION DANS LA FERME**		**70 jrs**	**Lun 09/08/21**	**Mar 16/11/21**
165	2.3.12.1	passage des gaines de ventilation	144	50 jrs	Lun 09/08/21	Ven 15/10/21
166	2.3.12.2	pose de CTA double flux	165	5 jrs	Lun 18/10/21	Ven 22/10/21
167	2.3.12.3	calorifuges	166	10 jrs	Lun 25/10/21	Lun 08/11/21
168	2.3.12.4	pose des bouches	167	5 jrs	Mar 09/11/21	Mar 16/11/21
169	**2.3.13**	**TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL FERME**		**39 jrs**	**Lun 11/10/21**	**Lun 06/12/21**
170	2.3.13.1	pose d'isolant polyuréthane ferme	152	7 jrs	Lun 11/10/21	Mar 19/10/21
171	2.3.13.2	chape sur isolant 380m²	170	7 jrs	Mer 20/10/21	Jeu 28/10/21
172	2.3.13.3	séchage de chape ferme avec déshumidification	171	15 jrs	Ven 29/10/21	Lun 22/11/21
173	2.3.13.4	pose de revêtemente en pierre naturel de la ferme	172	10 jrs	Mar 23/11/21	Lun 06/12/21
174	**2.3.14**	**TRAVAUX D'HABILLAGE BOIS FERME**		**30 jrs**	**Mar 23/11/21**	**Lun 03/01/22**
175	2.3.14.1	travaux d'habillages bois du plafond	172	15 jrs	Mar 23/11/21	Lun 13/12/21
176	2.3.14.2	travaux d'habillages bois des murs	175	15 jrs	Mar 14/12/21	Lun 03/01/22
177	**2.3.15**	**TRAVAUX DE FINITION CVC FERME**		**12 jrs**	**Mar 14/12/21**	**Mer 29/12/21**
178	2.3.15.1	pose des bouches sur plafond bois	175	10 jrs	Mar 14/12/21	Lun 27/12/21
179	2.3.15.2	essais et mise en service	178	2 jrs	Mar 28/12/21	Mer 29/12/21
180	**2.3.16**	**TRAVAUX DE FINITION ELECTRICITE FERME**		**18 jrs**	**Mar 04/01/22**	**Jeu 27/01/22**
181	2.3.16.1	pose des luminaires sur bois	174	15 jrs	Mar 04/01/22	Lun 24/01/22
182	2.3.16.2	essais et mise en service	181	3 jrs	Mar 25/01/22	Jeu 27/01/22
183	**2.3.17**	**PEINTURES FINITIONS FERME**		**38 jrs**	**Mar 07/12/21**	**Jeu 27/01/22**
184	2.3.17.1	préparation des supports de la ferme	169	5 jrs	Mar 07/12/21	Lun 13/12/21
185	2.3.17.2	peintures sur plafonds	184	15 jrs	Mar 14/12/21	Lun 03/01/22
186	2.3.17.3	peintures sur murs	185	15 jrs	Mar 04/01/22	Lun 24/01/22
187	2.3.17.4	nettoyage de finition de la ferme	186	3 jrs	Mar 25/01/22	Jeu 27/01/22
188	**2.4**	**TRAVAUX DE FACADE CHEMIN DE RONDE**		**60 jrs**	**Mar 10/08/21**	**Mar 02/11/21**
189	2.4.1	pose des échafaudages sur façades du chemin de ronde	1909DF	10 jrs	Mar 10/08/21	Mar 24/08/21
190	2.4.2	piquage des façades	1910DF	10 jrs	Mar 24/08/21	Mar 07/09/21
191	2.4.3	NEUTRALISATION DES TRAVAUX DE 10 JOURS POUR INSPECTION ARCHEOLOGIQUE DES FACADES DU CHEMIN	1920DF	10 jrs	Mar 07/09/21	Mar 21/09/21
192	2.4.4	corps d'enduits à la chaux	149	15 jrs	Mar 21/09/21	Lun 11/10/21
193	2.4.5	enduits à la chaux - finitions	192DD+10 jrs	15 jrs	Mar 05/10/21	Lun 25/10/21
194	2.4.6	évacuation des échafadages et nettoyage	193	5 jrs	Mar 26/10/21	Mar 02/11/21
195	**2.5**	**EVACUATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER**		**3 jrs**	**Ven 28/01/22**	**Mar 01/02/22**
196	2.5.1	évacuation des installations de chantier	183	1 jr	Ven 28/01/22	Ven 28/01/22
197	2.5.2	remise en état des voiries	196	2 jrs	Lun 31/01/22	Mar 01/02/22
198	**2.6**	**TRAVAUX DANS LE BATIMENT RENOVE DE LA CITE DES PAYSAGES**		**44 jrs**	**Lun 11/10/21**	**Lun 13/12/21**
199	2.6.1	consignation éléctrique	152	1 jr	Lun 11/10/21	Lun 11/10/21
200	2.6.2	ouverture dans le faux plafond du hall d'entrée pour passage des réseaux	199	3 jrs	Mar 12/10/21	Jeu 14/10/21
201	2.6.3	travaux de courant fort et courant faible	200	20 jrs	Ven 15/10/21	Lun 15/11/21
202	2.6.4	fermeture de faux plafond	201	4 jrs	Mar 16/11/21	Ven 19/11/21
203	2.6.5	travaux de peinture au plafond RDC et R+1	202	10 jrs	Lun 22/11/21	Ven 03/12/21
204	2.6.6	travaux de peinture de murs du hall d'entrée	203	5 jrs	Lun 06/12/21	Ven 10/12/21
205	2.6.7	travaux de nettoyage	204	1 jr	Lun 13/12/21	Lun 13/12/21
206	**3**	**OPR**		**22 jrs**	**Mer 02/02/22**	**Jeu 03/03/22**
207	3.1	visite OPR	29	1 jr	Mer 02/02/22	Mer 02/02/22
208	3.2	replement des installations de chantier TCE	207	2 jrs	Jeu 03/02/22	Ven 04/02/22
209	3.3	**COMMISSION DE SECURITE (RDV à caler MOA)**	207	0 jr	Mer 02/02/22	Mer 02/02/22
210	3.4	**COMMISSION DE CONFORMITE (RDV à caler MOA)**	207	0 jr	Mer 02/02/22	Mer 02/02/22
211	3.5	levée des réserves	207	21 jrs	Jeu 03/02/22	Jeu 03/03/22
212	**4**	RECEPTION DE CHANTIER	206	0 jr	Jeu 03/03/22	Jeu 03/03/22
