PREVOT INGENIERIE

Reconstruction du marché couvert de St Dizier (52)
Planning Exécution des Travaux (hors intempéries) - LOTS 2 & 3 uniquement

Phase Préparation de chantier
indice A du 11/12/2019
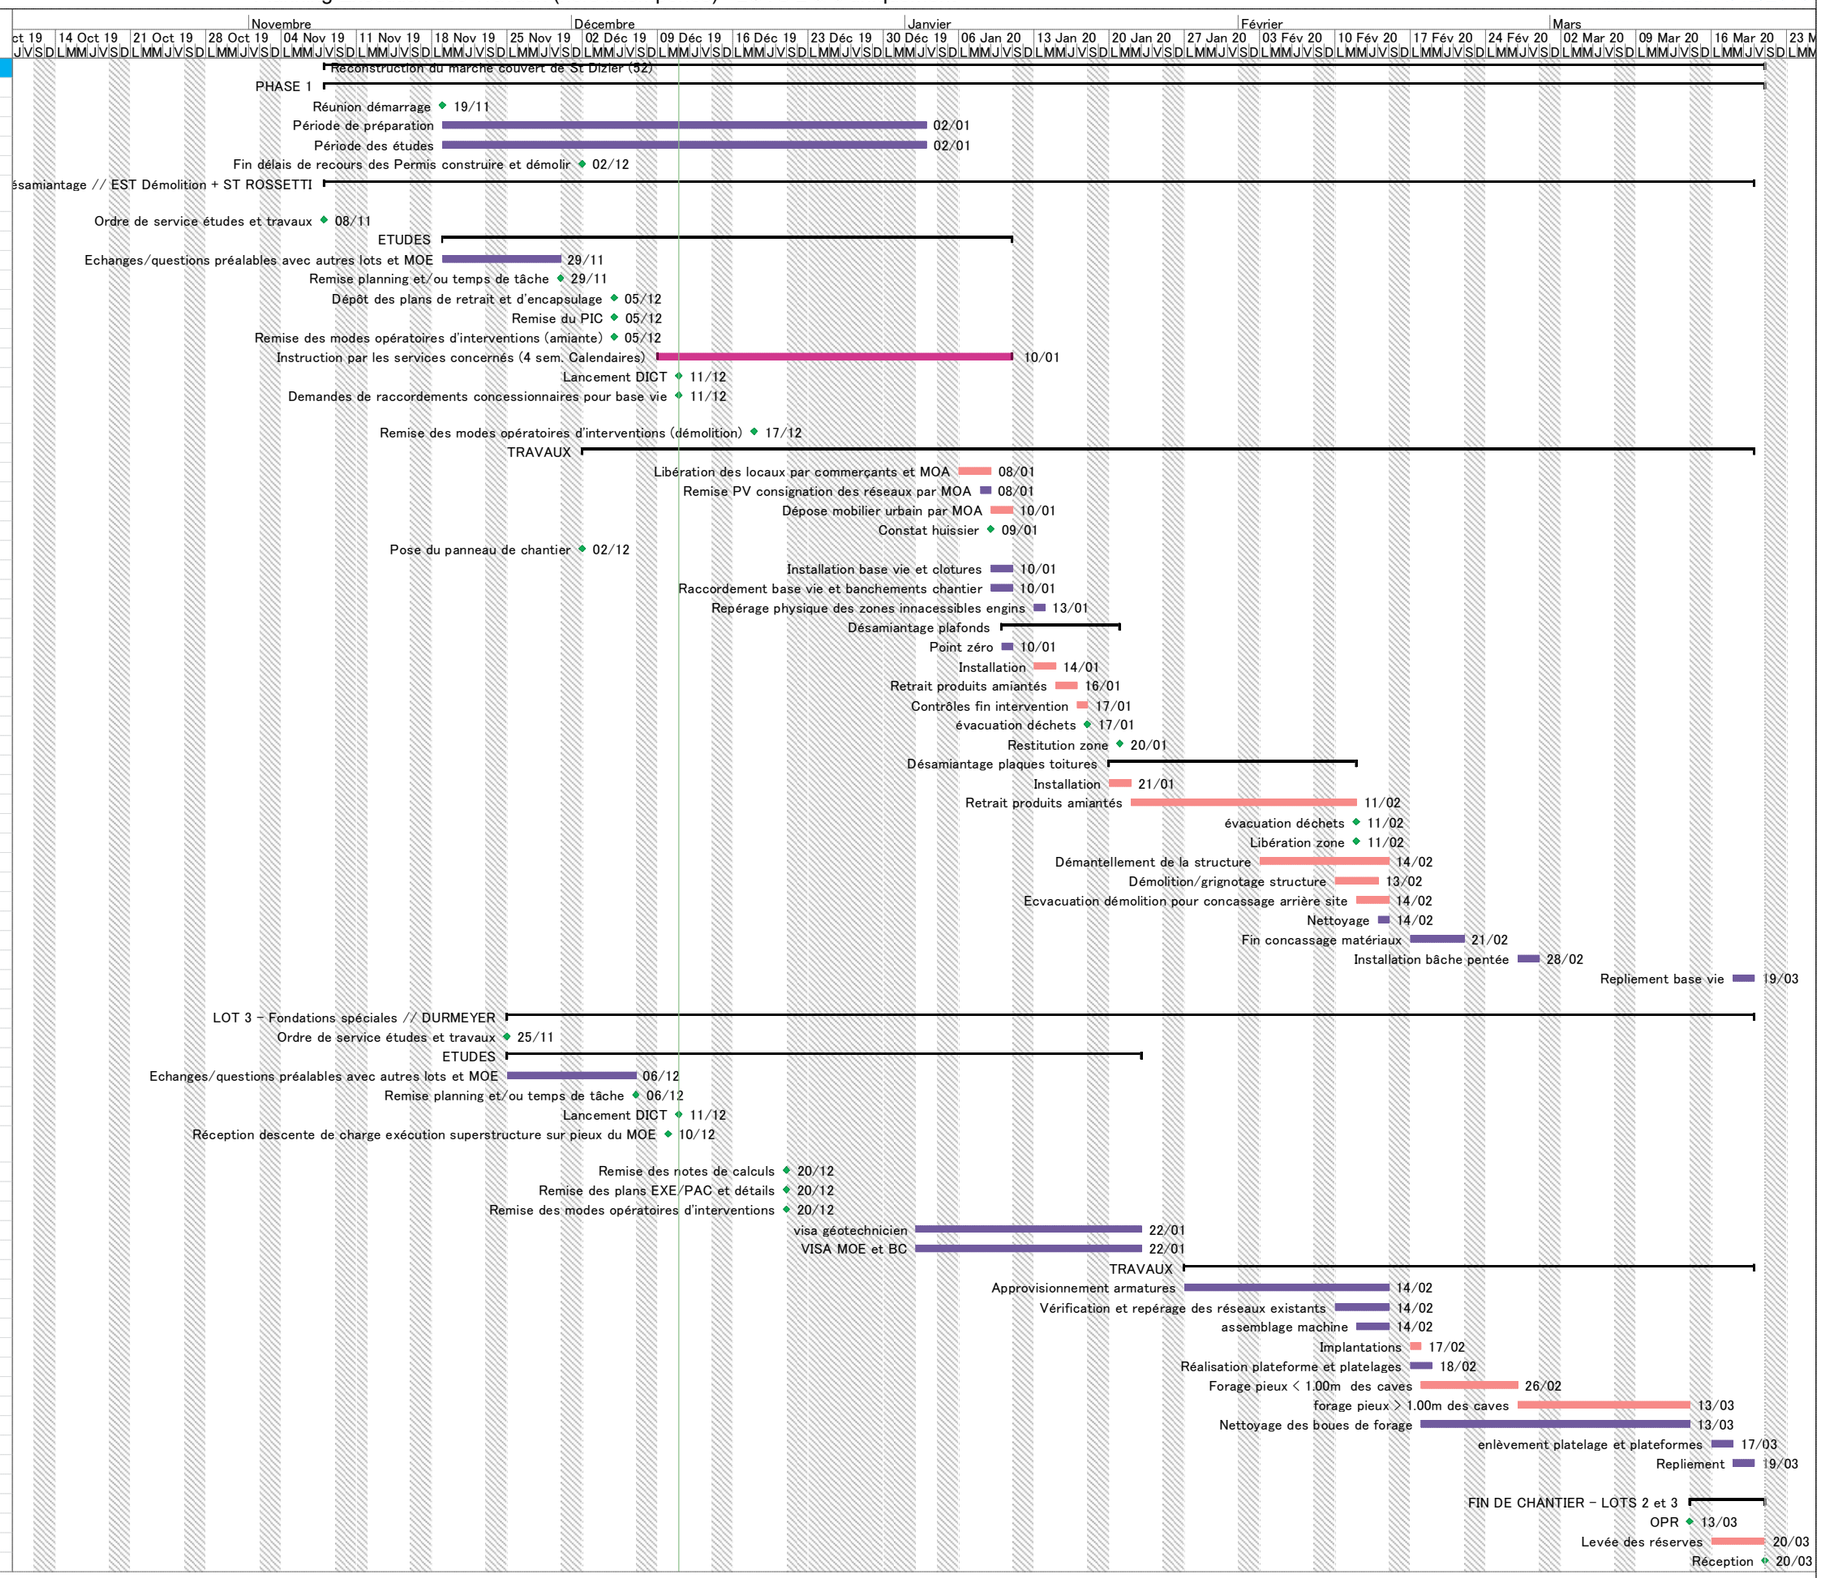
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Reconstruction du marché couvert de St Dizier (52)**	**87 jrs**	**Ven 08/11/19**	**Ven 20/03/20**
2	**PHASE 1**	**87 jrs**	**Ven 08/11/19**	**Ven 20/03/20**
3	Réunion démarrage	0 jr	Mar 19/11/19	Mar 19/11/19
4	Période de préparation	5 sem.	Mar 19/11/19	Jeu 02/01/20
5	Période des études	5 sem.	Mar 19/11/19	Jeu 02/01/20
6	Fin délais de recours des Permis construire et démolir	0 jr	Lun 02/12/19	Lun 02/12/19
7	**LOT 2 - Démolition - désamiantage // EST Démolition + ST ROSSETTI**	**86 jrs**	**Ven 08/11/19**	**Jeu 19/03/20**
8	Ordre de service études et travaux	0 jr	Ven 08/11/19	Ven 08/11/19
9	***ETUDES***	***31 jrs***	***Mar 19/11/19***	***Ven 10/01/20***
10	Echanges/questions préalables avec autres lots et MOE	9 jrs	Mar 19/11/19	Ven 29/11/19
11	Remise planning et/ou temps de tâche	0 jr	Ven 29/11/19	Ven 29/11/19
12	Dépôt des plans de retrait et d'encapsulage	0 jr	Jeu 05/12/19	Jeu 05/12/19
13	Remise du PIC	0 jr	Jeu 05/12/19	Jeu 05/12/19
14	Remise des modes opératoires d'interventions (amiante	0 jr	Jeu 05/12/19	Jeu 05/12/19
15	Instruction par les services concernés (4 sem. Calendair	3,45 sem.	Lun 09/12/19	Ven 10/01/20
16	Lancement DICT	0 jr	Mer 11/12/19	Mer 11/12/19
17	Demandes de raccordements concessionnaires pour base vie	0 jr	Mer 11/12/19	Mer 11/12/19
18	Remise des modes opératoires d'interventions (démolit	0 jr	Mar 17/12/19	Mar 17/12/19
19	***TRAVAUX***	***71 jrs***	***Lun 02/12/19***	***Jeu 19/03/20***
20	*Libération des locaux par commerçants et MOA*	*3 jrs*	*Lun 06/01/20*	*Mer 08/01/20*
21	*Remise PV consignation des réseaux par MOA*	*1 jr*	*Mer 08/01/20*	*Mer 08/01/20*
22	*Dépose mobilier urbain par MOA*	*2 jrs*	*Jeu 09/01/20*	*Ven 10/01/20*
23	Constat huissier	0 jr	Jeu 09/01/20	Jeu 09/01/20
24	Pose du panneau de chantier	0 jr	Lun 02/12/19	Lun 02/12/19
25	Installation base vie et clotures	2 jrs	Jeu 09/01/20	Ven 10/01/20
26	Raccordement base vie et banchements chantier	2 jrs	Jeu 09/01/20	Ven 10/01/20
27	Repérage physique des zones innacessibles engins	1 jr	Lun 13/01/20	Lun 13/01/20
28	Désamiantage plafonds	7 jrs	Ven 10/01/20	Lun 20/01/20
29	*Point zéro*	*1 jr*	*Ven 10/01/20*	*Ven 10/01/20*
30	*Installation*	*2 jrs*	*Lun 13/01/20*	*Mar 14/01/20*
31	*Retrait produits amiantés*	*2 jrs*	*Mer 15/01/20*	*Jeu 16/01/20*
32	*Contrôles fin intervention*	*1 jr*	*Ven 17/01/20*	*Ven 17/01/20*
33	*évacuation déchets*	*0 jr*	*Ven 17/01/20*	*Ven 17/01/20*
34	*Restitution zone*	*0 jr*	*Lun 20/01/20*	*Lun 20/01/20*
35	Désamiantage plaques toitures	17 jrs	Lun 20/01/20	Mar 11/02/20
36	*Installation*	*2 jrs*	*Lun 20/01/20*	*Mar 21/01/20*
37	*Retrait produits amiantés*	*15 jrs*	*Mer 22/01/20*	*Mar 11/02/20*
38	*évacuation déchets*	*0 jr*	*Mar 11/02/20*	*Mar 11/02/20*
39	*Libération zone*	*0 jr*	*Mar 11/02/20*	*Mar 11/02/20*
40	Démantellement de la structure	10 jrs	Lun 03/02/20	Ven 14/02/20
41	Démolition/grignotage structure	4 jrs	Lun 10/02/20	Jeu 13/02/20
42	Ecvacuation démolition pour concassage arrière site	3 jrs	Mer 12/02/20	Ven 14/02/20
43	Nettoyage	1 jr	Ven 14/02/20	Ven 14/02/20
44	Fin concassage matériaux	5 jrs	Lun 17/02/20	Ven 21/02/20
45	Installation bâche pentée	2 jrs	Jeu 27/02/20	Ven 28/02/20
46	Repliement base vie	2 jrs	Mer 18/03/20	Jeu 19/03/20
47				
48	**LOT 3 - Fondations spéciales // DURMEYER**	**76 jrs**	**Lun 25/11/19**	**Jeu 19/03/20**
49	Ordre de service études et travaux	0 jr	Lun 25/11/19	Lun 25/11/19
50	***ETUDES***	***35 jrs***	***Lun 25/11/19***	***Mer 22/01/20***
51	Echanges/questions préalables avec autres lots et MOE	10 jrs	Lun 25/11/19	Ven 06/12/19
52	Remise planning et/ou temps de tâche	0 jr	Ven 06/12/19	Ven 06/12/19
53	Lancement DICT	0 jr	Mer 11/12/19	Mer 11/12/19
54	*Réception descente de charge exécution superstructure sur pieux du MOE*	*0 jr*	*Mar 10/12/19*	*Mar 10/12/19*
55	Remise des notes de calculs	0 jr	Ven 20/12/19	Ven 20/12/19
56	Remise des plans EXE/PAC et détails	0 jr	Ven 20/12/19	Ven 20/12/19
57	Remise des modes opératoires d'interventions	0 jr	Ven 20/12/19	Ven 20/12/19
58	*visa géotechnicien*	*15 jrs*	*Jeu 02/01/20*	*Mer 22/01/20*
59	*VISA MOE et BC*	*15 jrs*	*Jeu 02/01/20*	*Mer 22/01/20*
60	***TRAVAUX***	***39 jrs***	***Lun 27/01/20***	***Jeu 19/03/20***
61	Approvisionnement armatures	3 sem.	Lun 27/01/20	Ven 14/02/20
62	Vérification et repérage des réseaux existants	1 sem.	Lun 10/02/20	Ven 14/02/20
63	assemblage machine	3 jrs	Mer 12/02/20	Ven 14/02/20
64	Implantations	1 jr	Lun 17/02/20	Lun 17/02/20
65	Réalisation plateforme et platelages	2 jrs	Lun 17/02/20	Mar 18/02/20
66	Forage pieux < 1.00m des caves	7 jrs	Mar 18/02/20	Mer 26/02/20
67	forage pieux > 1.00m des caves	12 jrs	Jeu 27/02/20	Ven 13/03/20
68	Nettoyage des boues de forage	19 jrs	Mar 18/02/20	Ven 13/03/20
69	enlèvement platelage et plateformes	2 jrs	Lun 16/03/20	Mar 17/03/20
70	Repliement	2 jrs	Mer 18/03/20	Jeu 19/03/20
71				
72	***FIN DE CHANTIER - LOTS 2 et 3***	***5 jrs***	***Ven 13/03/20***	***Ven 20/03/20***
73	OPR	0 jr	Ven 13/03/20	Ven 13/03/20
74	Levée des réserves	5 jrs	Lun 16/03/20	Ven 20/03/20
75	Réception	0 jr	Ven 20/03/20	Ven 20/03/20
