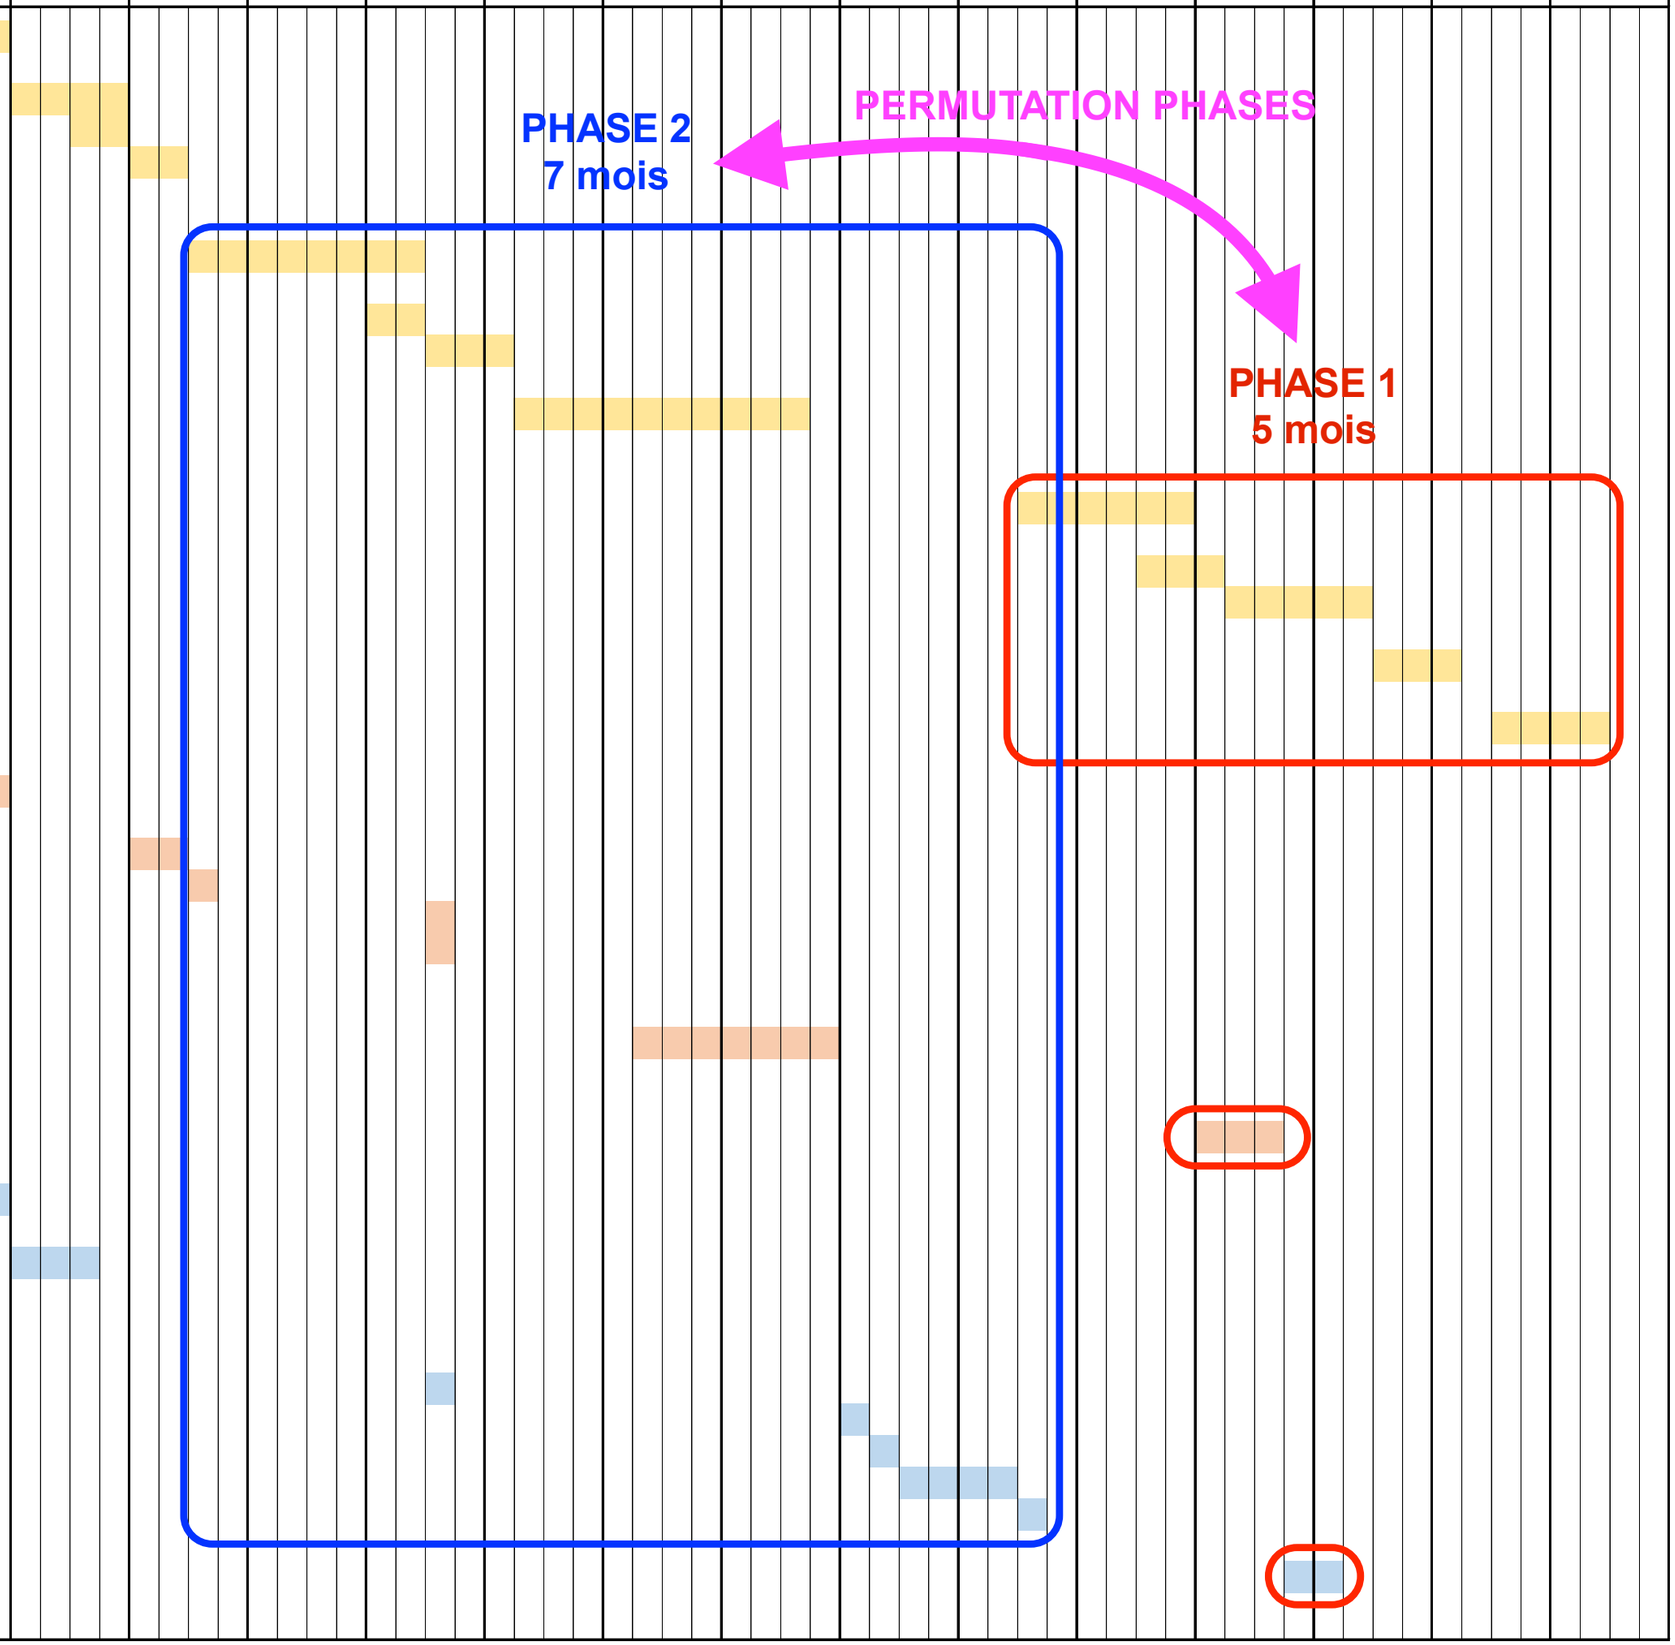Désignations des ouvrages	MOIS 0	MOIS 1	MOIS 2	MOIS 3	MOIS 4	MOIS 5	MOIS 6	MOIS 7	MOIS 8	MOIS 9	MOIS 10	MOIS 11	MOIS 12	MOIS 13
Lot 1 MPT														
Travaux préparatoires														
- Etudes préalable (relevé etc…)														
- Instrumentations														
- Installations commune de chantier														
Transept / Chevet														
- Echafaudages et protections														
- Etaiement et cintrage d'arc														
* préfa atelier														
* pose sur site														
- Travaux de maçonnerie / pierre														
Nef / Collatéral Nord														
- Echafaudages et protections														
- Etaiement et cintrage d'arc														
* préfa atelier														
* pose sur site														
- Travaux de maçonnerie / pierre														
Replis des insatallations														
Lot 2 Charpente														
Travaux préparatoires														
- relevé préalable et bilan sanitaire														
- commande des bois														
- prise de possession du chantier, relevé complémentaire, nettoyage des combles														
Transept / Chevet														
- reprise de charpente à neuf ou en conservation														
Nef / Collatéral Nord														
- reprise de charpente à neuf ou en conservation														
Lot 3 Couverture														
Travaux préparatoires														
- présentation d'échantillons														
- commande des tuiles														
Transept / Chevet														
- découverture et dépose zinguerie														
- support de couverture														
- mise en œuvre des bas de pente														
- mise en œuvre de la couverture et des accessoires														
- descente EP														
Nef / Collatéral Nord														
- révision de la couverture
