Planning d'études et travaux restructuration du collège NOMENY - phase DCE

N°		Mode Tâche	IN	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Successeurs
1				**planning des études**	**428 jours**	**Lun 06/01/25**	**Mer 26/08/26**		
2			M	OS démarrage APD	0 jour	Lun 06/01/25	Lun 06/01/25		3
3			M	APD	40 jours	Lun 06/01/25	Ven 28/02/25	2	5
4				Réunion de présentation APD	1 jour	Jeu 13/03/25	Jeu 13/03/25		
5			M	Validation APD	41 jours	Lun 03/03/25	Lun 28/04/25	3	6;8
6			M	Dépôt Permis de construire	31 jours	Mar 29/04/25	Mar 10/06/25	5	7
7				Délais d'instruction PC + recours des tiers	120 jours	Mer 11/06/25	Mar 25/11/25	6	
8			M	PRO	40 jours	Mar 29/04/25	Lun 23/06/25	5	9
9			M	Validation PRO	45 jours	Mar 24/06/25	Lun 25/08/25	8	10
10			M	Report rendu DCE avec intégration écologues	15 jours	Mar 17/02/26	Lun 09/03/26	9	11
11			M	Validation DCE	20 jours	Mar 10/03/26	Lun 06/04/26	10	12
12				Lancement AO	23 jours	Mar 07/04/26	Jeu 07/05/26	11	13
13			EN	Consultation entreprises	24 jours	Ven 08/05/26	Mer 10/06/26	12	14
14			EN	remise des offres	0 jour	Mer 10/06/26	Mer 10/06/26	13	15
15			M	ACT	15 jours	Jeu 11/06/26	Mer 01/07/26	14	16
16			M	Annalyse ACT + passage commission	15 jours	Jeu 02/07/26	Mer 22/07/26	15	17
17			M	Délais de rejet et de notifications	24 jours	Jeu 23/07/26	Mar 25/08/26	16	18
18			M	Attributions des marchés	1 jour	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26	17	20
19				**Planning travaux**	**539 jours**	**Jeu 27/08/26**	**Jeu 12/10/28**		
20				Periode de préparation	47 jours	Jeu 27/08/26	Ven 30/10/26	18	24;76;26;114;23F
21				**travaux externat**	**316 jours**	**Lun 05/10/26**	**Mer 12/01/28**		
22				**Travaux extensions**	**155 jours**	**Lun 05/10/26**	**Mer 19/05/27**		
23				Pose système anti-retour Chiroptères zone extention	20 jours	Lun 05/10/26	Ven 30/10/26	20FF	
24				**Clos couverts**	**70 jours**	**Lun 02/11/26**	**Mer 17/02/27**	**20**	
25			**03**	**GO**	**42 jours**	**Lun 02/11/26**	**Ven 08/01/27**		
26			03	Dépose bardage façade sud	2 jours	Lun 02/11/26	Mar 03/11/26	20	27
27			03	Fondations	6 jours	Mer 04/11/26	Jeu 12/11/26	26	28
28			03	RDC	10 jours	Ven 13/11/26	Jeu 26/11/26	27	29
29			03	1er - yc création des ouvertures vers existant	10 jours	Ven 27/11/26	Jeu 10/12/26	28	30
30			03	2ème - yc création des ouvertures vers existant	10 jours	Ven 11/12/26	Lun 04/01/27	29	32FD+15 jours;31
31				Relevès béton en toiture	4 jours	Mar 05/01/27	Ven 08/01/27	30	
32			05	Etanchéité	7 jours	Mar 26/01/27	Mer 03/02/27	30FD+15 jours	33
33			08	Pose des menuiseries	10 jours	Jeu 04/02/27	Mer 17/02/27	32	36
34				**Finitions**	**50 jours**	**Jeu 18/02/27**	**Mer 28/04/27**		**53**
35				**R+2**	**13 jours**	**Jeu 18/02/27**	**Lun 08/03/27**		**42**

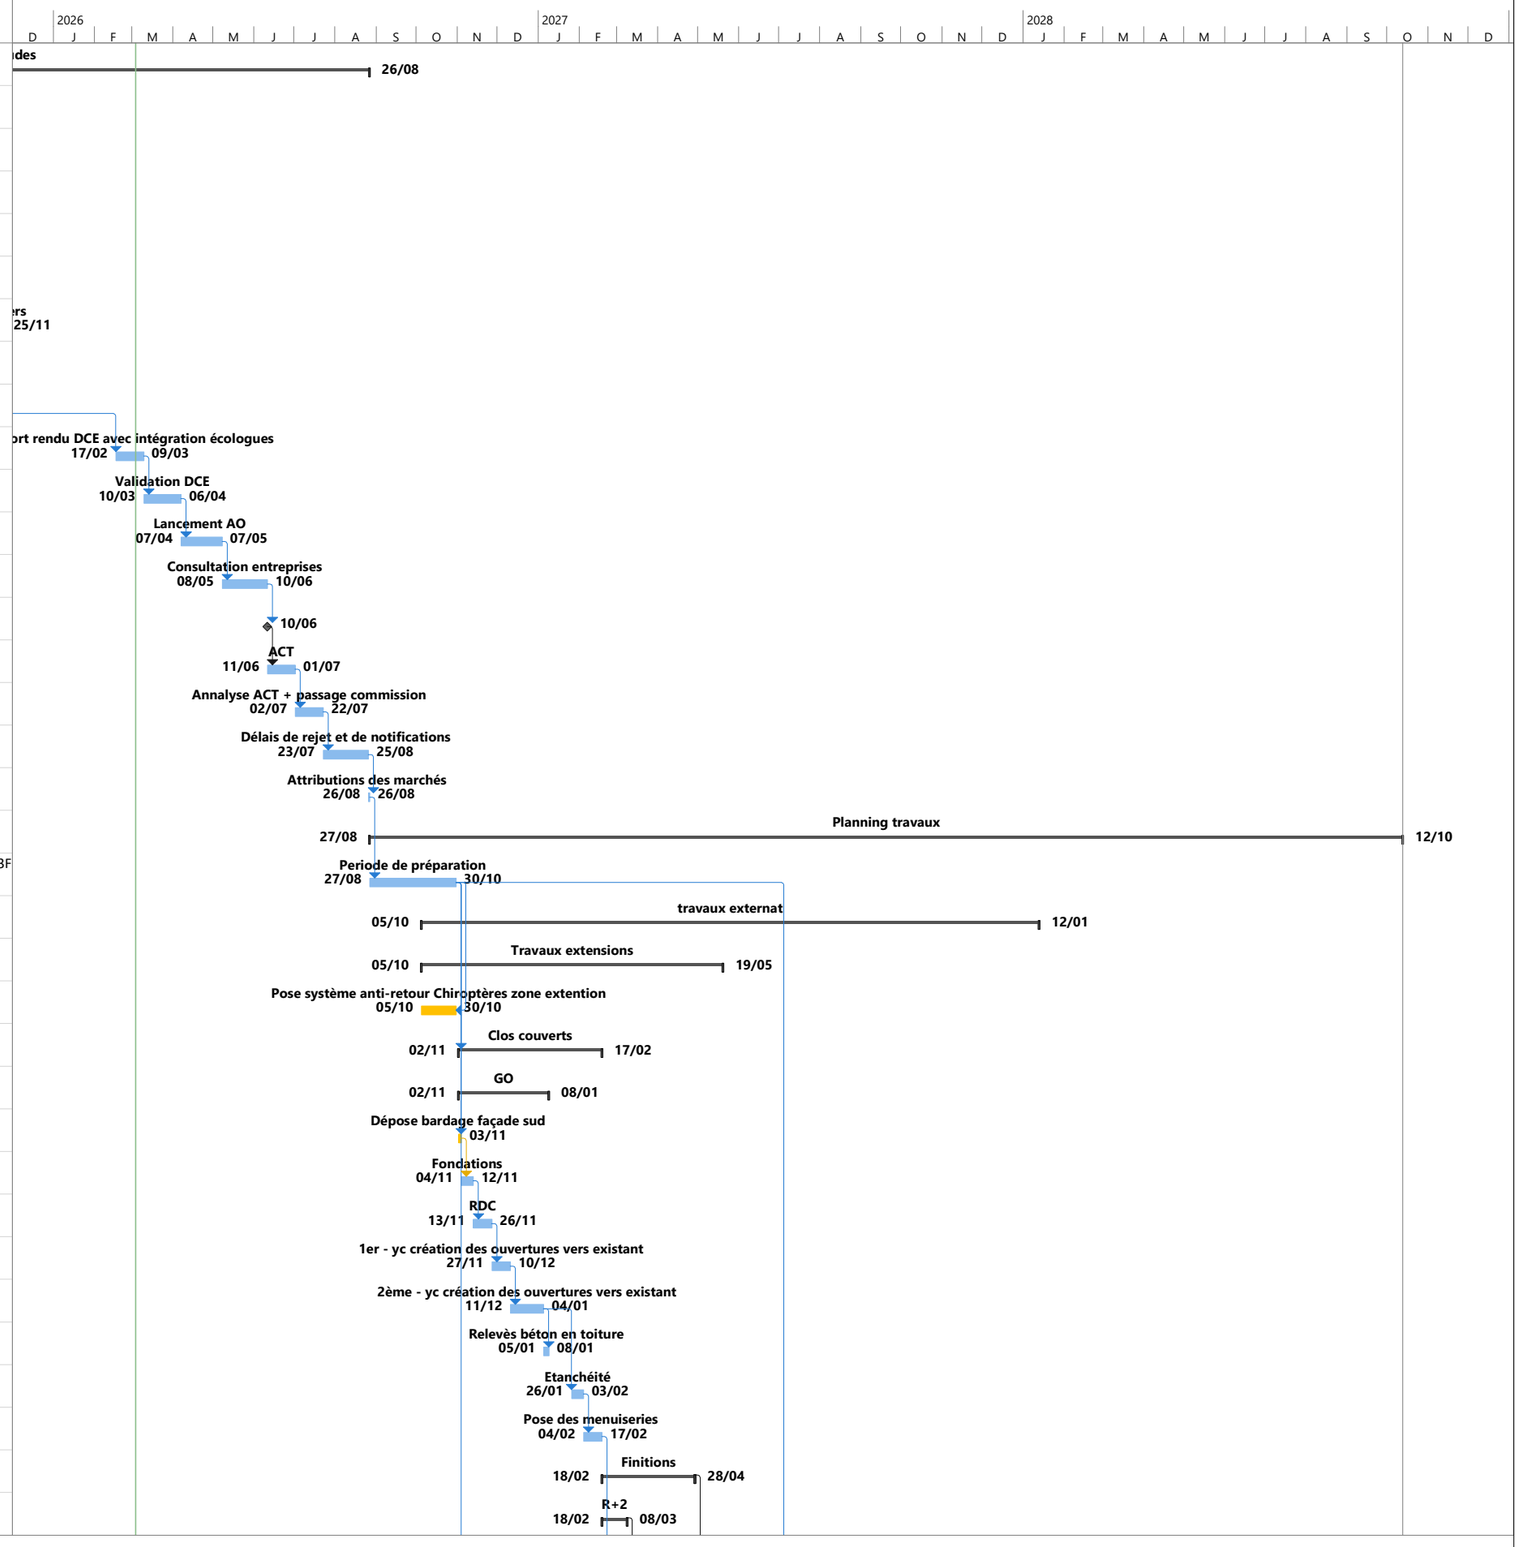

N°		Mode Tâche	IN	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Successeurs
36			12	doublage cloison	5 jours	Jeu 18/02/27	Mer 24/02/27	33	37;40DD
37			13	Peinture	4 jours	Jeu 25/02/27	Mar 02/03/27	36	38
38			14	Sol	2 jours	Mer 03/03/27	Jeu 04/03/27	37	39
39			16	men int	2 jours	Ven 05/03/27	Lun 08/03/27	38	
40			TE	Lots techniques	10 jours	Jeu 18/02/27	Mer 03/03/27	36DD	
41				**R+1**	**13 jours**	**Mar 09/03/27**	**Jeu 25/03/27**		**47**
42			12	doublage cloison	5 jours	Mar 09/03/27	Lun 15/03/27	35	43;48;46DD
43			13	Peinture	4 jours	Mar 16/03/27	Ven 19/03/27	42	44
44			14	Sol	2 jours	Lun 22/03/27	Mar 23/03/27	43	45
45			16	men int	2 jours	Mer 24/03/27	Jeu 25/03/27	44	
46			TE	Lots techniques	10 jours	Mar 09/03/27	Lun 22/03/27	42DD	
47				**RDC**	**24 jours**	**Ven 26/03/27**	**Mer 28/04/27**	**41**	
48			12	doublage cloison	5 jours	Ven 26/03/27	Jeu 01/04/27	42	49
49			13	Peinture	4 jours	Ven 02/04/27	Mer 07/04/27	48	50
50			14	Sol + faïences	5 jours	Jeu 08/04/27	Mer 14/04/27	49	51
51			16	men int	2 jours	Jeu 15/04/27	Ven 16/04/27	50	52
52			TE	Lots technique	8 jours	Lun 19/04/27	Mer 28/04/27	51	
53				OPR - essaies mise en services - reception- nettoygage	15 jours	Jeu 29/04/27	Mer 19/05/27	34	127FD-10 jours;89;58DD
54				**Remplacements des menuiseries - façades**	**129 jours**	**Lun 05/04/27**	**Ven 01/10/27**		
55				Pose système anti-retour Chiroptères zone externat	20 jours	Lun 05/04/27	Ven 30/04/27		
56				Menuiseries R1 et R2	30 jours	Ven 09/07/27	Ven 20/08/27	63FD-30 jours	57DD
57				Lot façade externa	60 jours	Ven 09/07/27	Ven 01/10/27	56DD	124
58				**Réseaux en VS**	30 jours	Jeu 29/04/27	Mer 09/06/27	53DD	
59				**Travaux RDC**	**130 jours**	**Ven 02/07/27**	**Mer 12/01/28**		
60				déménagement RDC externat en installation provisoire	5 jours	Ven 02/07/27	Ven 09/07/27	62DF-5 jours	61;136DF
61				Consignation et dévoiement réseaux	5 jours	Ven 09/07/27	Ven 16/07/27	60	
62				Désamiantage	10 jours	Lun 19/07/27	Ven 30/07/27		63;60DF-5 jours
63				Démolition - curage	15 jours	Lun 02/08/27	Ven 20/08/27	62	65;56FD-30 jours;64DD+5
64				GO sortie de secours côté demi pension. Y compris nettoyage	10 jours	Lun 09/08/27	Ven 20/08/27	63DD+5 jours	
65				GO	20 jours	Lun 23/08/27	Ven 17/09/27	63	67
66				**Finitions du RDC**	**75 jours**	**Lun 20/09/27**	**Mer 12/01/28**		**137**
67				Plâtrerie	25 jours	Lun 20/09/27	Ven 22/10/27	65	68DD;69
68				Lots techniques	75 jours	Lun 20/09/27	Mer 12/01/28	67DD	
69				Peinture préparation et 1ère couche	12 jours	Lun 25/10/27	Mer 10/11/27	67	70
70				Faux plafonds	8 jours	Ven 12/11/27	Mar 23/11/27	69	71

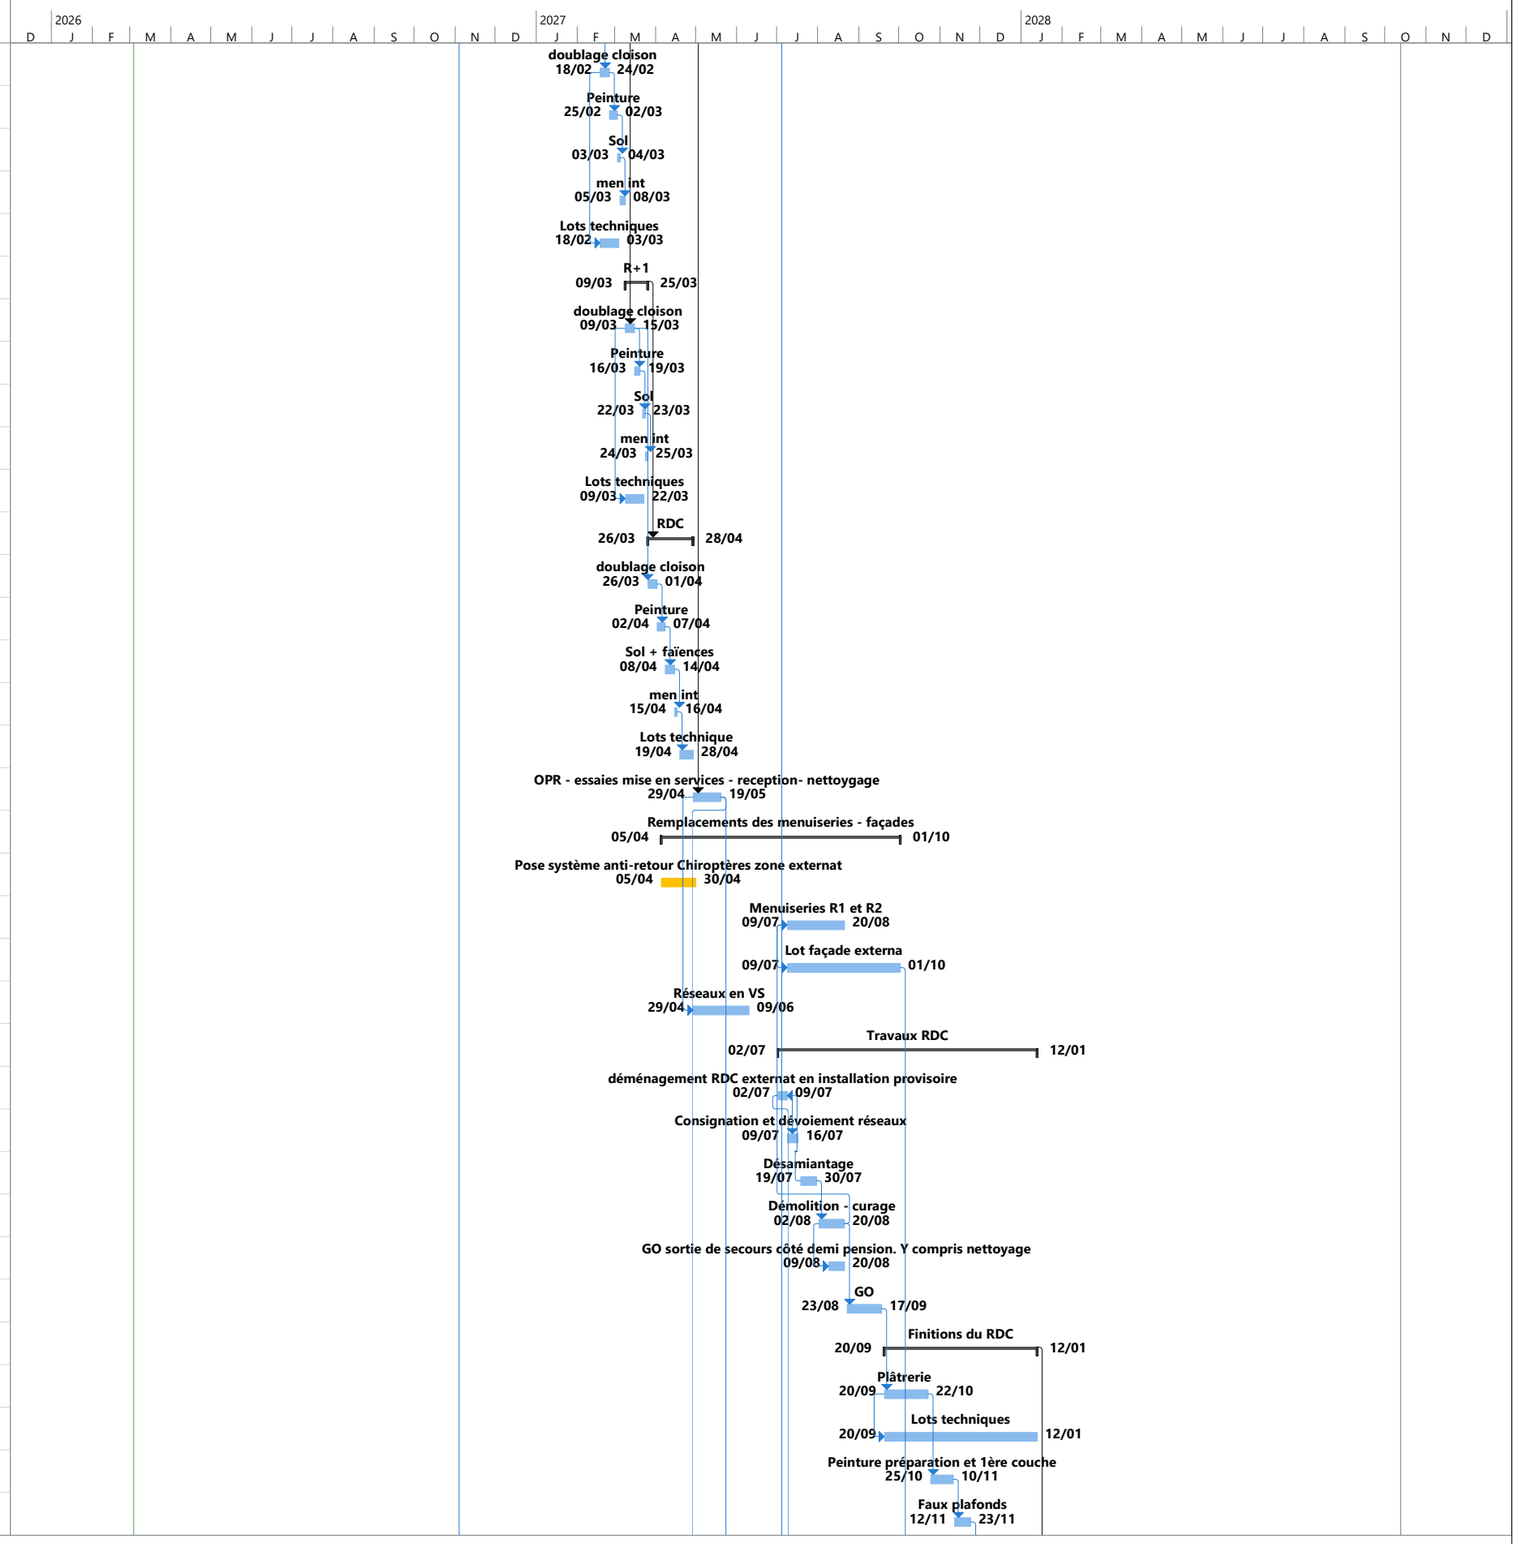

N°		Mode Tâche	IN	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Successeurs
71				sol	13 jours	Mer 24/11/27	Ven 10/12/27	70	72;73
72				Finition peinture	5 jours	Lun 13/12/27	Ven 17/12/27	71	
73				Menuiserie Agencement	10 jours	Lun 13/12/27	Lun 03/01/28	71	74
74				Réception et mise en service	7 jours	Mar 04/01/28	Mer 12/01/28	73	
75				**Travaux étages - ventillation**	**33 jours**	**Lun 05/07/27**	**Jeu 19/08/27**		
76				désamiantage locaux ménage 2ème étage	5 jours	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27	20	78;77
77				désamiantage locaux ménage 1er étage	5 jours	Lun 12/07/27	Lun 19/07/27	76	
78				Dépose repose faux plafond + gaines reprise + éléc - 2ème	13 jours	Lun 12/07/27	Jeu 29/07/27	76	80;79
79				Rajout cloison salle de musique - elec	7 jours	Ven 30/07/27	Lun 09/08/27	78	
80				Dépose repose faux plafond + gaines reprise + éléc - 1er	13 jours	Ven 30/07/27	Mar 17/08/27	78	81FD-3 jours
81				Essais mise en route - Reception - Nettoyage	5 jours	Ven 13/08/27	Jeu 19/08/27	80FD-3 jours	
82				**Chaufferie**	**80 jours**	**Mar 20/07/27**	**Mar 09/11/27**		
83				Installation chauffe eau provisoire	5 jours	Mar 20/07/27	Mar 27/07/27	84DF	
84				Currage chaufferie	15 jours	Mar 27/07/27	Lun 16/08/27	94	83DF;85;87
85			11	préfabrication/ livraison gros matériel / départ hydrolique EXT + administration	20 jours	Mar 17/08/27	Lun 13/09/27	84	86
86				Pose de chaufferie provisoire fioul	40 jours	Mar 14/09/27	Mar 09/11/27	85	
87			11	pose chaudière et raccordement et mise en service	42 jours	Mar 31/08/27	Mer 27/10/27	95FD+10 jours;84	
88				**Travaux demi-pension**	**310 jours**	**Lun 05/04/27**	**Jeu 22/06/28**		
89				Déménagement atelier et aménagement des locaux pour la demi-pension	15 jours	Jeu 20/05/27	Mer 09/06/27	53	93FD+15 jours
90				installation d'une cuisine provisoire	7 jours	Lun 16/08/27	Mar 24/08/27		138DD
91				Pose système anti-retour Chiroptères demi-pension	20 jours	Lun 05/04/27	Ven 30/04/27		
92				**Travaux demi-pensions**	**247 jours**	**Jeu 01/07/27**	**Jeu 22/06/28**		**131**
93				récupération des équipements cuisine réutilisés- consignation	2 jours	Jeu 01/07/27	Ven 02/07/27	89FD+15 jours	94
94			02	désamiantage Curage démolition demi-pension	15 jours	Lun 05/07/27	Lun 26/07/27	93	95;84
95				Gros oeuvre et extension chaufferie	15 jours	Mar 27/07/27	Lun 16/08/27	94	97;87FD+10 jours
96				démolition muret cuve	1 jour	Jeu 02/09/27	Jeu 02/09/27		
97				Gros oeuvre et extension demi-pension	40 jours	Mar 17/08/27	Lun 11/10/27	95	99FD+20 jours;100;98DD
98				Lots techniques incorporation	40 jours	Mar 17/08/27	Lun 11/10/27	97DD	
99				Etanchéité	15 jours	Mer 10/11/27	Mer 01/12/27	97FD+20 jours	102;103
100				Menuiserie Ext	20 jours	Mar 12/10/27	Mar 09/11/27	97	102;101;103
101				Façades	20 jours	Mer 10/11/27	Mer 08/12/27	100	
102				**Finitions**	**120 jours**	**Jeu 02/12/27**	**Jeu 25/05/28**	**100;99**	**112;129FF**
103				Doublage - platrerie	30 jours	Jeu 02/12/27	Jeu 20/01/28	100;99	104;108DD;109
104				Carrelage - faïence	20 jours	Ven 21/01/28	Jeu 17/02/28	103	105
105				Faux plafond	20 jours	Ven 18/02/28	Jeu 16/03/28	104	106;109

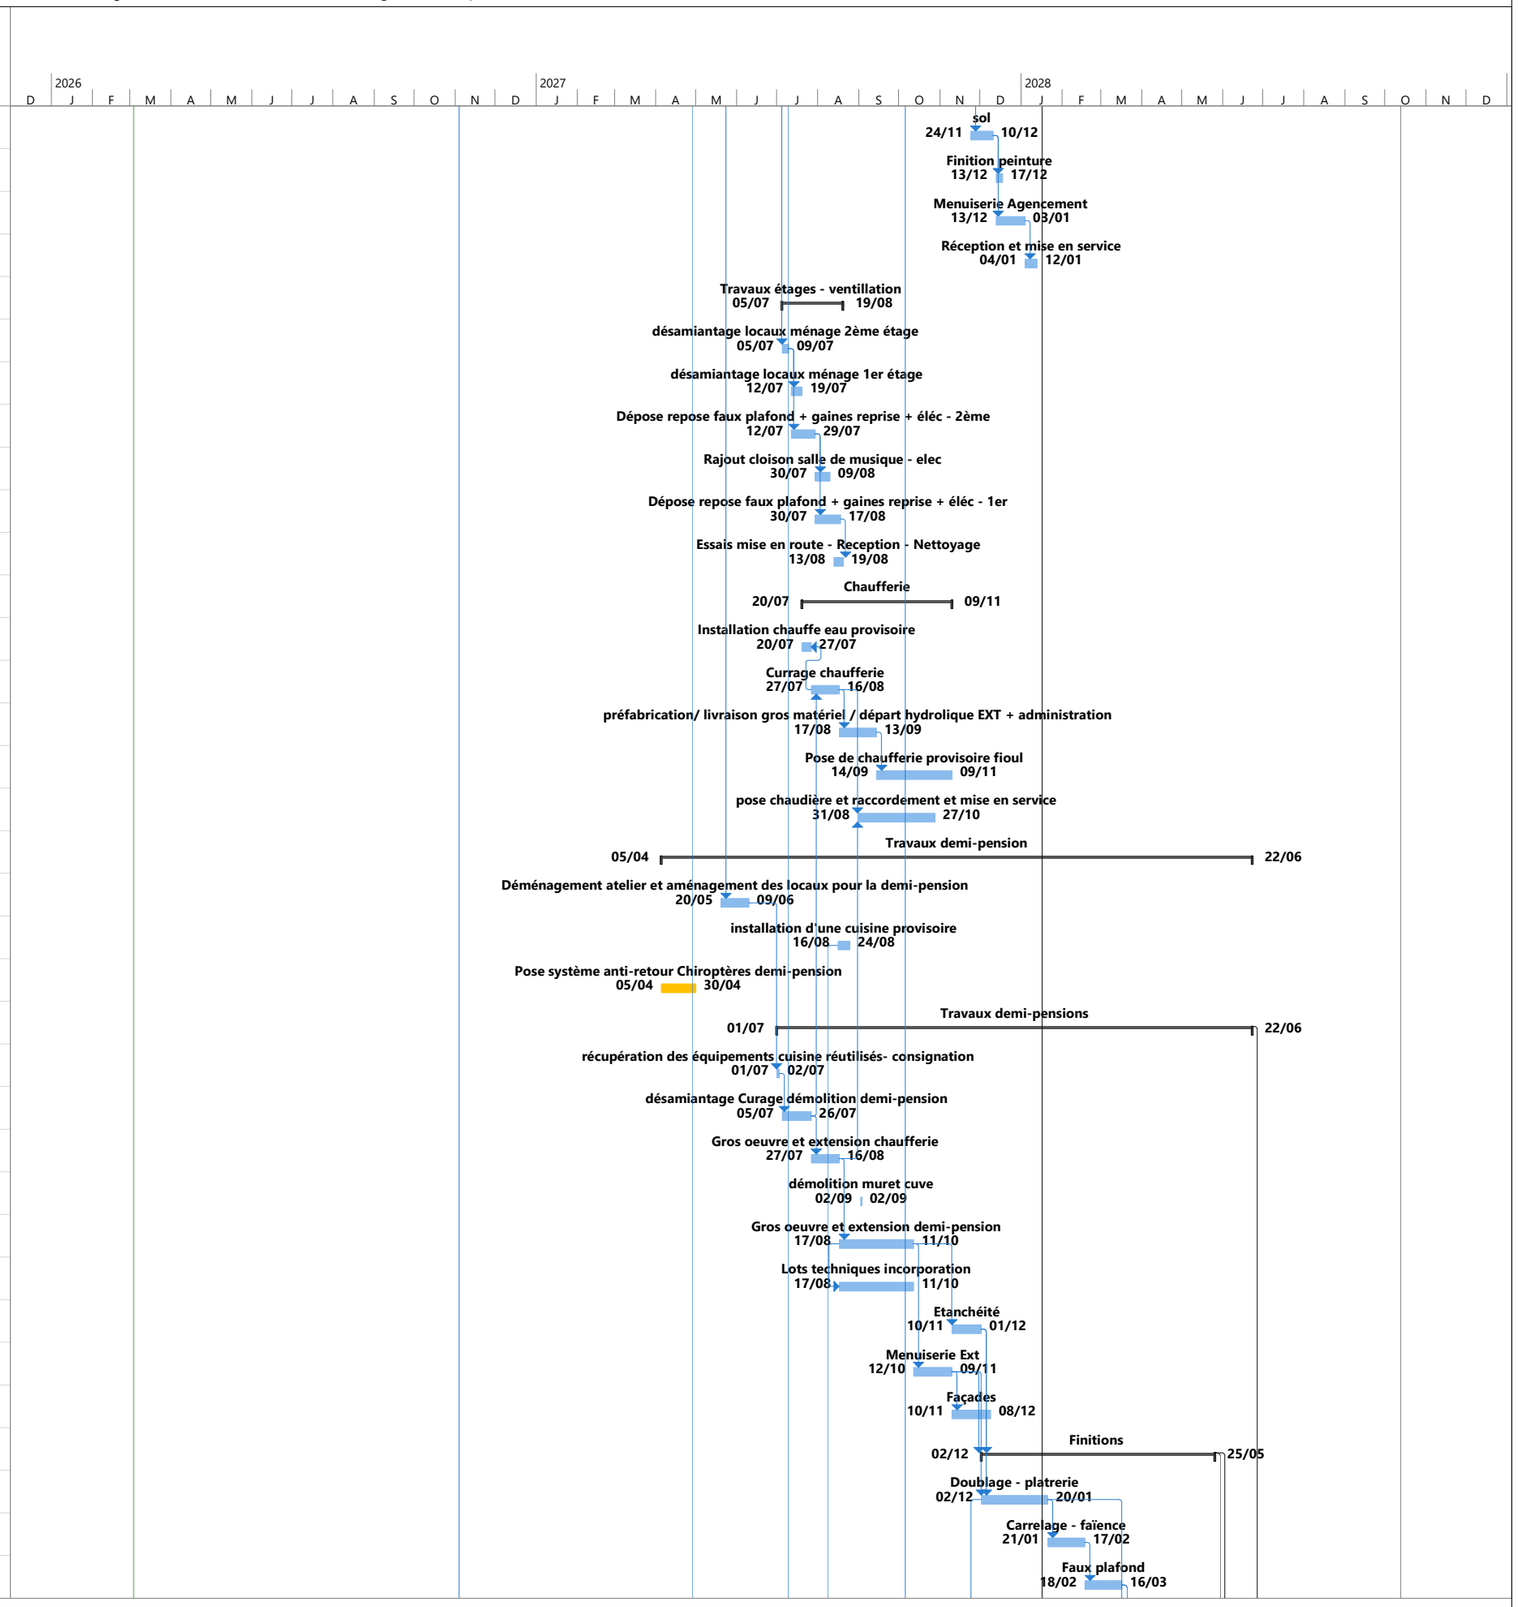
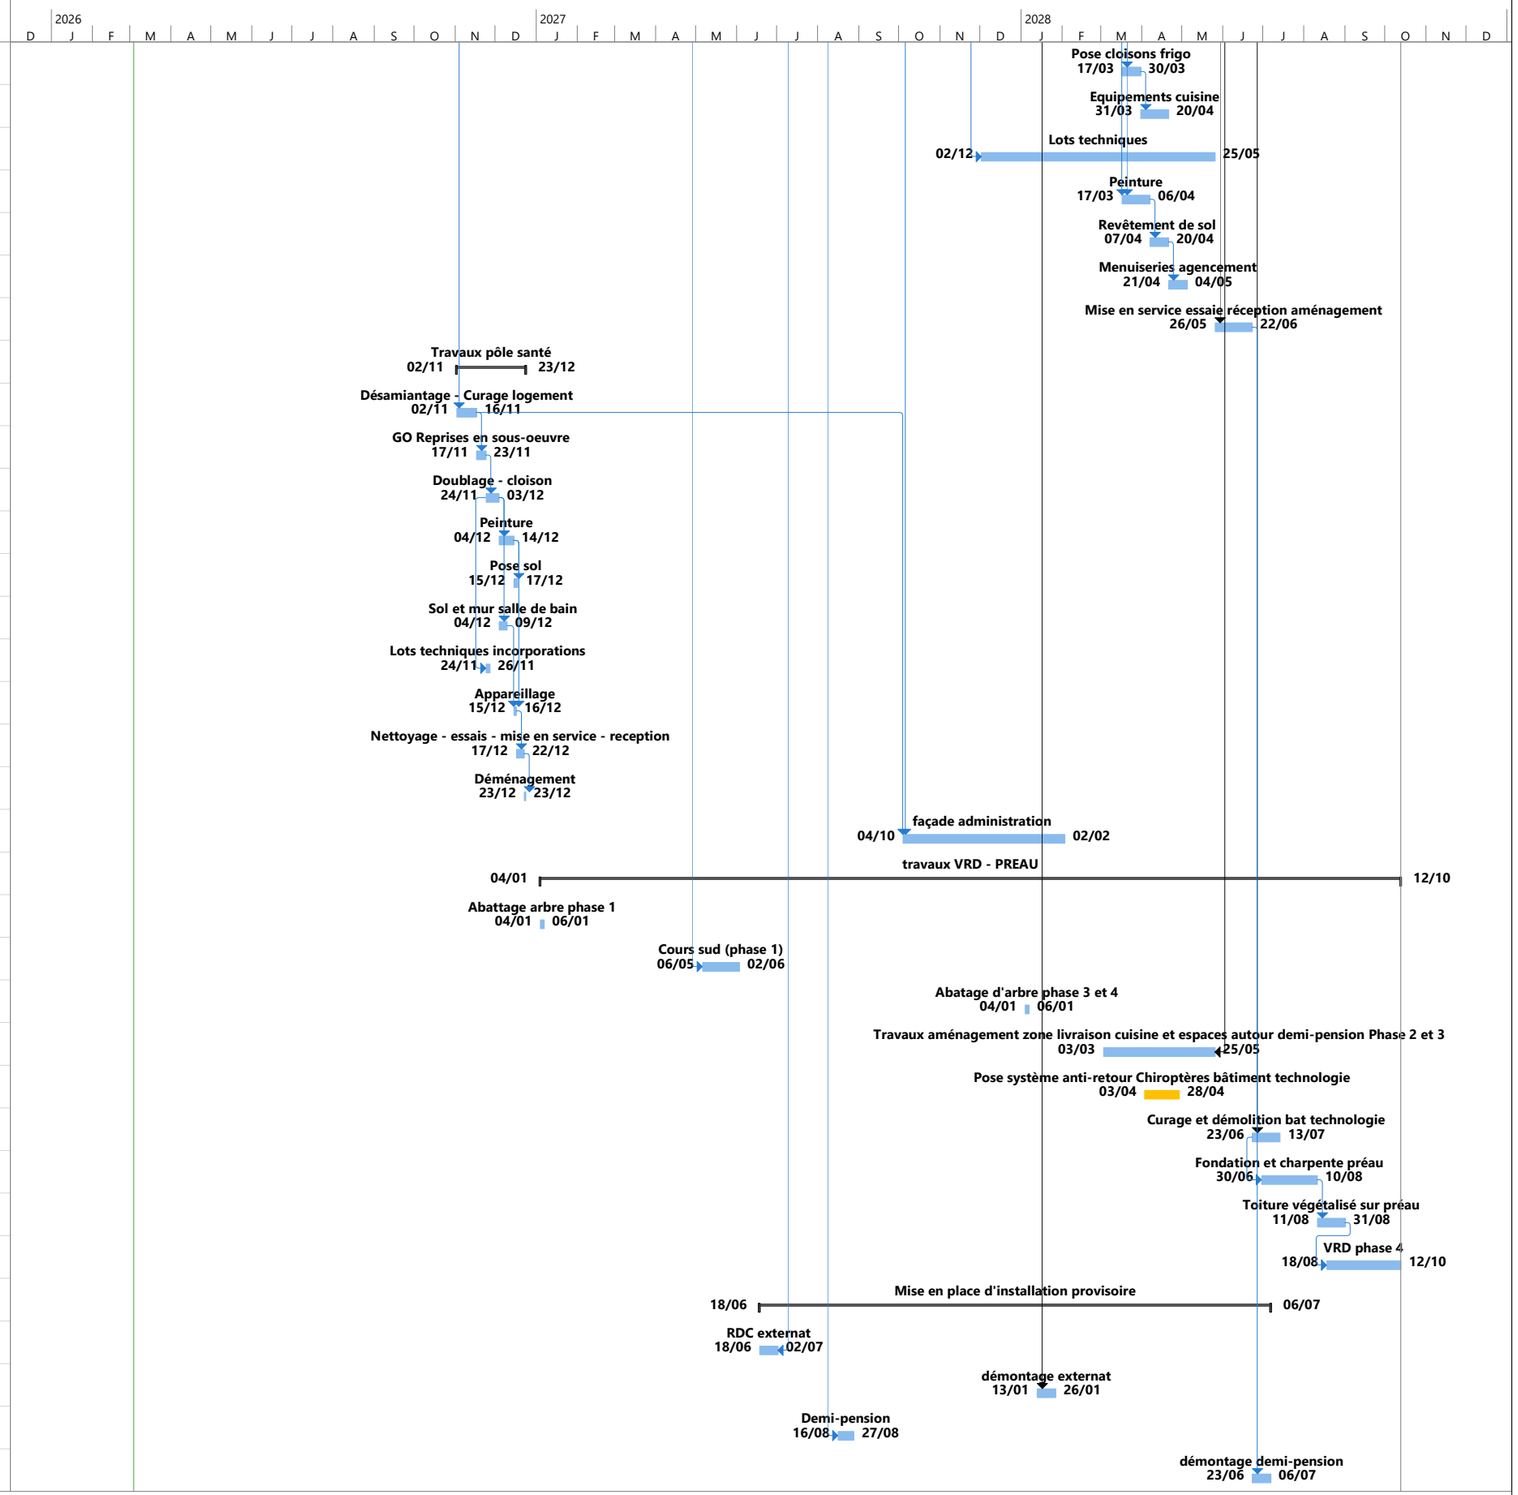
N°		Mode Tâche	IN	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Successeurs
106				Pose cloisons frigo	10 jours	Ven 17/03/28	Jeu 30/03/28	105	107
107				Equipements cuisine	15 jours	Ven 31/03/28	Jeu 20/04/28	106	
108				Lots techniques	120 jours	Jeu 02/12/27	Jeu 25/05/28	103DD	
109				Peinture	15 jours	Ven 17/03/28	Jeu 06/04/28	103;105	110
110				Revêtement de sol	10 jours	Ven 07/04/28	Jeu 20/04/28	109	111
111				Menuiseries agencement	10 jours	Ven 21/04/28	Jeu 04/05/28	110	
112				Mise en service essaie réception aménagement	20 jours	Ven 26/05/28	Jeu 22/06/28	102	139
113				**Travaux pôle santé**	**37 jours**	**Lun 02/11/26**	**Mer 23/12/26**		
114				Désamiantage - Curage logement	10 jours	Lun 02/11/26	Lun 16/11/26	20	115;124
115				GO Reprises en sous-oeuvre	5 jours	Mar 17/11/26	Lun 23/11/26	114	116
116				Doublage - cloison	8 jours	Mar 24/11/26	Jeu 03/12/26	115	117;120DD;119
117				Peinture	7 jours	Ven 04/12/26	Lun 14/12/26	116	118;121
118				Pose sol	3 jours	Mar 15/12/26	Jeu 17/12/26	117	
119				Sol et mur salle de bain	4 jours	Ven 04/12/26	Mer 09/12/26	116	121
120				Lots techniques incorporations	3 jours	Mar 24/11/26	Jeu 26/11/26	116DD	
121				Appareillage	2 jours	Mar 15/12/26	Mer 16/12/26	119;117	122
122				Nettoyage - essais - mise en service - reception	4 jours	Jeu 17/12/26	Mar 22/12/26	121	123
123			M	Déménagement	1 jour	Mer 23/12/26	Mer 23/12/26	122	
124				façade administration	80 jours	Lun 04/10/27	Mer 02/02/28	114;57	
125				**travaux VRD - PREAU**	**455 jours**	**Lun 04/01/27**	**Jeu 12/10/28**		
126				Abattage arbre phase 1	3 jours	Lun 04/01/27	Mer 06/01/27		
127				Cours sud (phase 1)	20 jours	Jeu 06/05/27	Mer 02/06/27	53FD-10 jours	
128				Abatage d'arbre phase 3 et 4	3 jours	Mar 04/01/28	Jeu 06/01/28		
129				Travaux aménagement zone livraison cuisine et espaces autour demi-pension	60 jours	Ven 03/03/28	Jeu 25/05/28	102FF	
130				Pose système anti-retour Chiroptères bâtiment technologie	20 jours	Lun 03/04/28	Ven 28/04/28		
131			02	Curage et démolition bat technologie	15 jours	Ven 23/06/28	Jeu 13/07/28	92	132DD+5 jours
132				Fondation et charpente préau	30 jours	Ven 30/06/28	Jeu 10/08/28	131DD+5 jours	133
133				Toiture végétalisé sur préau	15 jours	Ven 11/08/28	Jeu 31/08/28	132	134FD-10 jours
134				VRD phase 4	40 jours	Ven 18/08/28	Jeu 12/10/28	133FD-10 jours	
135				**Mise en place d'installation provisoire**	**266 jours**	**Ven 18/06/27**	**Jeu 06/07/28**		
136				RDC externat	10 jours	Ven 18/06/27	Ven 02/07/27	60DF	
137				démontage externat	10 jours	Jeu 13/01/28	Mer 26/01/28	66	
138				Demi-pension	10 jours	Lun 16/08/27	Ven 27/08/27	90DD	
139				démontage demi-pension	10 jours	Ven 23/06/28	Jeu 06/07/28	112
